



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA L. PECCI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CORTE INTERNA AL TEATRO

CUP

C37H21000470004

Titolo

Gantt - Diagramma dei tempi

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato
Arch. Elena Vitali - Comune di Prato

Collaboratore

Arch. tir. Gabriele Pierini

Progettista degli impianti elettrici e antincendio

CMA srl - PI Alessio Diegoli

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Geom. Marco Polidori


Legenda codici

A - opere architettoniche

E - impianti elettrici

M - impianti meccanici

Sic - sicurezza

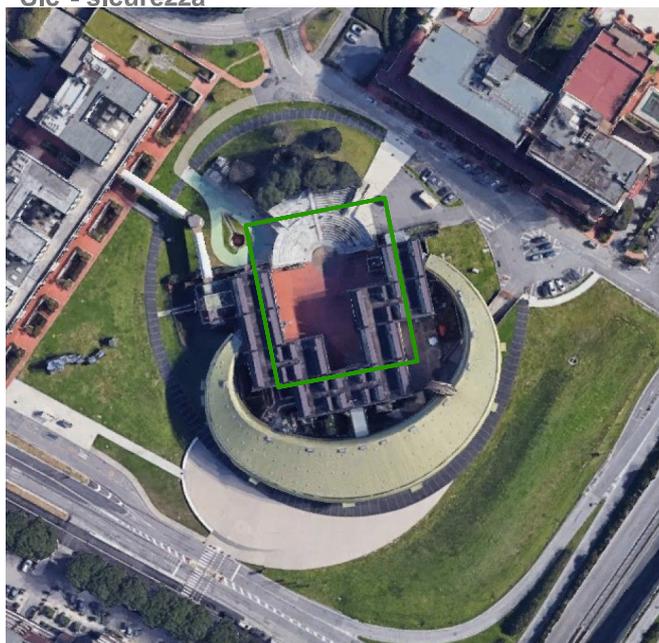

Elaborato: SIC - 03

Scala: -

Spazio riservato agli uffici:

ALLEGATO "PSC"

Comune di Prato

Provincia di PO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA L. PECCI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CORTE INTERNA AL TEATRO

CUP: C37H21000470004

COMMITTENTE: Comune di Prato.

CANTIERE: Viale della Repubblica n° 277, Prato (PO)

Prato, Aprile 2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Marco Polidori)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - Responsabile Unico del Procedimento Silvestri Antonio)

Studio Tecnico Polidori

Geom. Marco Polidori

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
	1	E	1	1
	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				
Rimozione di pavimenti esterni	1	E	3	3
	1	E	3	3
	1	E	3	3
Rimozione di massetto	1	E	3	3
	1	E	3	3
	1	E	4	4
Rimozione di manto impermeabile	1	E	2	2
	1	E	3	5
	1	E	3	5
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2	E	4	4
OPERE MURARIE				
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	1	1
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	1	1
Posa di condotta idrica	1	E	1	1
IMPERMEABILIZZAZIONI				
Impermeabilizzazione Corte Interna	1	E	3	3
	1	E	5	7
	1	E	4	6
PAVIMENTO INDUSTRIALE				
Realizzazione di pavimentazione industriale a polvero	1	E	4	7
	1	E	5	7
	1	E	6	8
OPERE LATTONERIA base infissi, corrimano palcoscenico OK				
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2
	1	E	2	2
	1	E	2	2
CONTROSOFFITTI				
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2	E	5	5
ASSISTENZE EDILI OK				
Esecuzione di tracce eseguite a mano	2	E	1	1
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	2	E	1	1
Preparazione malta	2	E	1	1
Chiusura tracce (assistenze)	2	E	1	1

IMPIANTO ELETTRICO TECNICO				
Rimozione di impianti	2	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico interno	2	E	6	8
Installazione di corpi illuminanti	2	E	3	3
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E SICUREZZA				
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	2	E	7	9
Realizzazione di impianto antintrusione	2	E	3	3
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	2	E	2	2
TINTEGGIATURE				
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	3	3
SMOBILIZZO CANTIERE OK				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA ESTERNA

2) = ZONA INTERNA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Imprese: incarico da affidare

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

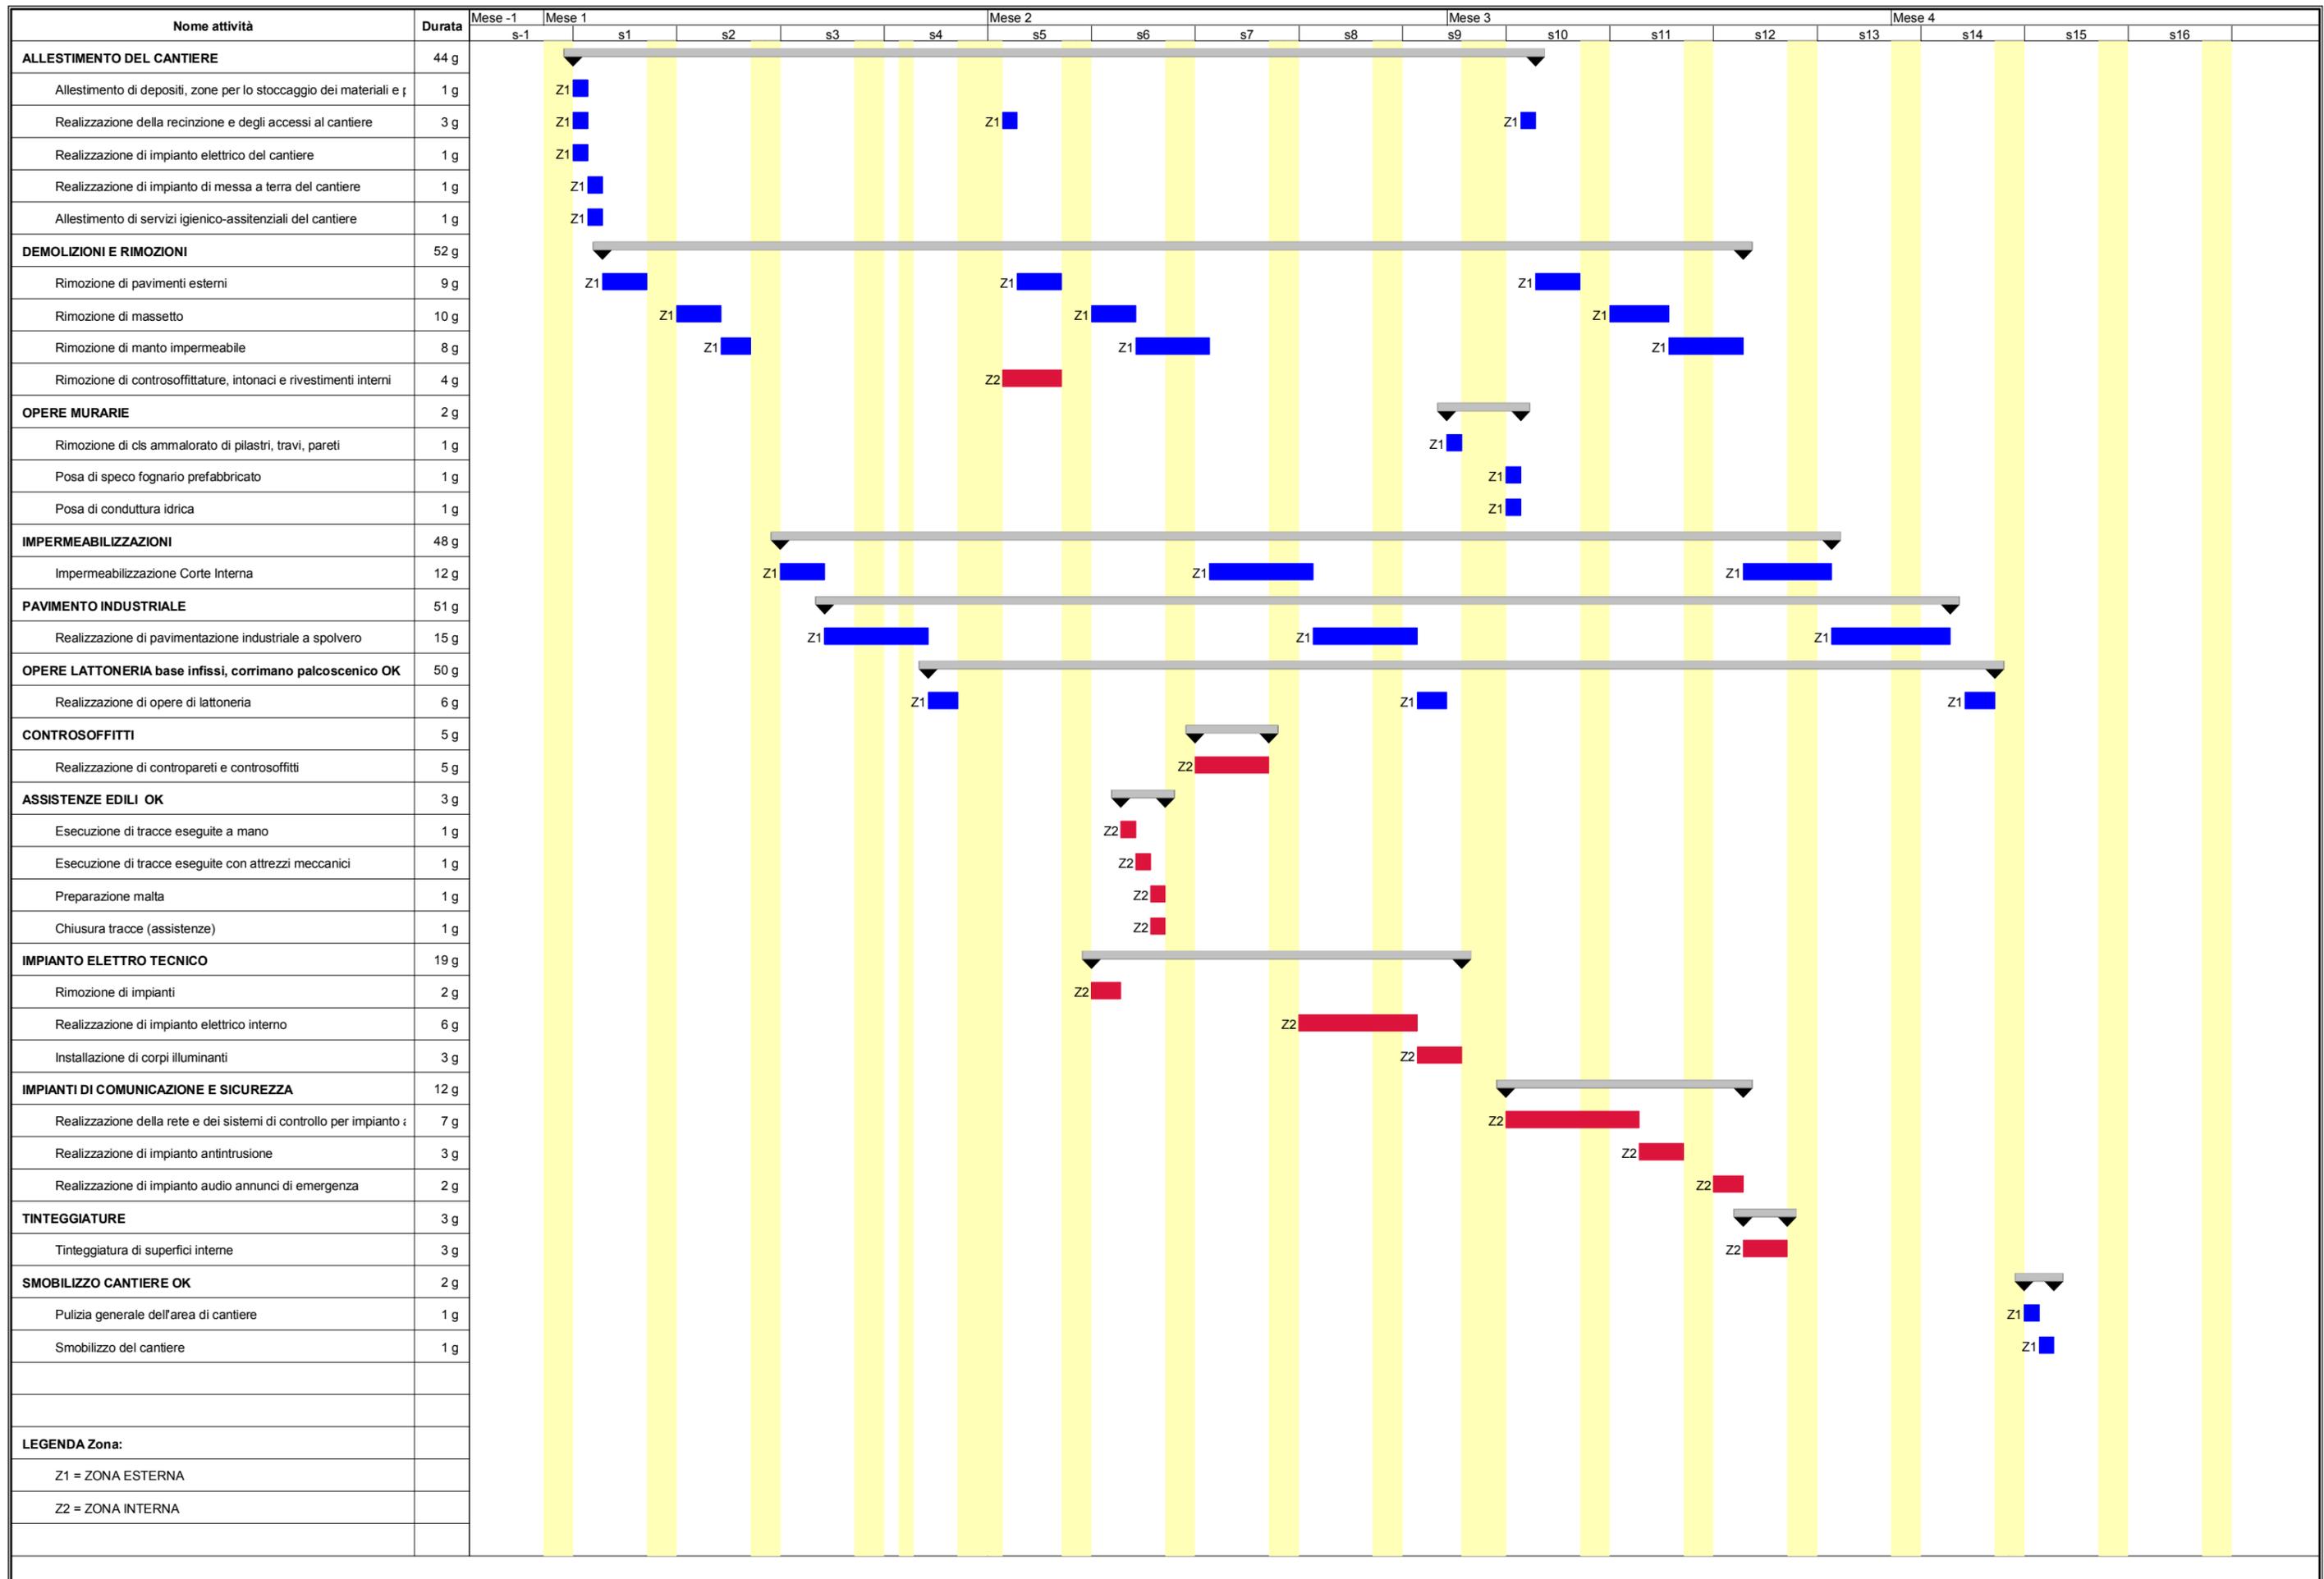

Firmato da:

POLIDORI MARCO

codice fiscale PLDMRC76B27G999M

num.serie: 30841891164601901564014489749397380787

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 17/10/2022 al 18/10/2027
