



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 1° semestre Anno 2022
dati al 30/06/2022

INDICE

<p>PREMESSA Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo Struttura del Report Il contesto di riferimento</p>	<p>Pag. 3</p>
<p>PARTE 1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi</p>	<p>Pag. 8</p>
<p>PARTE 2 Il grado di realizzazione finanziaria</p>	<p>Pag. 46</p>
<p>PARTE 3 Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche</p>	<p>Pag. 55</p>
<p>PARTE 4 Considerazioni primo semestre 2022</p>	<p>Pag. 69</p>
<p>PARTE 5 Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate</p>	<p>Pag. 70</p>

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.


In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto:

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi ;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo

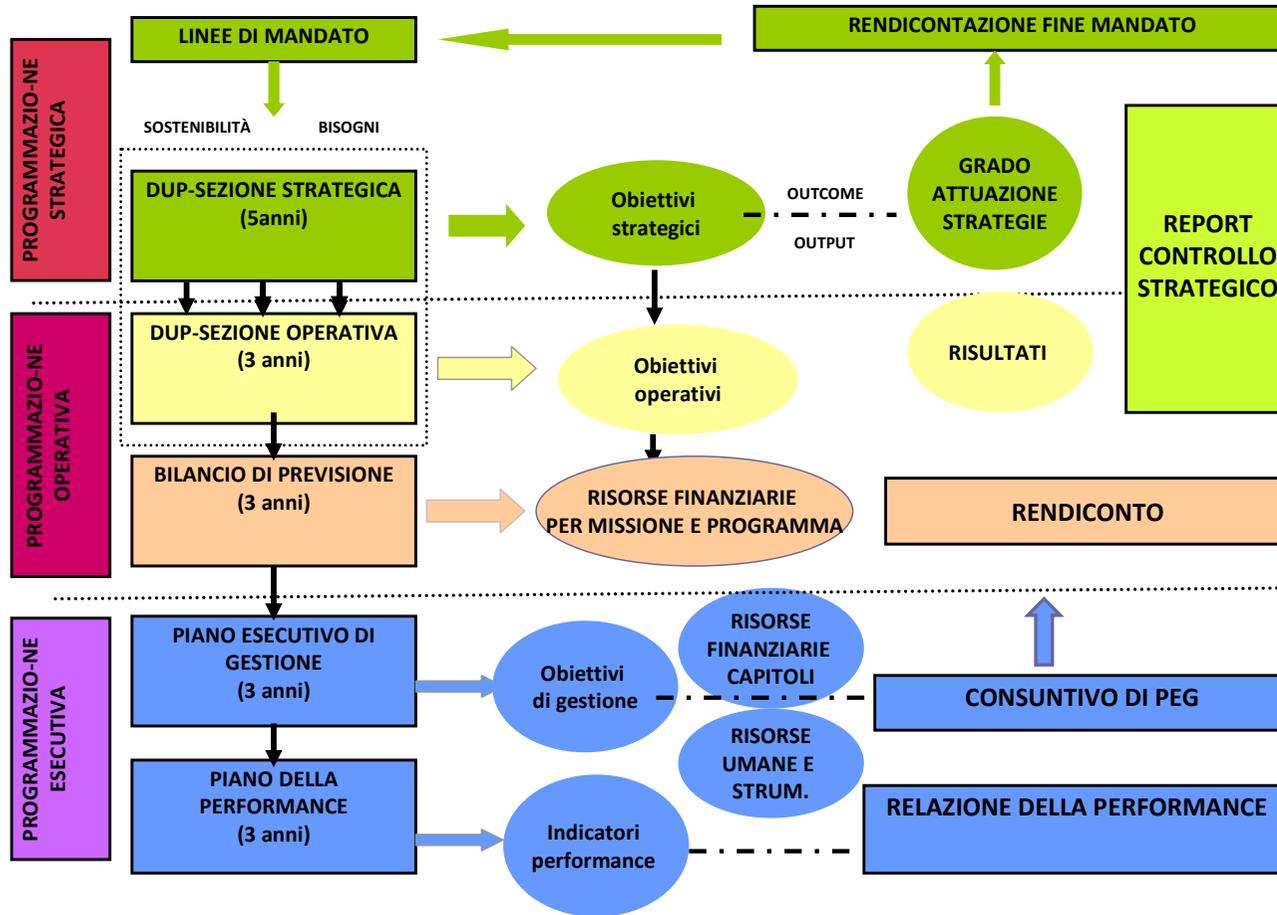



Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2022-2024 DUP 2022/2024 – Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 50 del 09/09/2021 Delibera di Consiglio n. 33 del 23/06/2022
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024
Bilancio di Previsione 2022/2024	Delibera di Consiglio n. 34 del 23/06/2022
Piano della Performance 2022/2024 Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022-2024 - approvazione assegnazione risorse, performance organizzativa e nuovi obiettivi	Delibera di Giunta n. 79 del 29/03/2022 Delibera di Giunta n. 229 del 06/07/2022
PEG- Piano della Performance 2022/2024 - Stato avanzamento obiettivi al 30/06/2022	Delibera di Giunta n. 259 del 02/08/2022

STRUTTURA REPORT

Il presente REPORT è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report semestrale riassume l'esito della verifica intermedia finalizzata a dar conto dello stato di attuazione delle strategie definite dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2022/2024) e si compone di 4 parti:

La prima sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 30/06/2022 calcolato attraverso un processo bottom up che parte dallo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali (DGC 259/2022) aggregati, prima, per obiettivo operativo e poi, per obiettivo strategico del DUP.

La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite) aggregati per obiettivi strategici.

La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell'opera al patrimonio dell'ente e permette, se correttamente alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori .

La quarta sezione riporta delle considerazioni sull'andamento delle strategie nel 1° semestre 2022.

La quinta sezione il grado di realizzazione al 31/07/2022 degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipate.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Dopo più di due anni il Governo ha disposto la cessazione dello stato di emergenza sanitaria al 31/03/2022 che hanno permesso, nel primo semestre 2022, la graduale ripresa di tutti i servizi e attività. Per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, e di assicurare la progressiva ripresa il Governo ha emanato il decreto Legge 24/2022.

Purtroppo lo scenario nazionale e internazionale è stato segnato dall'inizio della guerra in Ucraina. Il Governo e di conseguenza anche tutti gli Enti locali, sono stati impegnati nella gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini. La guerra ha innescato anche un'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime.

L'inizio del 2022 è stato però anche caratterizzato dal finanziamento di 23 progetti presentati dal Comune di Prato al bando Rigenerazione urbana del ministero dell'Interno per l'assegnazione dei fondi Pnrr, per un totale di 19 milioni di euro. Il PNRR è, da un lato un'opportunità irripetibile, dall'altra, è un impegno notevole per l'amministrazione comunale che dovrà rendicontare tutti i progetti entro il 2026. Seguiranno quindi quattro anni a ritmo serrato per realizzare opere che prevedono la riqualificazione urbana di spazi culturali, la realizzazione di interventi negli impianti sportivi, l'implementazione della mobilità sostenibile e il miglioramento del verde scolastico.

Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi


1.1 L'albero strategie-obiettivi – sintesi realizzazione obiettivi strategici e operativi

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto **un quarto ambito strategico** (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** dettagliati, a loro volta, in **53 obiettivi operativi**.

Qui di seguito si riporta l'albero degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel Dup 2022/2024 con evidenziata la percentuale di realizzazione al 30/06/2022.

Per calcolare la percentuale di avanzamento si parte dall'attività di misurazione e valutazione degli obiettivi annuali (individuali, di sviluppo e gestionali) attribuiti ai responsabili dei servizi dell'Ente: gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli:

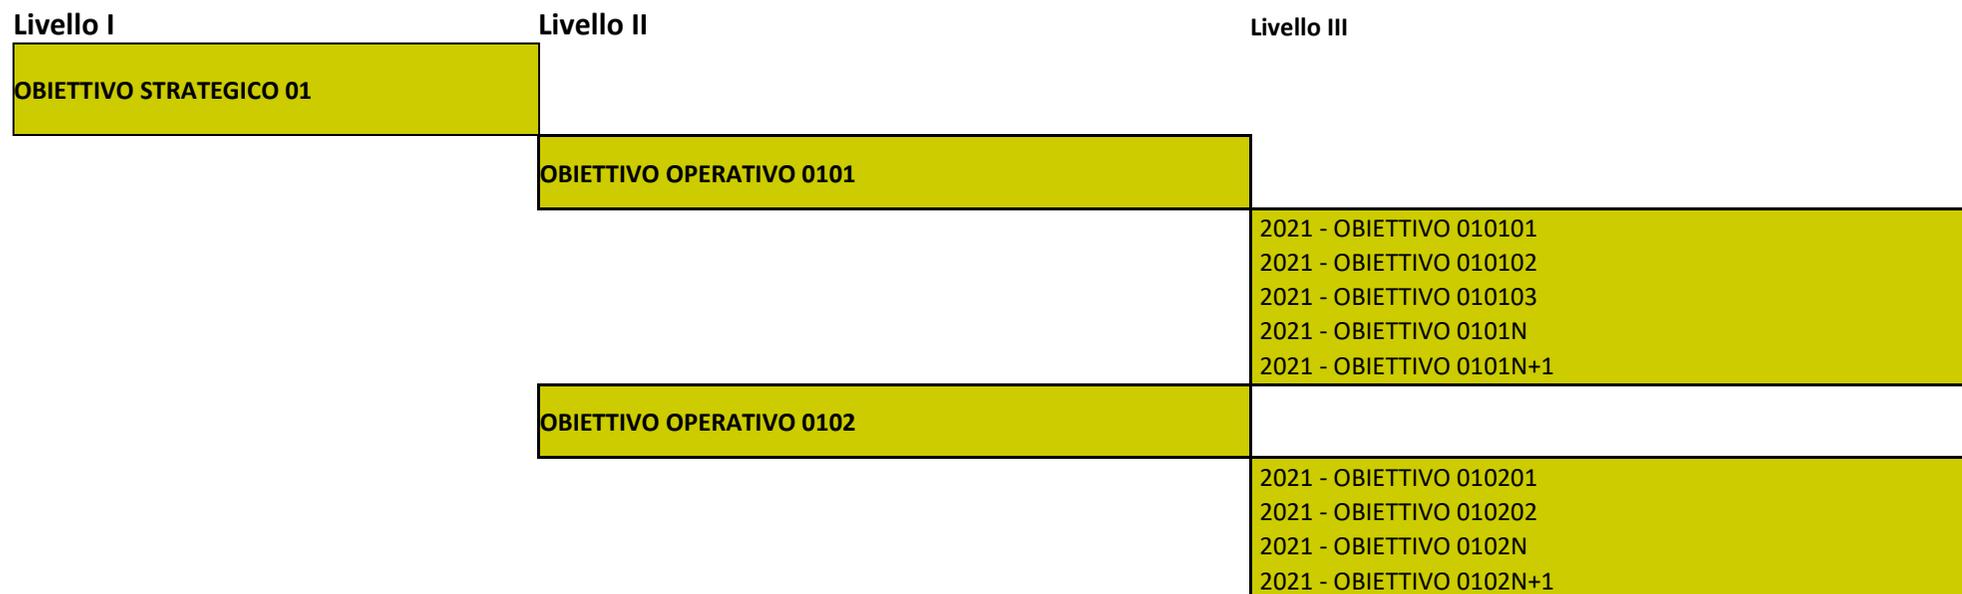

Sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali, si calcola l'avanzamento degli obiettivi operativi e strategici ad essi collegati.

Tabella 1: Avanzamento degli obiettivi operativi e strategici

tipologia	Titolo	Grado di raggiungimento al 30/06/2022
<u>Obiettivo Strategico</u>	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro Codice: 2022-OBST-01 (00)	48,17%
Obiettivo Operativo	Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio Codice: 2022-OBOP-0101 (00)	31,17%
Obiettivo Operativo	Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività Codice: 2022-OBOP-0102 (00)	50,00%
Obiettivo Operativo	Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori Codice: 2022-OBOP-0103 (00)	55,50%
Obiettivo Operativo	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare Codice: 2022-OBOP-0104 (00)	56,00%
Obiettivo Operativo	Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro Codice: 2022-OBOP-0105 (00)	100,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare Codice: 2022-OBST-02 (00)	31,25%
Obiettivo Operativo	Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione Codice: 2022-OBOP-0201 (00)	44,00%
Obiettivo Operativo	Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali Codice: 2022-OBOP-0202 (00)	10,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio Codice: 2022-OBST-03 (00)	38,08%
Obiettivo Operativo	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali Codice: 2022-OBOP-0301 (00)	64,50%
Obiettivo Operativo	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città Codice: 2022-OBOP-0302 (00)	43,11%
Obiettivo Operativo	Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura Codice: 2022-OBOP-0303 (00)	14,67%

tipologia	Titolo	Grado di raggiungimento al 30/06/2022
Obiettivo Operativo	Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva Codice: 2022-OBOP-0304 (00)	53,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Innovazione digitale come leva di processo e crescita della città Codice: 2022-OBST-04 (00)	48,41%
Obiettivo Operativo	Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi Codice: 2022-OBOP-0401 (00)	53,50%
Obiettivo Operativo	Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA Codice: 2022-OBOP-0402 (00)	50,00%
Obiettivo Operativo	Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini Codice: 2022-OBOP-0403 (00)	45,56%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Rigenerazione urbana Codice: 2022-OBST-05 (00)	44,71%
Obiettivo Operativo	Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo Codice: 2022-OBOP-0501 (00)	35,50%
Obiettivo Operativo	Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni Codice: 2022-OBOP-0502 (00)	100,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Spazi pubblici sicuri e inclusivi Codice: 2022-OBST-06 (00)	47,38%
Obiettivo Operativo	Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale Codice: 2022-OBOP-0601 (00)	47,38%
<u>Obiettivo Strategico</u>	DAL DECORO DELLA CITTA' ALLA TUTELA DEL TERRITORIO Codice: 2022-OBST-07 (00)	47,51%
Obiettivo Operativo	Tutelare il territorio Codice: 2022-OBOP-0701 (00)	75%
Obiettivo Operativo	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade , giardini, piazze, cimiteri, ecc.) Codice: 2022-OBOP-0702 (00)	54,56%
Obiettivo Operativo	Garantire l' efficienza dei servizi a rete Codice: 2022-OBOP-0703 (00)	n.r.
Obiettivo Operativo	Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale Codice: 2022-OBOP-0704 (00)	50,00%

tipologia	Titolo	Grado di raggiungimento al 30/06/2022
Obiettivo Operativo	Gestione delle emergenze Codice: 2022-OBOP-0705 (00)	54,43%
Obiettivo Operativo	Tutelare gli animali Codice: 2022-OBOP-0706 (00)	45,00%
Obiettivo Strategico	Prato città green Codice: 2022-OBST-08 (00)	39,27%
Obiettivo Operativo	Interventi per la riduzione dell'inquinamento Codice: 2022-OBOP-0801 (00)	25,00%
Obiettivo Operativo	Interventi di efficientamento energetico Codice: 2022-OBOP-0802 (00)	43,57%
Obiettivo Operativo	Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile Codice: 2022-OBOP-0803 (00)	45,08%
Obiettivo Strategico	Mobilità sostenibile Codice: 2022-OBST-09 (00)	39,89%
Obiettivo Operativo	Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti Codice: 2022-OBOP-0901 (00)	59,25%
Obiettivo Operativo	Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione Codice: 2022-OBOP-0902 (00)	29,17%
Obiettivo Operativo	Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa Codice: 2022-OBOP-0903 (00)	39,17%
Obiettivo Strategico	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità Codice: 2022-OBST-10 (00)	66,30%
Obiettivo Operativo	Verso un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari Codice: 2022-OBOP-1001 (00)	97,00%
Obiettivo Operativo	Sostenere le fragilità diffuse Codice: 2022-OBOP-1002 (00)	60,88%
Obiettivo Strategico	Una casa per tutti Codice: 2022-OBST-11 (00)	69,20%
Obiettivo Operativo	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita Codice: 2022-OBOP-1101 (00)	69,20%

tipologia	Titolo	Grado di raggiungimento al 30/06/2022
<u>Obiettivo Strategico</u>	Accogliere, includere, integrare le diversità Codice: 2022-OBST-12 (00)	47,11%
Obiettivo Operativo	Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza. Codice: 2022-OBOP-1201 (00)	46,29%
Obiettivo Operativo	Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità Codice: 2022-OBOP-1202 (00)	50,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano Codice: 2022-OBST-13 (00)	46,09%
Obiettivo Operativo	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione Codice: 2022-OBOP-1301 (00)	48,63%
Obiettivo Operativo	Investire per rendere le scuole belle e sicure Codice: 2022-OBOP-1302 (00)	37,25%
Obiettivo Operativo	Per una scuola inclusiva Codice: 2022-OBOP-1303 (00)	44,00%
Obiettivo Operativo	Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale Codice: 2022-OBOP-1304 (00)	58,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale Codice: 2022-OBST-14 (00)	39,55%
Obiettivo Operativo	Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi Codice: 2022-OBOP-1401 (00)	16,67%
Obiettivo Operativo	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti Codice: 2022-OBOP-1402 (00)	58,27%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti Codice: 2022-OBST-15 (00)	40,00%
Obiettivo Operativo	Diritto di accesso ai servizi di base Codice: 2022-OBOP-1501 (00)	40,00%
<u>Obiettivo Strategico</u>	L'amministrazione efficace e efficiente Codice: 2022-OBST-16 (00)	49,18%
Obiettivo Operativo	Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare Codice: 2022-OBOP-1601 (00)	49,12%

tipologia	Titolo	Grado di raggiungimento al 30/06/2022
Obiettivo Operativo	Migliorare l'efficienza per essere più efficaci Codice: 2022-OBOP-1602 (00)	48,87%
Obiettivo Operativo	Garantire la correttezza amministrativa Codice: 2022-OBOP-1603 (00)	47,69%
Obiettivo Operativo	Valorizzare il patrimonio Codice: 2022-OBOP-1604 (00)	53,36%
<u>Obiettivo Strategico</u>	L'amministrazione al servizio della città Codice: 2022-OBST-17 (00)	55,64%
Obiettivo Operativo	Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici Codice: 2022-OBOP-1701 (00)	74,20%
Obiettivo Operativo	Servizi di qualità, equi e accessibili Codice: 2022-OBOP-1702 (00)	45,33%
<u>Obiettivo Strategico</u>	Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA Codice: 2022-OBST-18 (00)	55,00%
Obiettivo Operativo	Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA Codice: 2022-OBOP-1801 (00)	55,00%

1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi- dettaglio

Si riporta di seguito, per ciascun obiettivo strategico, il grado di avanzamento calcolato sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi di Peg ad esso collegati, con una descrizione sintetica delle principali attività.

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio	<p>Il progetto Smarty Smes per la diffusione nelle piccole e medie imprese di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi ha realizzato nel corso del 1° semestre 2022 le attività pianificate, con particolare riferimento alla elaborazione dei Piani di Azione, i documenti attraverso i quali i partner di progetto definiscono le modalità per agevolare il trasferimento delle conoscenze apprese negli strumenti di programmazione e di finanziamento dei livelli di governo regionali e nazionali finalizzati a sostenere la transizione digitale dei territori coinvolti. Il Comune di Prato in particolare ha incentrato il proprio Piano di Azione sulla individuazione delle modalità per la migliore redazione dei prossimi bandi PRISMA finalizzati all'attivazione di progetti di ricerca e sviluppo da realizzare congiuntamente tra imprese, università e centri di ricerca, progetti che sfrutteranno le tecnologie emergenti per sviluppare prototipi che permettano alle imprese del settore Tessile & Moda e del Made in Italy di affrontare con maggiore consapevolezza la transizione digitale.</p> <p>Ad Aprile 2022 è stata inaugurata la sede di PRISMA in via Galcianese, nella quale si sono insediate 3 start-up e sono stati organizzati più di 10 eventi con imprese, associazioni di categoria, start-up, partner tecnico-scientifici, etc. Continuano inoltre gli avvisi pubblici a</p>	31,17%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>carattere ricorrente per la selezione dei progetti di ricerca e sviluppo sostenuti dai Laboratori PRISMA ospitati dal PIN e delle start-up da inserire nello specifico programma di accelerazione sviluppato da StartUp Italia per conto del progetto PRISMA.</p> <p>Per quanto riguarda gli aiuti al distretto tessile per il rilancio della filiera produttiva dopo l'emergenza epidemiologica, il primo semestre 2022 ha visto l'amministrazione impegnata nel lavoro di concertazione fra Comune, associazioni di categoria, sindacati e parlamentari eletti a Prato.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</p>	<p>Le azioni hanno riguardato principalmente il commercio e la gestione dei mercati. E' stata data la concessione della gestione, con cadenza biennale e mediante affidamento diretto, della "Fiera degli Ambulanti", che si è svolta a maggio. Inoltre è stato pubblicato il calendario delle mostre mercato in centro storico ed è stato trasmesso il calendario delle edizioni straordinarie del mercato centrale alle associazioni di categorie e ai vari soggetti coinvolti.</p>	<p>50%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</p>	<p>Partecipazione insieme alla Asl al Piano straordinario regionale per il lavoro sicuro, che oltre a rilevare situazioni di illegalità lavorativa, permette di individuare fenomeni di evasione dei tributi locali, soprattutto da parte delle imprese straniere.</p> <p>Applicazione del protocollo Si.smi.co sottoscritto fra Comune di Prato, Alia e So.Ri, per il contrasto all'evasione tributaria, rendendo stabili i controlli sul territorio, accompagnati da specifici strumenti comunicativi orientati all'integrazione interculturale.</p> <p>Continuano i controlli del nucleo antievasione, per il recupero dei tributi locali e i controlli di polizia amministrativa.</p> <p>Sono iniziati i controlli da parte della Polizia Municipale sull'etichettatura dei prodotti</p>	<p>55,50%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	riguardo a cinque tipologie di merci piuttosto critiche: tessile, D.P.I. , cosmetici, calzature e giocattoli.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
1.4 Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	<p>Nell'ambito del progetto Prato Circular City, che ha elaborato il documento "Next Generation Prato" nel 2021, nel 1° semestre è stato siglato un protocollo d'intesa con le parti sociali, allo scopo di monitorare lo stato d'avanzamento delle azioni previste nel documento.</p> <p>Nell'ambito del progetto Innomed-up è in fase di realizzazione in via sperimentale una raccolta di materiali e oggetti da destinare al riuso, che si concluderà in autunno. E' stata inoltre realizzata una guida per applicare i principi dell'economia circolare alle PMI delle industrie culturali e creative del Mediterraneo.</p> <p>Inoltre, relativamente al progetto URGE si è conclusa l'attività di elaborazione del "Integrated Action Plan", il documento che ha analizzato e definito le modalità più efficaci di trasferimento della conoscenza appresa durante i meeting transnazionali svoltisi negli anni precedenti e con il quale si elabora una proposta per definire politiche pubbliche mirate e ulteriori possibili azioni per implementare nel territorio cittadino pratiche destinate a incrementare il tasso di circolarità nei grandi interventi infrastrutturali. Il documento è stato presentato ufficialmente all'evento finale del progetto, che si è svolto ad Utrecht nei primi giorni di luglio.</p>	56%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Per valorizzare la presenza universitaria in città, si è provveduto all'approvazione di un nuovo accordo di coorganizzazione con il PIN per dare continuità all'iniziativa Premi di laurea Città di Prato. Risultano altresì avviati contatti e valutazioni propedeutici all'attivazione di ulteriore coprogettazione e realizzazione di iniziativa finalizzata alla	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	valorizzazione della presenza universitaria in città. Sono state completate le attività propedeutiche necessarie per l'approvazione del Patto paraconsortile e Convenzione per supporto corsi di laurea PROGEAS e PROSMART 2022-2024.	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
2.1 Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione	Nel biennio 2020-2021, è stato avviato un processo di partecipazione e di co-progettazione sul centro storico, con la finalità di individuare azioni per la rigenerazione del tessuto urbano e la creazione di reti sociali tra le realtà operanti nell'area. Il processo, con l'emergenza Covid, ha subito delle modifiche rispetto alle azioni inizialmente programmate. Nel 2022 prosegue l'attività intrapresa nel biennio scorso attraverso la coprogettazione e il coordinamento con gli attori locali. Nel primo semestre è stato avviato il processo partecipativo. Nell'ambito del progetto di riqualificazione di Via Pistoiese, i cui lavori di realizzazione sono attualmente in corso, è stata avviata la predisposizione del piano della sosta dell'area via Pistoiese- via Giordano.	44%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali	<p>Risulta in ritardo la pubblicazione dell'indagine di mercato e l'invito alla gara per il mercato coperto di via Bruno a causa dei lavori in corso di forestazione urban jungle.</p> <p>Relativamente alla valorizzazione dei centri civici e il rafforzamento del loro rapporto con il territorio, nel 1° semestre 2022 sono stati attivati percorsi partecipativi per la definizione dell'attività da realizzare e sono iniziati interventi di manutenzione e riorganizzazione di alcuni centri.</p> <p>Continua Il processo di rinnovo delle concessioni riguardanti i mercati, i posteggi fuori mercati e le edicole su area pubblica che si concluderà a fine 2022.</p>	10%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	<p>Le attività culturali hanno ripreso regolarmente. Si sono rinnovate le rassegne presso Manifatture Digitali cinema, Villa Rospigliosi, Giardino Buonamici, con appuntamenti più saltuari presso il chiostro di San Domenico e Anfiteatro Santa Lucia.</p> <p>Si è rinnovata la collaborazione con la Fondazione Museo Pecci per l'organizzazione del "Centro Pecci summer live", con due concerti sold out.</p> <p>Per quanto riguarda la Scuola di Musica Verdi, le lezioni si sono svolte sempre in presenza tranne nei casi di impossibilità dei docenti. In tali circostanze sono state garantite comunque le lezioni a distanza, in modo da assicurare un ambiente sicuro e la</p>	64,50%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>prosecuzione delle attività didattiche anche in assenza del docente. La scuola di Musica ha partecipato al Festival europeo delle scuole di musica che ha avuto luogo nel mese di maggio in Lussemburgo e si è rinnovato il progetto di scambio culturale con Taverny</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</p>	<p>Le strutture museali della città hanno continuato le loro attività normalmente. Sempre più attenzione viene posta al rapporto fra musei e scuole, infatti sono state ampliate le iniziative in ambito didattico e data attuazione del progetto "Cantiere Digitale". La mostra Hi Woman presso Palazzo Pretorio, iniziata a dicembre 2021, e curata da Francesco Bonami, è terminata il 27 marzo. Inoltre è stata realizzata la mostra dal titolo Ritratti /Portraits dell'artista Pietro Costa (23 aprile-31 luglio). Realizzazione della mostra MVA CHAH - NAMSAL SIEDLECKI, in collaborazione con centro Pecci, presso il Cassero (11 giugno-28 agosto) Le attività di Officia Giovani si sono svolte regolarmente anche se con alcune difficoltà legate alla pandemia: è ripartita la rassegna del teatro comico, ferma ormai da 2 anni, si sono svolti i laboratori di Officina Teen e la rassegna dal titolo "Condominio OG". Di grande impatto e successo l'installazione, in Piazza delle carceri, dell'opera di Meggiato che celebra le vittime innocenti di mafia. Sono state avviate le visite guidate al Polo culturale Campolmi (Biblioteca Lazzerini e Museo del Tessuto) dal titolo Tesori in Campolmi, così da poter far riscoprire ai cittadini il più grande complesso industriale di origine ottocentesca dentro le mura del centro storico di Prato.</p>	<p>43,11%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura	<p>Al fine di rendere sempre più fruibile il patrimonio comunale conservato nei depositi del museo di Palazzo Pretorio, è stato stipulato un accordo con il Coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali. Tale accordo consente di rivedere l'inventario delle armi e dei materiali facenti parte dell'antico Museo del Risorgimento che aveva sede nel palazzo Pretorio. Per quanto riguarda la valorizzazione delle strutture culturali, sono state organizzate una serie di visite guidate che partendo dal Castello e dal Cassero hanno portato i visitatori a scoprire i quartieri della città e la loro storia, così come sono stati organizzati laboratori per bambini e famiglie.</p> <p>Sono stati approvati i progetti di fattibilità relativi agli interventi finanziati dal PNRR relativi al Museo Pecci, Officina Giovani e S.Caterina.</p>	14,67%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva	<p>Il 2022 è segnato dalla ripresa del settore turistico, con il ritorno delle presenze straniere che erano drasticamente diminuite durante la pandemia. Anche Prato vede tornare i turisti ai livelli pre Covid.</p> <p>Nel primo semestre del 2022 si segnala l'inaugurazione il 7 maggio di "La via delle rocche" un nuovo cammino nell'Appennino pratese tra medioevo e natura che unisce per la prima volta la Rocca di Montemurlo, Torre Melagrana in Calvana, Rocca Cerbaia e Rocca di Vernio, e l'organizzazione di un grande evento che si è tenuto alle Cascine di Tavola il 12 giugno dal titolo "La via Medicea in festa".</p> <p>Nel cuore del centro storico di Prato si è svolta la manifestazione EATPrato 2022.</p> <p>Continua l'organizzazione e promozione del Turismo industriale con gli 8 itinerari di turismo industriale che hanno toccato oltre 25 luoghi tra edifici di archeologia industriale, archivi aziendali e fabbriche in attività. In collaborazione con il Museo del Tessuto.</p>	53%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</p>	<p>Sono state attivate nuove postazioni Videosorveglianza cittadina. Sono stati installati 22 telefoni VOIP nelle scuole comunali, nonché l'installazione di due nuove salette per le videoconferenze in Palazzo Comunale. Continua l'espansione della rete wi-fi comunale grazie la progetto Infratel. Sono stati attivati 4 nuovi punti e 16 sono in corso di attivazione. Continua la migrazione PostgreSQL di procedure su Oracle. È stato completato il dispiegamento del fascicolo gare sul portale Tuttogare e dell'archiviazione sostitutiva su DAX, e sono state illustrate agli utenti dei vari Servizi comunali le funzionalità di tali strumenti. Sono state attivate nuove funzionalità nell'applicativo di gestione dei cimiteri.</p>	<p>53,50%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</p>	<p>Sono innalzati i livelli di sicurezza informatica attraverso il rinnovo delle piattaforme, attività formative rivolte ai dipendenti e campagne anti phishing.</p>	<p>50%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</p>	<p>Nel mese di aprile è stata approvata l'Agenda Digitale 2022/2024. E' continuato il progetto per il rilascio delle credenziali SPID alla cittadinanza, coinvolgendo le sedi decentrate del Comune e la biblioteca, in vista dell'attivazione del nuovo catalogo, il cui accesso avverrà tramite Spid. E' proseguita l'implementazione dei servizi su PagoPa (ordinanze di ingiunzione per ambiente, turismo e sociale). Inoltre, dalla metà del mese di maggio tutte le sedi decentrate sono state dotate di terminali pos per i pagamenti elettronici E' proseguito lo sviluppo di nuovi servizi online, tra cui: il servizio di cambio di residenza sulla piattaforma ANPR del Ministero dell'Interno, la richiesta rinnovo occupazione suolo pubblico temporanea, il bando insegnanti scuola di musica, il rilascio attestato sostitutivo per elezioni. E' stato avviato il sistema di Ticketing per le informazioni dei Servizi Demografici, Servizio edilizia Sportiva e per Ufficio Stampa. E' stata avviata l'attività della Control Room, integrando i flussi di dati nella piattaforma regionale in uso.</p>	<p>45,56%</p>

AMBITO STRATEGICO - Città del futuro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>5. Rigenerazione urbana</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</p>	<p>Continua l'attività di monitoraggio del Piano Operativo, per verificarne l'impatto sulla trasformazione del territorio.</p>	<p>35,50%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>5.2 Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</p>	<p>Fra i progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, nel 1° semestre si sono conclusi i lavori di riqualificazione delle aree di San Paolo e Chiesanuova, compresi nel progetto Piu-Urban Places relativi ai giardini di via Vivaldi, via dell'Alberaccio, via Spontini, via Da Prato, mentre sono in corso i lavori di riqualificazione dei giardini di via Wangen.</p>	<p>100</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
----------------------	---

6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	<p>Per rafforzare la sicurezza, si è agito potenziando il controllo del territorio, incentivando la presenza delle pattuglie nelle frazioni e nel centro storico. Nelle frazioni è stata portata avanti un'attività strutturata di polizia di prossimità, attraverso i punti mobili di ascolto presenti nelle zone di massima aggregazione.</p> <p>Coerentemente con la ripresa dell'attività post-pandemica, è stato intensificato il presidio del territorio in occasione degli eventi e manifestazioni programmate nei giorni festivi.</p> <p>Sono stati organizzati servizi specifici di controllo diretti alla repressione di comportamenti cause di incidenti stradali, come la guida in stato di ebbrezza, la guida con il cellulare la guida senza assicurazione o senza patente.</p>	47,38%

Obiettivo strategico

Obiettivi di sviluppo sostenibile globale

7. Dal decoro della città alla tutela del territorio



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	Sono in corso i lavori di risagomatura di quattro fossi di raccolta delle acque di drenaggio per la riduzione del rischio di esondazione nelle zone di: S.Giorgio a Colonica, Tavola, Paperino, Castelnuovo.	75%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)	<p>La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria è stata portata avanti durante tutto il primo semestre senza interruzioni.</p> <p>È stato regolarmente svolto il servizio di illuminazione pubblica, così come l'attività di manutenzione del verde pubblico,</p> <p>Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi verdi, sono stati conclusi i lavori nei giardini di Via Carlo Marx, nei giardini della scuola Da Quarata, nei giardini di Via Valori a Galciana, Via Capponi, Via Hermada e nell'area verde di Via Tirso.</p> <p>Sono state individuate le linee progettuali principali del nuovo parco Giocagìo che sarà realizzato in Via Turchia.</p> <p>Si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione ed eliminazione di barriere architettoniche presso vari cimiteri comunali.</p>	54,56%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
---------------------	-----------------------------------	---------------

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.3 Garantire l'efficienza dei servizi a rete	Azioni previste nella seconda parte dell'anno	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	Il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti) è stato svolto regolarmente. Dopo la conclusione nel 2021 dell'iter amministrativo per la realizzazione di un centro di raccolta in Via Paronese, nel primo semestre 2022 ha inizio la fase realizzativa del centro a cura di Alia.	50%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	Il servizio Protezione civile è stato coinvolto fino al 31/03/2022 nel coordinamento della COC, attiva 24h, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Con la cessazione dello Stato di Emergenza è stata avviata la fase di "Superamento dell'emergenza", attraverso il coordinamento di tutte le attività necessarie al ripristino dello stato ordinario. E' inoltre stata avviato il processo di formazione per i volontari di protezione civile, attraverso lo sviluppo di un progetto formativo, già inviato alla Regione per l'ottenimento del nullaosta. Continua il processo di revisione e aggiornamento della Pianificazione Operativa Comunale di Protezione Civile.	54,43%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Per quanto riguarda la tutela degli animali, sono proseguite le ordinarie attività di gestione del canile sanitario, del canile "il Rifugio", del servizio S.O.S. animali 24h/24h, la gestione del oasi felina gattile "la Bogaia" e delle colonie feline. E' stato concluso l'affidamento del	45%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	servizio di cattura dei gatti di colonia finalizzato alla sterilizzazione degli esemplari. Sono in corso di predisposizione i capitolati per il nuovo affidamento dei servizi connessi al randagismo animale.	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	<p>Per quanto riguarda la bonifica dei canali di competenza del comune di Prato si è conclusa la bonifica del Piazzale Palasaccio ed è stata ottenuta la valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Toscana per il Canale della Corsa delle Cascine di Tavola.</p> <p>In vista dell'adozione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) si è conclusa l'analisi dei risultati delle indagini di vulnerabilità climatica del territorio e la valutazione degli assorbimenti di carbonio. Il Comune di Prato è stato selezionato dalla Commissione Europea tra le 100 città dell'Unione che parteciperanno alla missione "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030" con le conseguenti attività che dovranno necessariamente coordinarsi ed integrarsi con la stesura del PEASC. Essere stati selezionati dalla Commissione Europea per la missione suddetta, comporta una necessaria rivalutazione degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti fissati per il PAESC, che necessariamente dovranno tendere alla neutralità climatica al 2030, anziché la riduzione inizialmente prevista del 40%.</p>	25%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
8.2 Interventi di efficientamento energetico	<p>Con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici sono iniziati i lavori presso il Palazzo Benassai e sono stati affidati i lavori per la scuola Borgosanpaolo – Le Girandole.</p> <p>A febbraio è stato approvato il progetto per il nuovo Servizio Energia con gli importi rideterminati in conseguenza dei prezzi fissati da ARERA per il 1° trimestre 2022. Conseguentemente a giugno è stata pubblicata la gara, che vista la notevole complessità, è ancora in corso.</p>	43,57%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	<p>Per realizzare il Piano di Forestazione urbana contenuto nel Piano Operativo del Comune di Prato sono state sottoscritte due convenzioni con le università: una con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università degli Studi di Firenze e una con il Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano. Lo scopo è quello di definire delle strategie di forestazione urbana, evidenziando il legame esistente tra forestazione urbana, salute umana, biodiversità vegetale e faunistica e resilienza urbana. Il lavoro previsto con la convenzione stipulata con le università è in corso di svolgimento, in particolare sono stati consegnati gli elaborati relativi alle prime fasi dello studio. Per quanto riguarda il progetto Verde Urbano Carbon Neutral, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana ed è stata sottoscritta la Convenzione. Il progetto consiste in tre lotti funzionali relativi ad aree prospicienti la Declassata. I progetti esecutivi dei primi due lotti (area Via Rimini e area Pecci) sono già stati approvati e sono stati conseguentemente affidati i lavori. Nel mese di maggio è stato approvato anche il progetto esecutivo del terzo lotto (area Nenni).</p> <p>Parallelamente alla forestazione urbana, viene portato avanti il progetto Urban Jungle, che ha lo scopo di creare hub verdi tra la comunità, costruire cioè nuove isole verdi ad alta densità in spazi/ strutture vicini ad aree particolarmente critiche (isole di calore, inquinamento). La sperimentazione prevede la riprogettazione in chiave green di 3 edifici e</p>	45,08%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>delle aree urbane limitrofe per sfruttare la capacità naturale delle piante di abbattere le sostanze inquinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione della comunità e trasformare le aree marginali in veri e propri hub verdi all'interno della città. Con riferimento al progetto pilota del Macrolotto 0 – mercato metropolitano, sono iniziati i lavori, mentre per quanto riguarda gli alloggi popolari Via Turchia, è stato approvato il progetto esecutivo e la realizzazione verrà portata avanti da EPP. Per quanto riguarda la realizzazione di una serra per la produzione di ortaggi in via delle Pleiadi, è stato approvato il progetto definitivo a fine 2021, sono in corso indagini per la revisione del progetto in modo da poter utilizzare la Farm Park anche per fini didattici.</p> <p>E' stata inoltre data continuità all'insieme di azioni che ruotano intorno alla piattaforma informatica Prato Forest City (lanciata a dicembre 2021) e che sono rivolte al coinvolgimento dei cittadini nelle attività di progetto e più in generale nell'implementazione della strategia di forestazione urbana elaborata dall'AC.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>9. Mobilità sostenibile</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</p>	<p>La Polizia Municipale di Prato ha dedicato particolare attenzione al progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Ha elaborato ed organizzato progetti formativi che hanno come obiettivo l'apprendimento delle regole della circolazione e l'educazione alla legalità ed al rispetto degli altri. Nel</p>	<p>59,25%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>primo semestre sono state effettuate 285 ore di educazione stradale.</p> <p>Sono partiti controlli specifici in tema di autotrasporto volti a verificare i comportamenti ed eventualmente sanzionare le violazioni, in considerazione della percorrenza regolare di veicoli dedicati in specie nelle aree produttive ed artigianali del nostro territorio.</p> <p>Sono stati attivati controlli per limitare e contrastare tutti quei comportamenti scorretti e contrari al codice della strada, che vengono posti in essere nel camminare e nel guidare biciclette e monopattini. Oltre ai controlli, sono stati effettuati incontri con gruppi di cittadini extracomunitari, che fanno un frequente utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile, al fine di porre l'attenzione sull'utilizzo corretto dei questi mezzi e sul rispetto, con essi, del codice della strada.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</p>	<p>Sono iniziati i lavori per il collegamento fra Via S. Allende e Via Tobbianese e sono stati aggiudicati i lavori di mitigazione ambientale della seconda tangenziale, che riguardano la sistemazione idraulica dei prismi arginali. Risulta invece in ritardo l'inizio dei lavori dell'intersezione via Manzoni, via Bigoli, via Verzoni</p> <p>Nell'ambito del sistema della sosta a pagamento dell'intero territorio comunale, è stato avviato un processo per integrare/effettuare il rilevamento complessivo di tutti gli stalli di sosta esistenti, la loro suddivisione ed attribuzione numerica rispetto alle varie vie e/o piazze e la definizione della relativa tariffazione.</p>	<p>29,17%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità</p>	<p>Nell'ambito dello sviluppo della mobilità alternativa, il Comune di Prato nel 2019 ha beneficiato di un finanziamento della Regione Toscana per la realizzazione di un</p>	<p>39,17%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
alternativa	<p>collegamento ciclabile fra la Stazione Leopolda di Firenze e il Museo Pecci. Nel 2021 si sono conclusi i lavori del 1° lotto, mentre nel 1° semestre 2020 sono stati aggiudicati i lavori del lotto 2. Per quanto riguarda la Ciclovía del sole, è in ritardo la progettazione definitiva, che comunque si approverà entro l'anno.</p> <p>Per quanto riguarda la realizzazione di piste ciclabili cittadine, queste beneficiano di due importanti finanziamenti: il Credito sportivo e il PNRR. Gli interventi sono tutti in fase di progettazione. Il Biciplan, che dovrebbe essere approvato a fine anno, è stato adeguato per coordinarsi con gli interventi di cui sopra.</p> <p>Relativamente al servizio di trasporto pubblico, è stata pubblicata la gara per la realizzazione di una campagna di rilevazione e di monitoraggio della qualità reale e percepita dei servizi di trasporto pubblico, sia in riferimento al TPL che al servizio ferroviario, nonché alle loro interconnessioni.</p>	

AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>10. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari	Dal 1 gennaio si è concluso il passaggio alla gestione diretta della SdS. Il percorso, iniziato nel 2020, ha visto prima il passaggio a gestione diretta degli altri comuni della Provincia e delle assistenti sociali di tutti i comuni, per poi concludersi nel primo semestre 2022 con il	97%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	passaggio delle attività socio assistenziali del Comune di Prato previste dalla convenzione . Si è così data effettività e concretezza all'obiettivo regionale di attuare, tramite la forma del consorzio pubblico delle società della salute, l'integrazione funzionale tra i servizi socio sanitari e socio assistenziali delle aree zonali.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
10.2 Sostenere le fragilità diffuse	<p>Inclusione sociale: i servizi sono stati offerti in modalità integrata con i servizi sociali degli altri comuni soci SDS, in particolare: è stato rinnovato il servizio di accesso consapevole e assistito ai servizi e alle informazioni alla cittadinanza denominato Nuovo Social Board, è stato rafforzato il servizio di segretariato social, continuano le analisi e le valutazioni multidimensionali dei bisogni con i relativi percorsi di inclusione.</p> <p>Vengono portati avanti interventi di emergenza alloggiativa, ed è stata redatta la bozza del nuovo regolamento sull'emergenza alloggiativa, che verrà approvato a breve.</p> <p>Prosegue l'erogazione dei servizi inerenti alla tutela dei minori e delle donne con minori, gestanti o vittime di violenza. In particolare: assistenza domiciliare, servizio educativo individuale, strutture residenziali e semiresidenziali, servizio affidi e contributi per estate ragazzi.</p> <p>Nel primo semestre 2022 sono state avviate le attività amministrative e professionali per l'applicazione della normativa in materia di accreditamento delle badanti funzionali all'erogazione degli assegni di cura e di altri istituti a sostegno della domiciliarità. E' stata conclusa la co-progettazione del trasporto sociale di persone anziane e disabili per l'area pratese e dal 01/06/2022 sono avviate le attività della nuova convenzione. Sono proseguiti i servizi di assistenza domiciliare e fornitura pasti caldi, sia per le persone anziane e disabili, che per i soggetti positivi al Covid.</p> <p>Sono in fase di valutazione i progetti per l'inserimento di anziani autosufficienti nei gruppi appartamento Si tratta di un nuovo servizio per l'area pratese avviato negli ultimi mesi del 2021 e che consente di proporre risposte a tematiche abitative con necessità assistenziali e di tutela per persone anziane e fragili.</p>	60,88%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	Continua la gestione dei progetti di contrasto all'esclusione sociale e alla grave marginalità oltre alla redazione e presentazione di nuove proposte progettuali.	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
11. Una casa per tutti	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
11.1 Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative	Nel primo semestre 2022 non sono previste azioni specifiche per questo obiettivo.	n.r.

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	In data 21 aprile è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione delle case popolari con 1152 ammessi e 498 esclusi Continuano le attività di controllo sugli alloggi assegnati e sul rilascio dei nulla osta per le locazioni a canone calmierato.	69,20%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>12. Accogliere, includere, integrare le diversità</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</p>	<p>I servizi in materia di immigrazione e protezione internazionale sono proseguiti regolarmente. La strutturazione dello sportello consente una progressiva qualificazione e il conseguente rafforzamento dell'erogazione dei servizi al cittadino, in sinergia con altri servizi dell'A.C., la Questura di Prato, la Prefettura di Prato - UTG, nonché l'Ufficio estero e il Centro salute mentale dell'Azienda USL Toscana Centro.</p> <p>Sono in corso di realizzazione le attività dei seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto L.A.I.V. (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità), che prevede azioni in continuità con il sistema di inclusione scolastica previsto dal "Modello Prato e azioni sperimentali sia in ambito scolastico che di inclusione socio-lavorativa - progetto TEAMS che prevede il rafforzamento dell'accesso consapevole per la presa in carico integrata in ambito socio-lavorativo - progetto LINEE EDUCATIVE URBANE - progetto APRITI SESAMO che si occupa di corsi di lingua e corsi di formazione specifici rivolti a cittadini di Paesi Terzi, in particolare a target vulnerabili di beneficiari (donne, disoccupati, ecc.); - progetto EMBRACE specifico per azioni di ricerca e analisi territoriale, supporto al la partecipazione dei migranti nei processi decisionali e nell'implementazione delle politiche di inclusione. - progetto L.I.P.S. con l'attivazione di un assegno di ricerca emanato dalla Regione Toscana, con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle politiche e dalle misure pubbliche messe in atto dal Comune di Prato nel campo della promozione della lettura destinate alle comunità immigrate. 	<p>46,29%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>Nel primo semestre del 2022 l'A.C. ha lavorato sulla valorizzazione dei progetti di accoglienza aderenti alla rete nazionale S.A.I. (Sistema Accoglienza e Integrazione) e S.A.T.I.S. (Sistema Antitratta Toscana Interventi Sociali) in relazione a beneficiari adulti rafforzando sistema di governance locale per l'accoglienza e l'erogazione di servizi integrati rivolti a soggetti vulnerabili.</p> <p>Nell'ambito del progetto di superamento delle aree di sosta di rom e sinti, sono stati approvati: il Regolamento per la permanenza delle famiglie rom e sinti nelle aree residenziali attrezzate e per il loro superamento e il Piano per il superamento delle aree. E' in corso l'orientamento e l'accompagnamento alloggiativo per il superamento dell' Area di sosta di V.le Manzoni.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
12.2 Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	<p>Nel corso del primo semestre sono state portate avanti iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere una cultura delle pari opportunità, che hanno riguardato: la Giornata internazionale dei diritti della donna, la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia E' stato sottoscritto l' "Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY.(Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni) per rafforzare la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e promuovere l'adesione alla rete RE.A.DY sul territorio della Regione Toscana".</p>	50%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>Il Comune di Prato gestisce in modo diretto nove strutture di Nido d'infanzia nell'a.e 2021/2022, che diverranno dieci nell'a.e 2022/2023 grazie all'apertura da settembre del Nido "Le Fontanelle", accogliendo oltre 350 bambini.</p> <p>La gestione diretta del servizio unitamente al sistema integrato pubblico/privato, dove accanto ai nidi comunali operano, alle stesse condizioni, i nidi privati convenzionati, garantisce una offerta diffusa ed uniforme nella città.</p> <p>Il servizio di Nido d'Infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali si è svolto anche per l'anno scolastico 2021/2022 in applicazione delle norme anticontagio Covid-19.</p> <p>Per promuovere le attività e il gioco dei bambini all'aria aperta è proseguito il Progetto "Crescendo...tutti all'aria".</p> <p>E' stata predisposta la bozza di convenzione fra Comune e nidi privati con una prospettiva temporale triennale e con la messa a punto di un meccanismo che, sostenendo le famiglie nell'esborso economico per il pagamento della rette di frequenza, garantisca la sopravvivenza delle imprese operanti in questo settore, duramente colpite dal protrarsi dell'emergenza pandemica.</p> <p>E' stata predisposta la gara aperta per l'affidamento dei Servizi integrativi per l'infanzia: Spazi Gioco Centri per Bambini e Famiglie e Laboratori estivi con una durata pluriennale, così da garantire una continuità educativa.</p>	<p>48,63%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure	<p>Si sono conclusi i lavori della scuola primaria di Casale relativi allo spazio polivalente. Sono ancora in corso i lavori dello spazio polivalente della scuola Santa Gonda, i lavori di ampliamento della scuola di Cafaggio (1°e 2° lotto) e la realizzazione delle nuove aule della scuola Dalla Chiesa.</p> <p>Sono iniziati i lavori alla copertura delle scuole d'infanzia Fontanelle e Tobbiana.</p> <p>Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, sono iniziati i lavori alla scuola Munari di San Giusto.</p> <p>Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3.</p>	37,25%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
13.3 Per una scuola inclusiva	<p>Come ogni anno i servizi educativi del Comune di Prato promuovono azioni di inclusione dei bambini e delle famiglie straniere che frequentano le scuole comunali. E' necessario infatti un supporto qualificato in quelle classi dove sempre più numerosi frequentano bambini stranieri o con genitori stranieri. L'educazione interculturale a scuola è rivolta a insegnanti, bambini e genitori.</p> <p>Le attività per l'inclusione scolastica degli alunni con background migratorio si sono svolte durante tutto il semestre, nello specifico è stato attivato il servizio di supporto ai genitori per le iscrizioni scolastiche dell'a.s. 2022-2023, sono stati realizzati i laboratori di facilitazione linguistica in presenza, sono stati completati i laboratori di didattica inclusiva a classe intera, avviati ad inizio anno scolastico, in ciascun Istituto Scolastico sono state realizzate attività di sostegno alla genitorialità attraverso l'attivazione di sportelli di mediazione linguistico-culturale così da poter mantenere e migliorare le comunicazioni scuola-famiglia.</p> <p>Sono inoltre stati organizzati, con modalità diffusa in tutti gli istituti, i corsi estivi di lingua italiana L2 rivolti agli alunni della scuola primaria.</p> <p>Sono continuati gli interventi garantire il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuola primaria. Continuano i controlli e i monitoraggi sull'assolvimento dell'obbligo scolastico.</p>	44%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</p>	<p>Dopo il periodo di pandemia sono riprese regolarmente le attività delle biblioteche, sia della Lazzerini che delle biblioteche decentrate. Sono riprese le visite guidate finalizzate alla conoscenza e promozione dei servizi e delle collezioni della biblioteca, e gli incontri con le classi. Dopo quasi due anni di stop sono ripartite le aperture domenicali della Biblioteca Lazzerini.</p> <p>Le attività di digitalizzazione sono proseguite sul materiale documentario della Lazzerini, volte a valorizzare il patrimonio storico locale.</p> <p>Il Progetto Lettura rivolto alle scuole del territorio per la seconda parte dell'anno scolastico 2021/2022 si è svolto e concluso regolarmente, tutto in presenza, con la partecipazione di complessive 37 classi (n. 13 alla Ovest e n. 24 alla Nord).</p> <p>È stato realizzato anche quest'anno il progetto scolastico "Lecture per l'estate", cioè la elaborazione e successiva messa a disposizione on line di bibliografie specifiche per gli alunni dei vari gradi scolastici, rivolte agli insegnanti.</p> <p>Per ampliare la fascia di utenza della biblioteca sono state attivate azioni mirate ad alcune fasce di pubblico specifiche (0-6 anni, bambini con gravi difficoltà di lettura, 15-20 anni).</p> <p>È stato adottato il Patto Intercomunale per la lettura, che ha coinvolto i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese (Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio).</p> <p>Sono stati portati avanti vari progetti culturali e formativi, tra cui: l'organizzazione di rassegne, mostre e corsi formativi e il progetto lettura con le scuole che ha riguardato la sezione ragazzi e bambini.</p>	<p>58%</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</p>	<p>Sono stati approvati i seguenti progetti di fattibilità Tecnico Economica, ammessi, a fine 2021, a finanziamento nell'ambito del PNRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo da calcio Paperino II lotto; - Piscina Galilei: riqualificazione impianti - Adeguamento antincendio palestra di via Roma piano primo; - Riqualificazione vari campi da calcio e rugby (Viaccia, Maliseti, Montano e Fantaccini). <p>Nel 2022 è stata ammessa a finanziamento del PNRR anche la realizzazione della nuova piscina olimpionica.</p> <p>Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo campo sportivo di Paperino e la realizzazione di due nuove palestre del complesso multidisciplinare di San Paolo. Per il dettaglio dei lavori si veda la parte 3.</p>	<p>16,67%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>14.2 Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</p>	<p>Proseguono regolarmente le attività a sostegno dei principali eventi sportivi cittadini. Confermata l'attività del Trofeo Città di Prato per la promozione dello sport nelle scuole, a riguardo si precisa che è stata avviata la predisposizione del testo del nuovo protocollo e del nuovo disciplinare tecnico, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze del rinnovato contesto di riferimento.</p> <p>E' stata pubblicata la manifestazione di interesse per la concessione in gestione ed uso delle palestre comunali per la stagione 2022 - 2023</p>	<p>58,27%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>E' entrata a regime la nuova piattaforma delle segnalazioni operate dai concessionari degli impianti sportivi che richiedono alla A.C. interventi di manutenzione straordinaria.</p> <p>E' iniziata la mappatura delle strutture sportive comunali finalizzata alla individuazione degli impianti che, anche sulla base di eventuali modifiche edilizie di minima, possono essere convertiti all'impiego per lo svolgimento delle attività dei livelli più elevati di categoria.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>15. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>15.1 Diritto di essere ascoltati</p>	<p>Continuano le azioni necessario per ottenere il riconoscimento da parte dell' Unicef del titolo di "città amica dei ragazzi". A riguardo è in corso di approvazione il Regolamento "Garante dei minori".</p>	<p>40%</p>

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>16. L'amministrazione efficace e efficiente</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>16.1 Il personale dell'ente, una risorse da valorizzare</p>	<p>Nell'ottica di conciliare i tempi di vita lavoro è stato variato il Regolamento sul lavoro agile definendo la disciplina a regime a seguito della cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.</p> <p>Sono state avviate le azioni propedeutiche all'attivazione di uno sportello di ascolto all'interno dell'Amministrazione. Lo sportello ha lo scopo di favorire un completo benessere psico-fisico e sociale del personale del Ente.</p> <p>Sono state rilevate le esigenze formative, finalizzate all'approvazione del Piano della Formazione 2022.</p> <p>Tutte le attività previste per l'ufficio Datore di lavoro sono state regolarmente espletate.</p> <p>Sono stati riattivati, dopo due anni di stop, i tirocini formativi, con l'inserimento di 16 soggetti l'1/6 e altri 11 l'1/7.</p>	<p>49,12%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>16.2 Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</p>	<p>Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e al fine di garantire il raggiungimento di livelli di performance più elevati, si è lavorato sull'ottimizzazione delle</p>	<p>48,87%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	<p>risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente, attraverso azioni di riduzione delle spese e di recupero delle entrate.</p> <p>Con l'assegnazione al Comune di Prato delle risorse PNNR per un totale di circa 40 milioni e il costante pubblicazione di nuovi bandi di finanziamento, si è resa necessaria un'attenta attività di presidio e coordinamento al fine di poter cogliere le opportunità che si presentano selezionando accuratamente i bandi di interesse.</p> <p>Sono stati approvati tutti gli atti necessari per la rimozione dei vincoli sul prezzo di vendita o canone di locazione degli alloggi costruiti su aree PEEP.</p> <p>Sono state individuate sei proprietà comunali destinate alla vendita mediante asta che si concluderà nei prossimi mesi.</p> <p>Continua il costante miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo anche al fine di promuovere la capacità dell'Ente di rendere conto del proprio operato e di quello dei soggetti terzi che erogano servizi pubblici.</p> <p>Al fine di espletare la meglio le operazioni elettorali continua la formazione per i presidenti di seggio iscritti all'albo</p> <p>E' in fase di revisione il Regolamento per i contributi e i patrocini.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>16.3 Garantire la correttezza amministrativa</p>	<p>Nel periodo di riferimento è stato regolarmente assicurato lo svolgimento delle funzioni a supporto del Segretario Generale in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza, di controllo di regolarità amministrativa ex-post (cd. auditing) e di tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali ex Regolamento UE 2016/679. È stato predisposto e adottato il Piano di auditing 2022. In relazione al trattamento dei dati personali è stata costituita la rete dei referenti per la privacy ed è stato svolto l'evento formativo webinar "Le misure organizzative dell'Ente in materia di tutela dei dati personali" rivolto proprio a tutti i referenti privacy.</p> <p>Nel periodo di riferimento è stato regolarmente adottato anche il Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'ente 2022-2024 adeguato alle indicazioni operative</p>	<p>47,69%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
	date da ANAC nel PNA 2019 e alle successive delibere, nonché aggiornato al documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022". il PTPCT presenta una sezione dedicata al whistleblowing, che definisce le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni rese ai sensi dell'art. 54bis del d.lgs. 165/2001 e a maggio è stata inaugurata la nuova piattaforma Openwhistleblowing per l'invio e la gestione delle segnalazioni, con l'occasione è stato proposto a tutti i dipendenti e ai fornitori dell'Ente un evento formativo sul tema.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	<p>È proseguita regolarmente l'attività di gestione della consistenza patrimoniale dell'ente attraverso la tenuta dell'inventario e la corretta valutazione economica dei beni del patrimonio immobiliare. Sono state quindi avviate le azioni finalizzate ad ottimizzare e armonizzare con l'attuale normativa l'uso degli spazi comunali attualmente utilizzati per finalità sociali, nonché migliorare la conoscenza di tutto il patrimonio comunale per poi avviare azioni di razionalizzazione e valorizzazione.</p> <p>Per la gestione delle richieste di acquisizione/locazione/concessione di immobili o terreni da privati è stato attivato un nuovo iter ad hoc.</p> <p>E' stata pubblicata la gara per il nuovo affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti antincendio negli edifici del Comune di Prato.</p>	53,36%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>17. L'amministrazione al servizio della città</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>17.1 Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici</p>	<p>Per semplificare la richiesta di informazioni sui servizi demografici sono state avviate una serie di azioni, rivolte proprio alla agevolazione delle modalità di orientamento degli utenti e comunicazione sui vari canali. E' stato messo on line il nuovo portale dedicato ai dati statistici del Comune di Prato (PRATO CONTA). Per facilitare l'accesso ai servizi on line tramite identità digitale è rimasto attivo presso l'Urp il servizio di rilascio SPID e di promozione sull'accesso ai servizi.</p>	<p>74,20%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili</p>	<p>Per garantire l'erogazione di servizi di qualità, sono state periodicamente effettuate analisi di customer, che nel primo semestre hanno riguardato i servizi educativi (asili nido, Cip) Verde, scuola dell'infanzia, refezione scolastica) servizi demografici on line, politiche giovanili. E' stata effettuata la gestione e organizzazione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022. E' stata effettuata la procedura per la creazione del nuovo Albo dei rilevatori statistici, che eseguiranno nei prossimi anni, per conto dell'ISTAT o del comune di Prato, le interviste alle famiglie o alle aziende in relazione al Censimento e/o alle varie indagini in corso.</p>	<p>45,33%</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>18. L'amministrazione che dialoga: una nuova comunicazione pubblica</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2022	% avanzamento
<p>18.1 Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</p>	<p>Sono proseguite le attività per il completamento del nuovo sito istituzionale e l'attività di comunicazione e promozione sul sito "Città di Prato" e sui canali social. L'Urp ha ripreso la propria attività in presenza, riattivando così quel contatto fisico con i cittadini, che era mancato nel periodo dell'emergenza sanitaria. Parallelamente è stata portata avanti un'attività di promozione di tutte le altre modalità contatto con l'Urp. Sono state realizzate campagne informative dell'Ente su Prato Urban Jungle, Prato Forest City, la Via Medicea, Prisma per le imprese start up e sulla proroga dei permessi di sosta in Ztl.</p>	<p>55%</p>

Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria


L'analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell'impegnato e dell'accertato di competenza al 30.06.2022.

La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate e gli impegni e accertamenti in competenza. Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro.


Tabella 2: Risorse assestate, accertamenti e impegni per obiettivo strategico

Obiettivo strategico		Entrate al 30/06/2022	Accertato al 30/06/2022	% accertato	Uscite al 30/06/2022	Impegnato al 30/06/2022	% impegnato
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	1.395.801,19	494.310,05	35%	2.358.250,79	942.952,62	40%
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	5.200.000,00	499.703,33	10%	20.000,00	-	0%
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	17.393.508,79	7.185.547,65	41%	29.968.639,97	11.451.078,30	38%
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	258.418,00	51.782,27	20%	4.262.245,44	1.044.857,94	25%
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	22.000.318,67	5.221.619,25	24%	18.841.978,85	3.895.100,54	21%
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	13.020.796,66	5.262.022,68	40%	15.095.721,73	5.851.695,23	39%
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	50.914.281,85	23.432.263,41	46%	68.239.060,30	34.889.089,41	51%
Prato città green	2021-OBST-08	9.010.701,24	2.133.196,86	24%	10.411.945,55	4.686.254,27	45%
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	14.471.744,84	12.718.834,00	88%	28.922.120,40	23.189.756,31	80%
Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	1.874.279,73	768.915,69	41%	19.079.224,26	15.570.312,17	82%
Una casa per tutti	2021-OBST-11	520.000,00	52.926,00	10%	2.263.221,45	461.733,60	20%
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	3.274.570,08	207.458,51	6%	3.607.690,75	682.084,73	19%

Obiettivo strategico		Entrate al 30/06/2022	Accertato al 30/06/2022	% accertato	Uscite al 30/06/2022	Impegnato al 30/06/2022	% impegnato
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	28.462.457,85	1.230.040,64	4%	56.897.051,13	15.752.569,61	28%
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	5.970.360,57	2.077.092,02	35%	13.995.897,52	4.820.293,30	34%
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	-	-	-	-	-	-
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	165.449.813,19	64.177.017,02	39%	108.162.321,33	13.547.285,21	13%
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	2.535.540,86	1.826.156,75	72%	9.856.065,54	3.264.730,12	33%
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	8.264,00	-	0%	1.018.286,89	292.815,17	29%

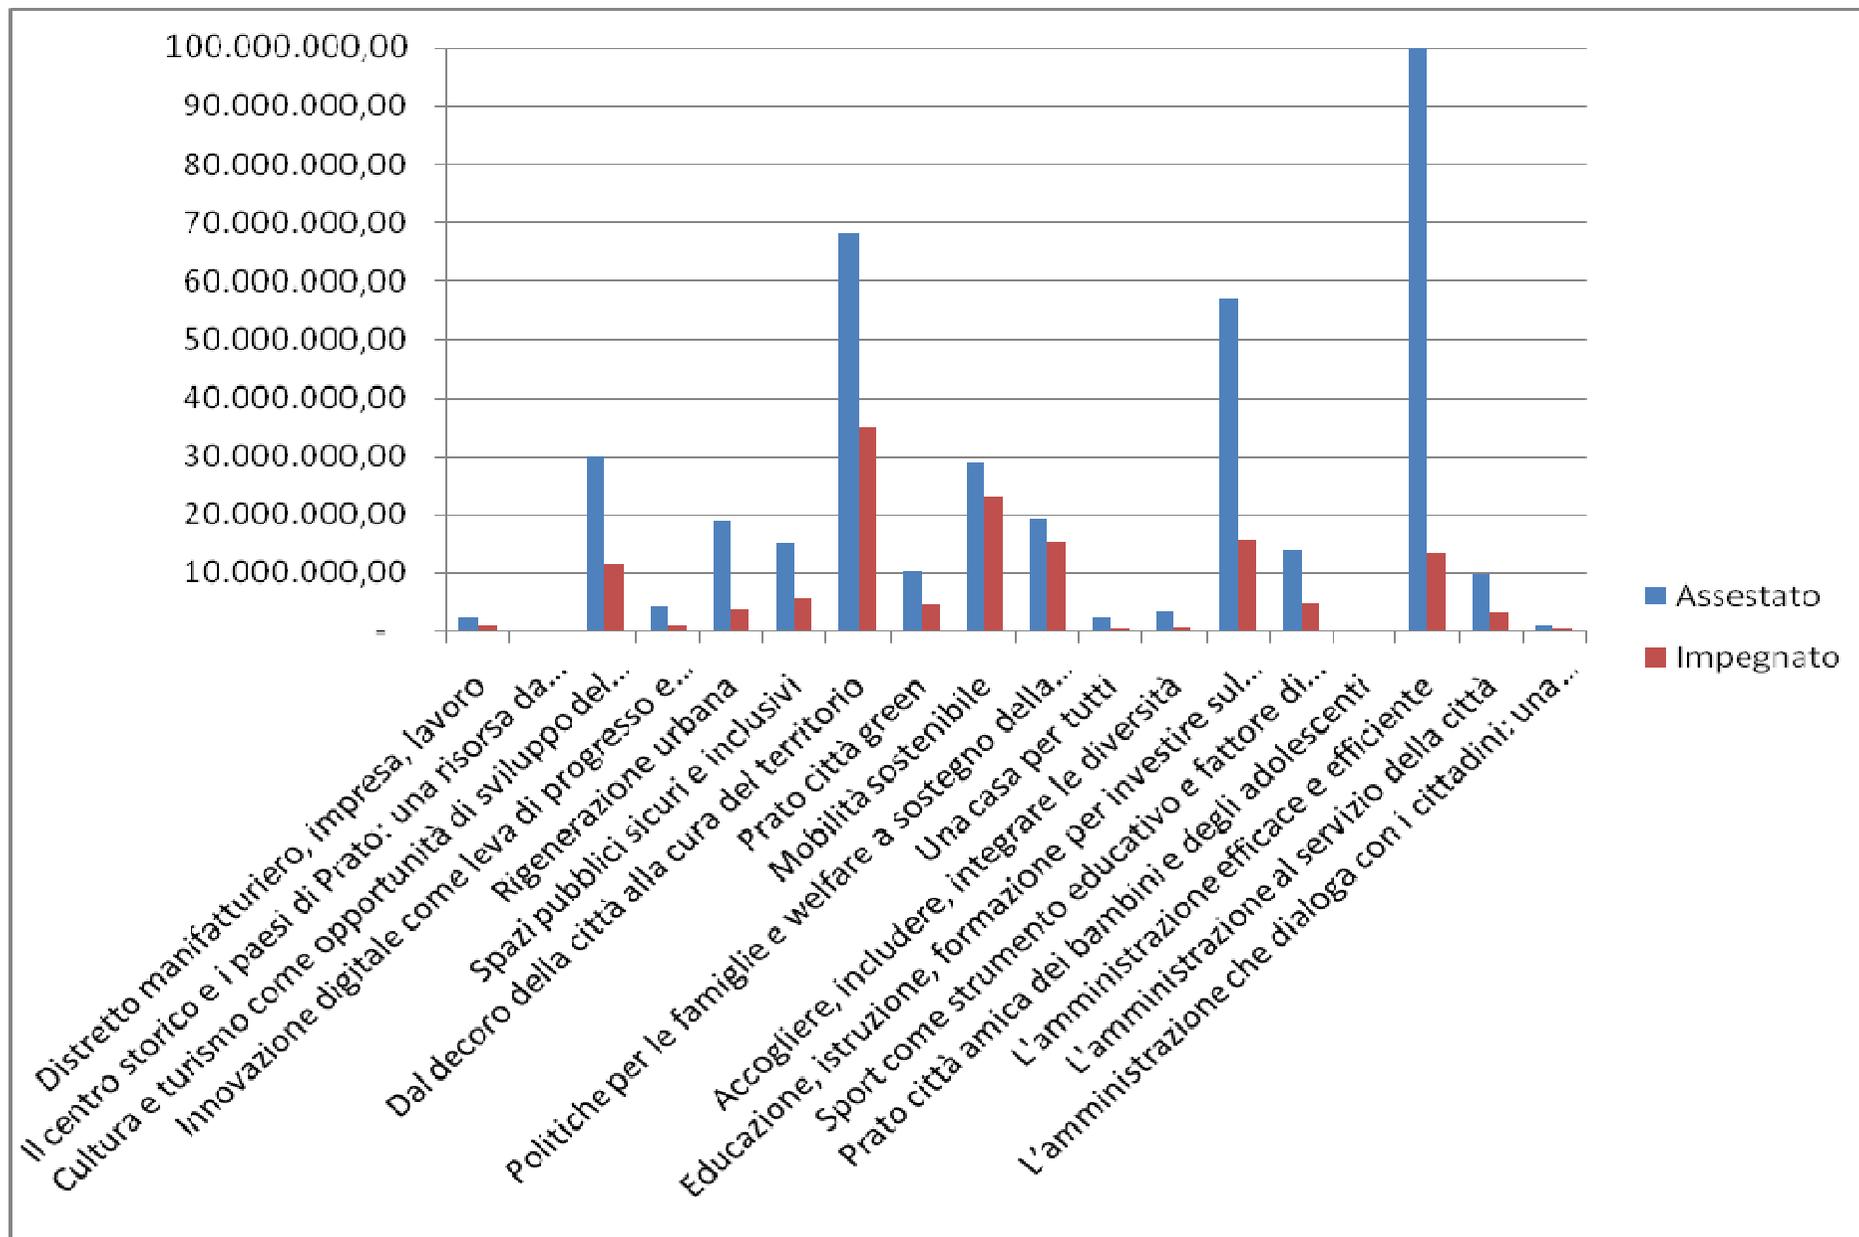

Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici.

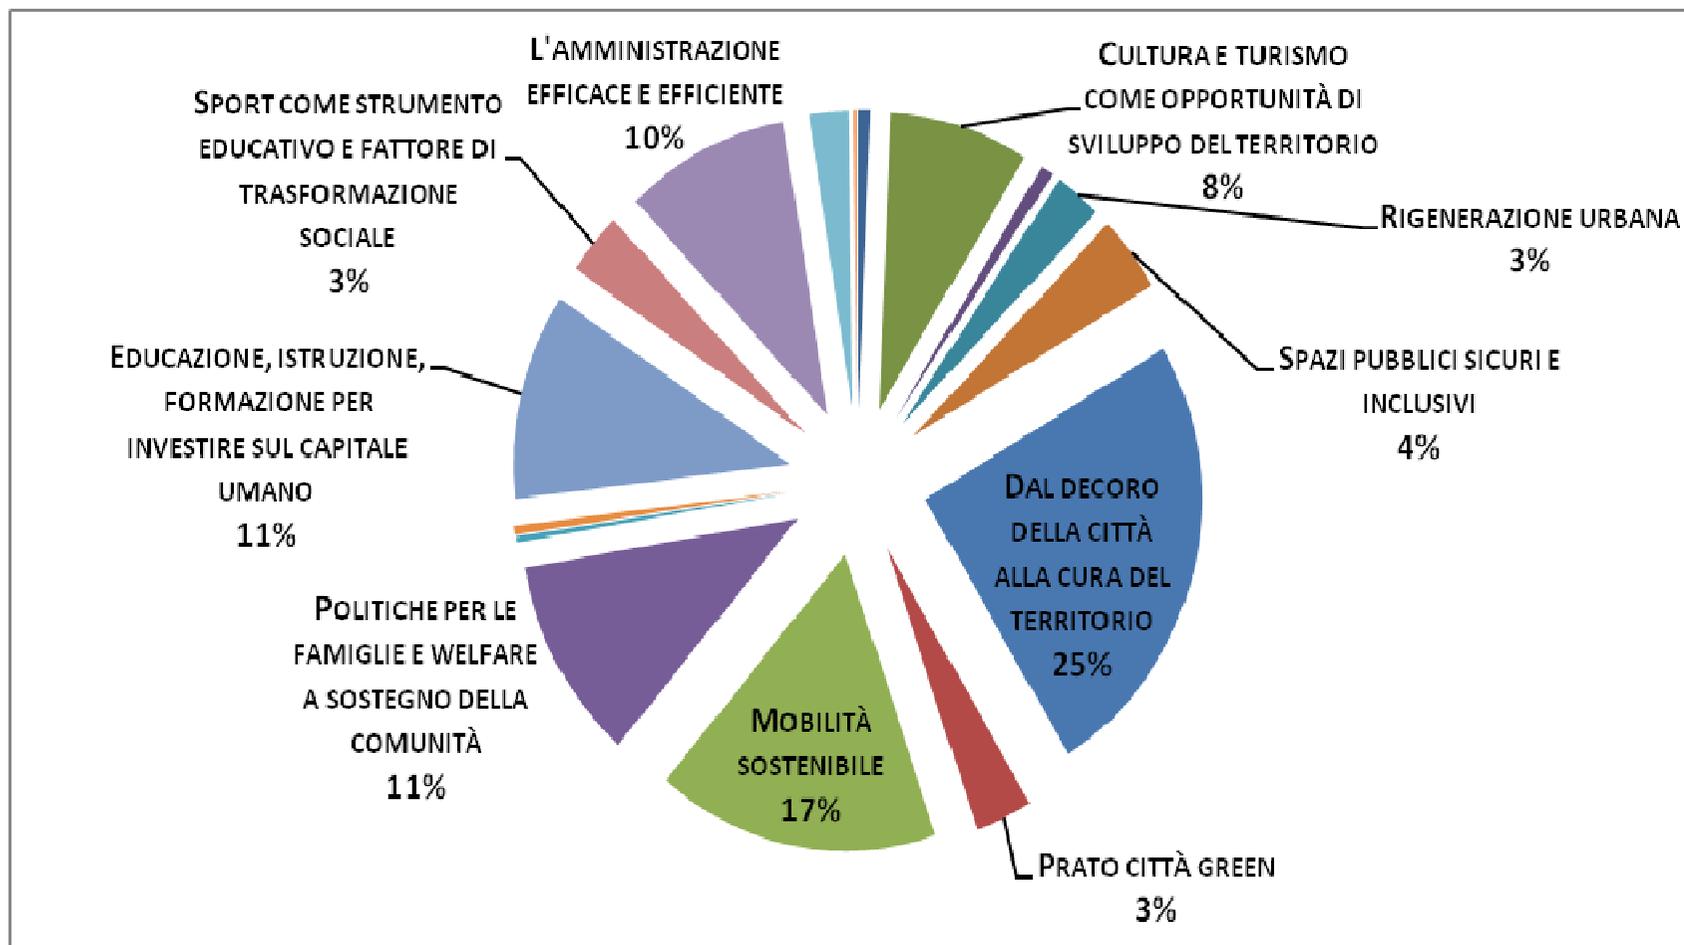

Gli obiettivi strategici dove le spese dell'amministrazione sono state più rilevanti sono:

- *Dal decoro della città alla cura del territorio*, con il 25%: la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- *Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano*, con il 11%: in questo obiettivo rientrano i servizi rivolti ai bambini e giovani (mensa scolastica, asili nido, scuola dell'infanzia, centri gioco e biblioteche) e gli interventi di edilizia scolastica;
- *L'amministrazione efficace e efficiente*, con il 10% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti gli uffici interni dell'amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini;
- *Mobilità sostenibile* con il 17%: qui troviamo i progetti di realizzazione di piste ciclabili e relativi alla mobilità sostenibile, il trasporto pubblico e la revisione del PUMS;
- *Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità* con l'11%: qui troviamo tutta la spesa per i servizi sociali.

La tabella e i grafici seguenti riportano la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all'incremento delle attività finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 riferito alle partite di giro).

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte corrente la 30/06/2022
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	743.088,18
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	-
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	2.631.191,30
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	955.963,79
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	352.650,05
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	3.648.480,63

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte corrente la 30/06/2022
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	27.860.423,77
Prato città green	2021-OBST-08	290.201,14
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	1.866.839,60
Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	15.570.312,17
Una casa per tutti	2021-OBST-11	461.733,60
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	682.084,73
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	12.242.422,86
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	409.294,84
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	-
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	7.756.510,99
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	3.053.495,16
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	292.815,17

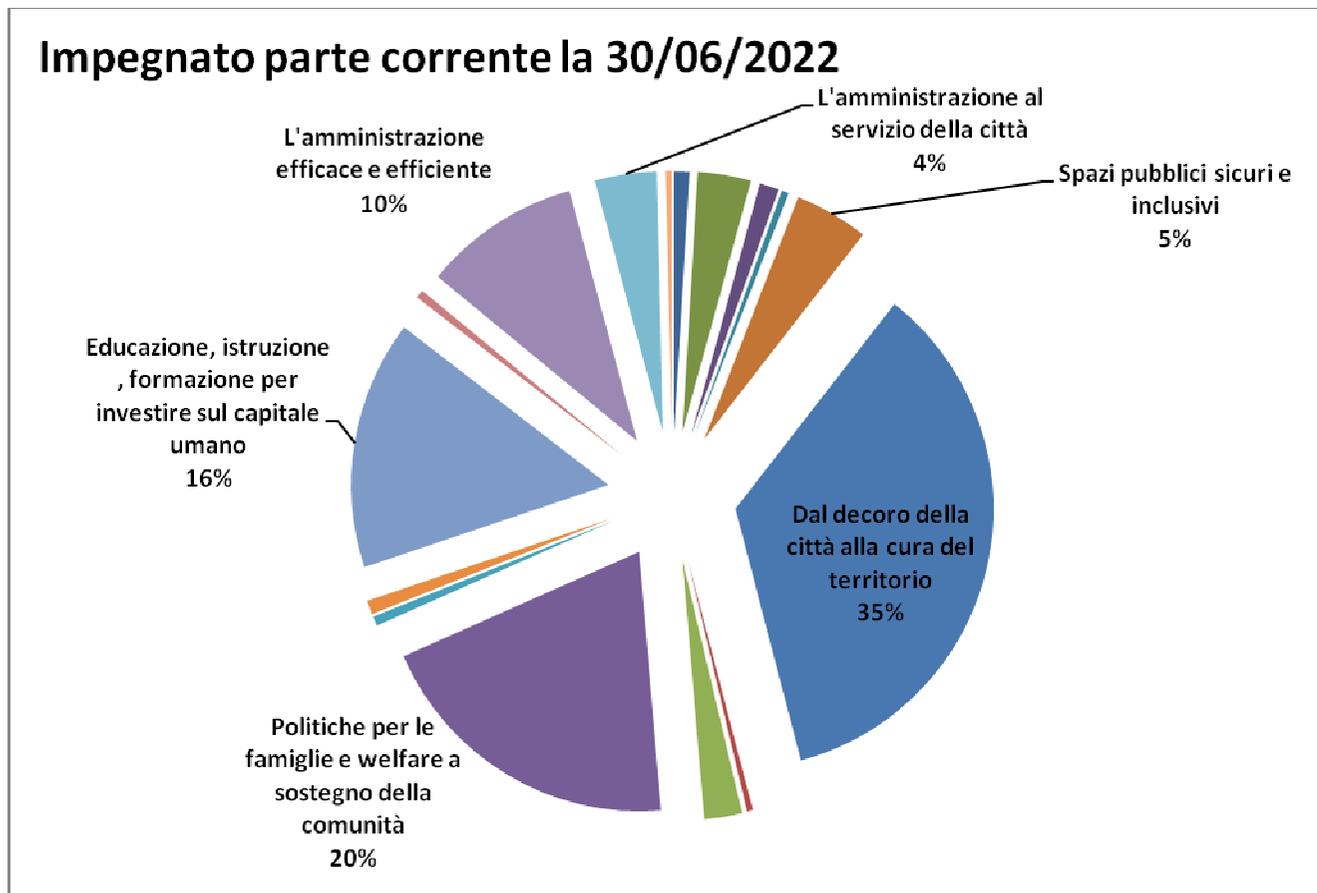


Tabella 3: Spesa corrente per obiettivo strategico

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa corrente sono: “Dal decoro della città alla cura del territorio”, “ Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano”, “Politiche per le famiglie e welfare a sostegno di comunità”.

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte capitale la 30/06/2022
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	199.864,44

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte capitale la 30/06/2022
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	-
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	8.819.887,00
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	88.894,15
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	3.542.450,49
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	2.203.214,60
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	7.028.665,64
Prato città green	2021-OBST-08	4.396.053,13
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	21.322.916,71
Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	-
Una casa per tutti	2021-OBST-11	-
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	-
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	3.510.146,75
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	4.410.998,46
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	-
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	5.610.658,90
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	211.234,96
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	-

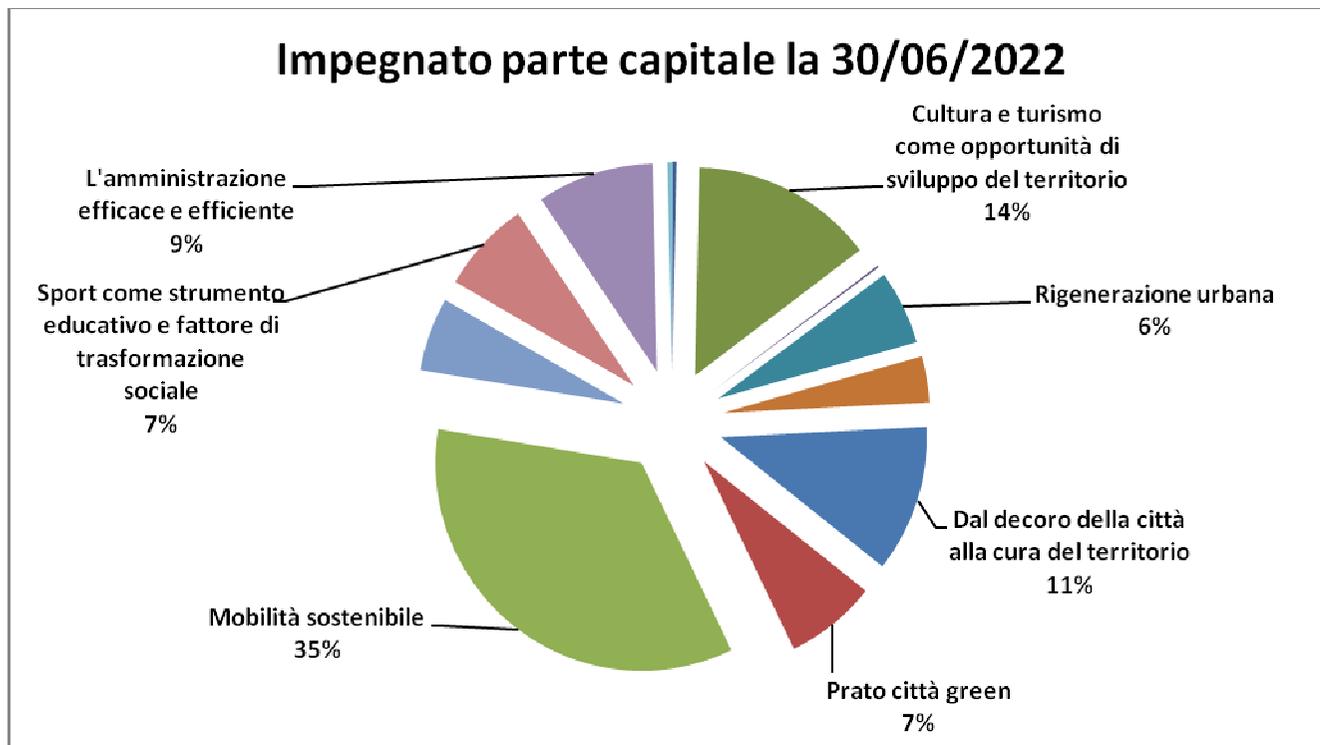


Tabella 4: Spesa in conto capitale per obiettivo strategico

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in conto capitale sono: Mobilità sostenibile, Rigenerazione urbana, Amministrazione efficace e efficiente, Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale, Dal decoro della città alla cura del territorio, Cultura e turismo.


Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 30 giugno 2022

La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 30 giugno 2022, per un totale di 189 opere. Di cui:

- 35 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024;
- 83 riguardano progetti del Piano Opere 2021/2023,
- 34 il piano opere 2020/2022
- 37 sono opere riferite ad anni precedenti.

stato	anni precedenti	2020-2022	2021-2023	2022-2024	Totale	importo progetti
conclusi	6	4	14	2	26	4.484.355,22
lavori in corso	17	15	14	0	46	36.439.327,32
lavori aggiudicati	5	9	8	3	25	9.272.853,20
in fase di gara	0	2	2	4	8	1.233.700,00
progetto approvato	9	4	45	26	84	97.229.146,72
Totale	37	34	83	35	189	148.659.382,46

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i vari stati d'avanzamento. Le opere concluse sono il 14%, quelle con lavori in corso il 24%, quelle aggiudicate il 13%, quelle in fase di gara il 4% e quelle con progetto approvato il 45%.

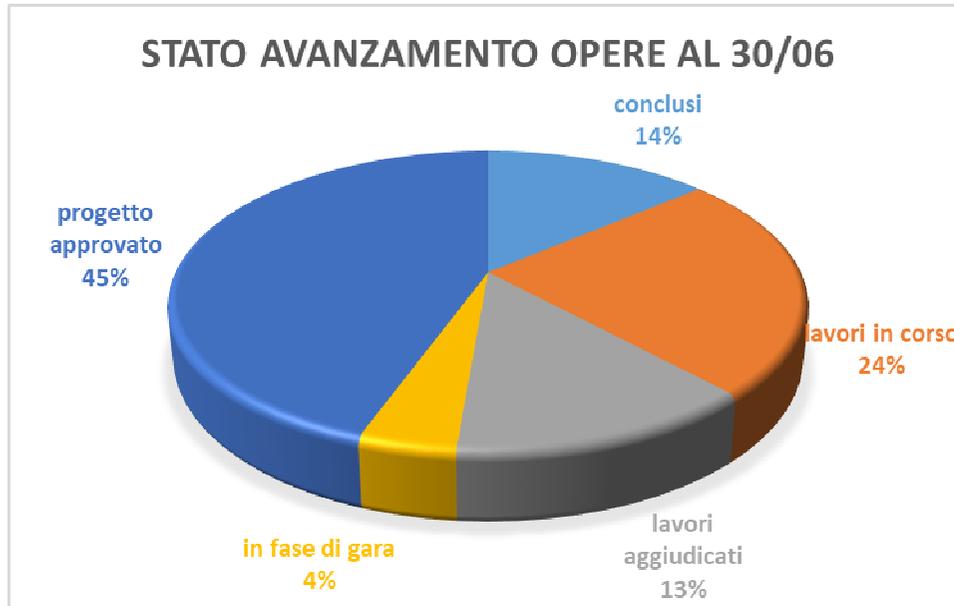

Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento.

OPERE CONCLUSE :

	Opere concluse al 30/06/2022	Area tematica	Importo progetto
1	Nuova area di sgambatura via Curtatone	Ambiente	18.000,00
2	Giardini via Carlo Marx- Riqualficazione Parco giochi	Ambiente	55.000,00
3	Riqualficazione giardini via Valori Galciana	Ambiente	18.000,00
4	Riqualficazione area verde via Tirso adiacente campo sportivo Chiesanuova	Ambiente	23.000,00
5	Riqualficazione giardino scuola infanzia A.Da Quarata	Ambiente	12.000,00
6	Riqualficazione giardino nido via Paisiello San Paolo	Ambiente	18.200,00
7	Riqualficazione giardino via Capponi	Ambiente	37.603,12
8	Riqualficazione giardino via Hermada	Ambiente	51.940,88
9	Risagomatura fossi acque di drenaggio via del Leone	Ambiente	211.989,00
10	Risagomatura fossi acque di drenaggio via Mozza delle risaie, via delle Colombaie	Ambiente	179.197,00
11	Risagomatura fossi acque di drenaggio via della Torre armata, via della Rugea	Ambiente	214.095,00
12	Risagomatura fossi acque di drenaggio via Traversa per le Calvane	Ambiente	182.206,00
13	Biblioteca Lazzerini-realizzazione nuovi bagni	Altri immobili	50.000,00
14	Lavori di riadattamento e ripristino locali ex centro sociale via Narnali	Altri immobili	21.925,82
15	Nuovo impianto pompa di calore biblioteca Lazzerini	Altri immobili	24.998,40
16	Museo Pecci. Progetto Cieli in città	Altri immobili	140.000
17	Scuola primaria di Casale- nuovo spazio polivalente	Istruzione	830.000
18	Stadio nuova recinzione lato ospiti	Sport	85.000
19	Copertura Piscina Via Roma	Sport	110.000
20	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 1° lotto	Viabilità	354.200,00
21	PH308C Riqualficazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola- area sosta biciclette	Viabilità	167.000,00
22	PH308B Riqualficazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola	Viabilità	440.000,00
23	PH334 Manutenzione straordinaria cimiteri	Viabilità	300.000,00
24	PH357 Riqualficazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 3	Viabilità	500.000,00
25	PH365 Riqualficazione viale Montegrappa lotto 4	Viabilità	240.000,00
26	PH364 Efficientamento pubblica illuminazione	Viabilità	200.000,00

OPERE CON LAVORI IN CORSO

Qui di seguito sono riportate le opere non ancora concluse al 30/06, suddivise per stato d'avanzamento

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
1	Lavori per accessibilità Casa Museo e Laboratorio d'arte Leonetto Tintori-Vainella	lavori in corso	Altri immobili	50.000,00
2	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Altri immobili	6.000.000,00
3	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Altri immobili	3.231.903,16
4	Rifacimento facciata scuola di musica	lavori in corso	Altri immobili	300.000,00
5	Museo Pecci. Interventi di completamento appalto principale: messa in sicurezza dei parapetti, dei controsoffitti e illuminazione esterna.	lavori in corso	Altri immobili	130.000,00
6	Palazzo Benassai: riqualificazione energetica e facciata	lavori in corso	Altri immobili	870.000,00
7	Nuovo impianto pompa di calore biblioteca Lazzerini	lavori in corso	Altri immobili	24.998,40
8	Adeguamento antincendio teatro Metastasio	lavori in corso	Altri immobili	148.962,00
9	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 1° lotto	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	1.550.000,00
10	Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	915.000,00
11	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	1.000.000,00
12	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 2° lotto- opere di completamento	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	350.000,00
13	Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	169.500,00
14	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	300.000,00
15	Ristrutturazione e risanamento strutturale Asilo Nido Arcobaleno	lavori in corso	Istruzione e servizi	

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
			educativi	650.000,00
16	Miglioramento sismico scuola Munari San Giusto	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	342.500,00
17	Scuola primaria Bruni Casale- sistemazione aree esterne	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	120.000,00
18	Rifacimento del manto e messa in sicurezza della copertura della scuola d'infanzia Fontanelle	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	138.000,00
19	Rifacimento del manto e messa in sicurezza della copertura della scuola d'infanzia Tobbiana	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	124.000,00
20	Medialibrary , Coworking, Smart Grid	lavori in corso	Riqualificazione	4.619.941,69
21	PIU opere aggiuntive- riqualificazione sede stradale via Giordano- via Pistoiese	lavori in corso	Riqualificazione	1.286.670,00
22	Riqualificazione giardini via Wangen	lavori in corso	Riqualificazione	738.357,84
23	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	lavori in corso	Riqualificazione	824.851,65
24	Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitano	lavori in corso	Riqualificazione	363.705,00
25	PH292A4bis - Rimodulazione carreggiate via Ferrucci lotto 2	lavori in corso	Riqualificazione	159.000,00
26	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la piscina di Via Roma	lavori in corso	Sport	1.420.000,00
27	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	lavori in corso	Sport	349.300,00
28	Nuovo Campo sportivo Paperino	lavori in corso	Sport	601.000,00
29	Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	lavori in corso	Sport	5.100.000,00
30	Riqualificazione via Roma vasche bimbi	lavori in corso	Sport	447.712,84
31	Messa a norma Stadio - tribuna d'onore	lavori in corso	Sport	170.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
32	PH342- Mobilità Casa scuola -Progetto Demos due-Primus	lavori in corso	Viabilità e trasporti	92.983,00
33	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni-lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	232.200,00
34	PH363 Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00
35	Sicurezza stradale- interventi di traffic calming viale Borgovalsugana	lavori in corso	Viabilità e trasporti	216.000,00
36	PH351 Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	lavori in corso	Viabilità e trasporti	210.000,00
37	PH362 Manutenzione piste ciclabili	lavori in corso	Viabilità e trasporti	100.000,00
38	PH308E Mobilità casa scuola- sistemazione esterna polo scolastico S.Paolo via Galcianese- lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	679.397,40
39	PH360 Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
40	PH366A Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	lavori in corso	Viabilità e trasporti	150.000,00
41	PH366B Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	150.000,00
42	PH380/1 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	565.000,00
43	PH406C Interventi di messa in sicurezza muro a sostegno della pedecollinare via Valibona	lavori in corso	Viabilità e trasporti	70.000,00
44	PH397 Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile via delle Fonti e via Fonda di Mezzana	lavori in corso	Viabilità e trasporti	429.627,00
45	Dissesto idrogeologico via Delle Cave- ripristino tratto di strada	lavori in corso	Viabilità e trasporti	204.973,00
46	PH301-A Collegamento viabilità Maliseti	lavori in corso	Viabilità e trasporti	143.744,34
47	Orti all'interno della cassa ciondariale	aggiudicazione	Ambiente	50.000,00
48	PH358 Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione	aggiudicazione	Cimiteri	

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
	barriere architettoniche e ampliamenti funzionali			500.000,00
49	Nuova mensa scuola Marcocci	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	350.000,00
50	sostituzione degli infissi della scuola d'infanzia Corridoni sita in Via Filippo Corridoni e della scuola primaria Antonio Bruni sita in Via di Brugnano n.20	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	210.000,00
51	Miglioramento sismico scuola Da Vinci	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	356.200,00
52	Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgo San Paolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	275.000,00
53	Manutenzione cupola geodetica Serraglio	aggiudicazione	Riqualificazione	18.099,00
54	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 1° lotto Via Rimini	aggiudicazione	Riqualificazione	150.000,00
55	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 2° lotto Area Pecci	aggiudicazione	Riqualificazione	150.000,00
56	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 3° lotto Area Nenni	aggiudicazione	Riqualificazione	550.000,00
57	PH394 - Riqualificazione Via Visiana	aggiudicazione	Riqualificazione	83.000,00
58	(PH395) Riqualificazione Via Luigi Spontini	aggiudicazione	Riqualificazione	130.000,00
59	Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	1.091.602,01
60	Reti di percorsi ciclopeditoni nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio B	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	1.350.294,00
61	PH333 Riqualificazione sottopasso ciclopeditone Questura	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	192.096,17
62	PH370 Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	274.844,37
63	PH367 Urbanistica tattica	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	200.000,00
64	PH380/2 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 2	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	565.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
65	PH380/3 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 3	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	565.000,00
66	PH380/4 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 4	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	445.956,65
67	PH397 Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	317.369,00
68	PH397 Ampliamento rete ciclabili- realizzazione percorso ciclopedonale su via Marini	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	193.392,00
69	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	345.000,00
70	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 3	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	650.000,00
71	Opere di sistemazione idraulica dei prismi arginali	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	260.000,00
72	Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	in gara	Altri immobili	100.000,00
73	Castello dell'Imperatore - Sostituzione piattaforme elevatrici	in gara	Altri immobili	74.700,00
74	Restauro fontana p.za Duomo	in gara	Altri immobili	90.000,00
75	Restauro fontana p.za S.Francesco	in gara	Altri immobili	30.000,00
76	Restauro fontana p.za Mercatale	in gara	Altri immobili	10.000,00
77	Copertura scuola Don Bosco	in gara	Istruzione e servizi educativi	100.000,00
78	(PH404) Sicurezza stradale: Limitazione incidentalità e segnaletica	in gara	Viabilità e trasporti	79.000,00
79	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 2	in gara	Viabilità e trasporti	750.000,00
80	Riqualificazione palazzina vigile S.Lucia	progetto definitivo	Altri immobili	150.000,00
81	S.Caterina: sostituzione infissi	progetto definitivo	Altri immobili	250.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
82	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Istruzione e servizi educativi	4.498.008,00
83	Scuola primaria d'Amico: riqualificazione energetica	progetto definitivo	Istruzione e servizi educativi	450.000,00
84	Realizzazione parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	7.120.000,00
85	Realizzazione deposito complementare al parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	700.000,00
86	Prato Urban Jungle: Farm Park via delle Pleiadi	progetto definitivo	Riqualificazione	249.791,84
87	Nuova pista ciclabile via Dossetti	progetto definitivo	Riqualificazione	738.119,60
88	Nuova pista ciclabile viale Montegrappa lotto 5	progetto definitivo	Riqualificazione	650.000,00
89	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 1, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	717.559,22
90	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 2, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	908.886,25
91	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 3, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	191.918,77
92	Completamento e attrezzature ciclabile connessione stazione- piazza Carceri	progetto definitivo	Riqualificazione	330.000,00
93	PH292D1 PUMS - Passerella Pecci	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	780.000,00
94	Completamento e miglioramento ciclabile connessione stazione Borgonuovo- Ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	600.000,00
95	Ristrutturazione e miglioramento rete piste ciclabili	progetto definitivo	Riqualificazione	523.516,16
96	Riqualificazione vasca 50m piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	1.402.287,00
97	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	300.000,00
98	Complesso scolastico sportivo via Galcianese- cabina elettrica	progetto definitivo	Sport	

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
				150.000,00
99	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni lotto 2 - realizzazione marciapiede	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	27.800,00
100	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	500.000,00
101	Messa in sicurezza via Firenze Lotto 3: tratto da Ponte Petrino a La Querce	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00
102	Mobilità casa scuola- S.Paolo lotto 2 stralcio 2, lotti 1 e 2 stralcio 3,4,5	progetto definitivo/esecutivo	Viabilità e trasporti	1.056.675,50
103	Officina giovani: manutenzione straordinaria copertura blocco ex celle frigo	progetto esecutivo	Altri immobili	250.000,00
104	Trasformazione dell'immobile adibito alla scuola secondaria di primo grado Don Bosco nella nuova sede del Centro per l'impiego di Prato	progetto esecutivo	Altri immobili	545.000,00
105	Scuola primaria Bruni di Casale- realizzazione parcheggio lotto A	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	219.329,61
106	Scuola Cironi	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	13.095.500,00
107	Scuola primaria Mascagni. Palestra: consolidamento antisismico parete	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	80.000,00
108	Riqualificazione energetica scuola Borgonuovo	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	94.000,00
109	Riqualificazione energetica scuola Manzi	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	15.500,00
110	Riqualificazione energetica scuola Rodari	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	50.000,00
111	Riqualificazione energetica scuola Fermi succursale	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	83.700,00
112	Riqualificazione energetica impianti termici Manzi- Rodari- Fermi	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	81.500,00
113	Schermature solari scuole Don Bosco e Ciliani	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	120.000,00
114	Ciclabile di collegamento fra via Coppola e ciclabile Giulio Bresci	progetto esecutivo	Riqualificazione	170.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
115	Collegamento ciclabile Paperino-S.Giorgio, via del Ferro	progetto esecutivo	Riqualificazione	700.000,00
116	Realizzazione nuovo tratto e miglioramento della connessione ciclabile via Ferraris- via Roma- Parco della Liberazione e pace	progetto esecutivo	Riqualificazione	470.000,00
117	(PH398) Miglioramento funzionale di alcuni sottopassi nel Comune di Prato	progetto esecutivo	Riqualificazione	110.000,00
118	Illuminazione pubblica: PH399 interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	190.000,00
119	PH401 Interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza dei Ponti carrabili e pedonali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	224.067,90
120	PH371 Riqualificazione area declassata tratto prospiciente museo Pecci	progetto preliminare	Viabilità e trasporti	1.357.000,00
121	Nuova Palazzina Vigile area Serraglio	Studio fattibilità	Altri immobili	2.000.000,00
122	Officina giovani: recupero ex stalle	Studio fattibilità	Altri immobili	250.000,00
123	PINQUA residenze via Siena	Studio fattibilità	Altri immobili	400.000,00
124	PINQUA terzo settore via Roma	Studio fattibilità	Altri immobili	2.810.000,00
125	PINQUA via del Purgatorio	Studio fattibilità	Altri immobili	750.000,00
126	PINQUA- via zarini	Studio fattibilità	Altri immobili	400.000,00
127	PINQUA nuovo archivio	Studio fattibilità	Altri immobili	5.020.000,00
128	Complesso ex Campolmi- Museo del Tessuto e Biblioteca Lazzarini- Riqualificazione della Piazza delle Mura: un nuovo spazio urbano tra storia natura e cultura	Studio fattibilità	Altri immobili	198.250,00
129	S.Caterina: edificio diroccato nella corte	Studio fattibilità	Altri immobili	1.500.000,00
130	Museo Pecci ex Radio Toscana: residenze per artisti	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
131	Museo Pecci manutenzione straordinaria corte teatro	Studio fattibilità	Altri immobili	400.000,00
132	Museo Pecci manutenzione straordinaria gradone	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00
133	Museo Pecci. riapertura CID e sistemazione archivi	Studio fattibilità	Altri immobili	250.000,00
134	Officina giovani: completamento recupero ex celle frigo- foyer di ingresso	Studio fattibilità	Altri immobili	120.000,00
135	Officina giovani: piazzale e reti fognarie e di servizio	Studio fattibilità	Altri immobili	1.000.000,00
136	Officina giovani: recupero del blocco Consiag	Studio fattibilità	Altri immobili	1.550.000,00
137	Officina giovani: recupero piccolo capannone artigianale fronte piazza Macelli	Studio fattibilità	Altri immobili	200.000,00
138	Officina giovani: recupero sotto ex celle frigo edificio Consiag	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00
139	Officina giovani: recupero facciate e infissi palazzina uffici	Studio fattibilità	Altri immobili	300.000,00
140	Cassa di espansione Vella	Studio fattibilità	Ambiente	1.164.940,00
141	Riqualificazione parco giochi Giocagìo via Marradi	Studio fattibilità	Ambiente	200.000,00
142	Parco giochi delle Civette via Curtatone	Studio fattibilità	Ambiente	32.000,00
143	Parco Santo Stefano (Ospedale)	Studio fattibilità	Ambiente	256.620
144	Digital Twin	Studio fattibilità	Ambiente	80.000,00
145	Realizzazione di un parco attrezzato in via Turchia (giocagìo 2)	Studio fattibilità	Ambiente	866.146,87
146	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air	Studio fattibilità	Ambiente	3.700.000,00
147	Ampliamento 3 sezioni scuola infanzia Maliseti - Via Cefalonia -	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	1.248.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2022	Area tematica	Importo progetto
148	Scuola secondaria di primo grado e palestra in via San Martino di Galceti del Comprensivo Nord	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	9.800.000,00
149	Ampliamento scuola dell'infanzia Munari	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	1.200.000,00
150	Consolidamento antisismico parete e ristrutturazione palestra scuola primaria Mascagni	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	1.200.000,00
151	Ristrutturazione Palestra Convenevole	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	955.400,00
152	Riqualificazione energetica scuola Fermi	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	2.000.000,00
153	Riqualificazione energetica scuola Cecchi Paperino	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	1.800.000,00
154	Riqualificazione scuola Abatoni per realizzazione centro bambini e famiglie	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	676.000,00
155	Pista atletica pavimentazione	Studio fattibilità	Sport	260.000,00
156	Campi di calcio e rugby: interventi di riqualificazione	Studio fattibilità	Sport	2.200.000,00
157	Campo di calcio Paperino lotto 2	Studio fattibilità	Sport	800.000,00
158	Adeguamento antincendio palestra via Roma	Studio fattibilità	Sport	400.000,00
159	Piscina Galilei: riqualificazione impianti	Studio fattibilità	Sport	400.000,00
160	Riqualificazione immobile via della Fonderia	Studio fattibilità	Urbanistica	6.000.000,00
161	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale (PH376)	Studio fattibilità	Viabilità e trasporti	200.000,00
162	Start Park- realizzazione nuove infrastrutture verdi e blu presso i giardini del Soccorso	Studio fattibilità	Viabilità e trasporti	198.250,00
163	Interventi di mobilità sostenibile,: realizzazione piste ciclabili in sede stradale, di connessione e di collegamento	Studio fattibilità	Viabilità e trasporti	3.500.000,00

OPERE DA AVVIARE

Si tratta sia di interventi che devono essere ancora finanziati, che interventi per i quali i progetti non sono ancora stati approvati.

	Opere da avviare al 30/06/2022	Area tematica	Importo progetto
1	Manutenzione straordinaria giardini	Ambiente	200.000
2	Museo Palazzo Pretorio. Interventi urgenti in facciata	Altri immobili	120.000
3	Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine (PNRR)	Altri immobili	300.000
4	PNRR-S.Caterina: tinteggiatura corte e teatro; restauro antiche mura nella corte	Altri immobili	140.000
5	PNRR-S.Caterina: locali ex archivio storico anagrafe	Altri immobili	240.000
6	Mura urbane, interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro	Altri immobili	300.000
7	Rigenerazione del polo teatrale del Fabbricone	Altri immobili	10.000.000
8	Adeguamento sismico scuola Villa Charitas	Istruzione	300.000
9	Messa in sicurezza solai scuole	Istruzione	150.000
10	Nuovo parcheggio scuola materna Pacciana	Istruzione	250.000
11	Impianto natatorio a lolo- piscina olimpionica	Sport	19.646.725,8
12	Messa a norma impianti sportivi	Sport	100.000
13	Manutenzione straordinaria piste ciclabili	Viabilità	
14	(PH 400) - Riqualficazione di Piazza Lippi	Viabilità	
15	Adeguamento funzionale di spazi di sosta e locali per la creazione di velostazione (spostamenti casa-lavoro)	Viabilità	100.000
16	Ciclovía del Sole Verona- Firenze	Viabilità	1.476.984
17	Illuminazione pubblica: interventi di riqualificazione, con sostituzione, messa in sicurezza e integrazione di pali	Viabilità	300.000
18	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 1	Viabilità	900.000
19	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 4	Viabilità	800.000
20	Interventi di recupero funzionale e ristrutturazione del sistema di smaltimento delle acque piovane stradali	Viabilità	150.000
21	Manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico	Viabilità	100.000
22	Messa in sicurezza viale Montegrappa 5 lotto: tratto viale della Repubblica- viale Marconi	Viabilità	100.000
23	Segnaletica stradale: interventi di manutenzione straordinaria	Viabilità	250.000
24	Sicurezza stradale: interventi di segnaletica luminosa, nuovi impianti, manutenzione straordinaria esistente	Viabilità	300.000
25	Sicurezza stradale: interventi di traffic calming	Viabilità	400.000

Parte 4 – Considerazioni sull’andamento del 1° semestre 2022

Considerato che la Nota di aggiornamento del Dup 2022/2024 e il bilancio di previsione 2022/2024 sono stati approvati nel mese di giugno, complessivamente l’avanzamento delle strategie è abbastanza in linea con le previsioni.

Tuttavia ci sono alcuni obiettivi strategici e operativi che hanno subito un rallentamento, in particolare quelli legati alla realizzazione di opere pubbliche sulle quali ha influito il rincaro dei prezzi dei materiali. Fra questi troviamo l’obiettivo operativo *“Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura”* che risente dei ritardi relativi alla riqualificazione di alcuni edifici culturali e l’obiettivo operativo *“Riqualificazione impianti sportivi”*, in cui le tempistiche dei lavori sugli impianti sportivi non sono in linea con le previsioni.

Parte 5 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura del Servizio Risorse, Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Tabella 4 – Realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione	Parcheggi: ottimizzazione della rotazione della sosta in centro storico.	Proseguimento dell'obiettivo per il mantenimento dell'attività di controllo della sosta, in relazione al numero degli stalli	Rapporto Nr.controlli/nr. stalli	Report finale dal quale si rilevi il mantenimento o dell'attività di controllo, con un valore dell'indicatore non inferiore a quello dell'annualità precedente	fatto	100%	Considerata la tipologia di attività, come riferimento verrà utilizzato il numero delle sanzioni erogate, derivato dei controlli effettuati. Nel corso del I semestre del 2021 sono state erogate n. 14. 394 sanzioni. Nel primo semestre del 2022 sono state elevate n. 17.504 sanzioni, nonostante le restrizioni agli spostamenti dovute alla recrudescenza dell'epidemia Covid-19, a dimostrazione di un deciso aumento nei controlli effettuati.
Città del futuro LA CITTA' CURATA	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade , giardini, piazze,....)	Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Verifica dello stato sanitario e sicurezza delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici e	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	E' stata completata la verifica delle alberature con diametro superiore a 30 cm

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			scolastici nei giardini pubblici, con diametro superiore a 30 cm, all'interno dell'intero territorio comunale					
			Approfondimento diagnostico strumentale, mirato a verificare la stabilità delle alberature d'alto fusto, emerso dalla precedente analisi visiva	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	E' stato effettuato un approfondimento diagnostico sulle alberature che presentavano difetti tali da richiedere un approfondimento.
		Verde pubblico: Miglioramento del decoro urbano	Mantenimento delle fioriere presenti nel centro storico di Prato	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	Le fioriere sono state tutte mantenute e sono stati piantati all'inizio dell'estate i fiori.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Verde pubblico: Miglioramento dell'informazione sull'utilizzo di aree a verde pubblico	Installazione di appositi pannelli segnaletici informativi sul corretto utilizzo delle aree a verde pubblico, nello specifico per le aree di sgambatura cani presenti nel territorio comunale	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	I pannelli sul corretto uso delle aree a sgambatura cani forniti dall'Amministrazione comunale sono stati correttamente installati in ciascuna sgambatura. I pannelli informativi di tutte le aree a verde sono in corso di elaborazione, essendo ancora in fase di decisione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale, la grafica da utilizzare.
		Formazione di personale di Consiag Servizi Comuni srl e di personale del Comune di Prato all'utilizzo e gestione di programma specifico per la verifica di ponti e passerelle, ed effettuazione delle verifiche per almeno il 50% di tali tipi di infrastrutture censite	Espletamento corso di formazione ed effettuazione da parte di Consiag Servizi Comuni srl, tramite apposito programma informatico, delle verifiche di ponti e passerelle censite	attestazione di avvenuto completamento del corso di formazione e predisposizione di schede relative ad ogni infrastruttura (ponte/passarella) verificata (almeno il	Report finale	In corso di realizzazione	50%	Il corso di formazione, relativo al censimento delle opere ad arte, è stato completato con successo da parte di tutti i dipendenti individuati. La seconda parte del corso è programmata per la prima metà di ottobre 2022. Il software è già stato installato ed attivato. Alla data attuale sono stati censiti n. 44 ponti.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
				50% di quelle censite)				
Città del futuro PRATO CITTA' GREEN	Sviluppare il verde urbano per investire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Realizzazione di aree verdi ad alta densità all'interno del tessuto urbano, con la finalità di contrastare isole di calore, inquinamento e creare spazi socialmente utili	Supporto alla elaborazione del progetto di realizzazione di nuove aree verdi attrezzate e nuovo progetto di forestazione urbana	definizione di elaborato progettuale	definizione di elaborato progettuale	in corso di realizzazione	50%	Le fioriere sono state tutte mantenute e sono state inserite, come di consueto, all'inizio dell'estate le piante fiorite per la manutenzione estiva.
Città del futuro MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare le infrastrutture stradali a servizio della città	Predisposizione di sistema di gestione della sosta a pagamento rispetto all'intero territorio comunale, con individuazione degli indici di rotazione della sosta	Rilievo dell'intero sistema degli stalli di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale, sua articolazione per vie con corrispondente	presentazione di report sulle attività svolte, individuazione di indice di rotazione per vie o zone	Report finale	in corso di realizzazione	80%	Si è proceduto ad effettuare il rilievo di dettaglio di tutti gli stalli di sosta all'interno della ZTC. Tali dati sono stati inseriti all'interno di un database, sia con dati testuali, sia con georeferenziazione, completo dei dati relativi al

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			numero di stalli di sosta e tipologia di tariffa, creazione di relativo database, definizione dell'indice di rotazione per vie o zone omogenee	omogenee				tasso medio di occupazione degli stalli.
		Predisposizione di piano della sosta in corrispondenza del comparto di Via Pistoiese oggetto di intervento di riqualificazione, quale piano stralcio e progetto pilota rispetto al più complessivo Piano Urbano della Sosta	Censimento degli stalli di sosta, definizione di piano stralcio della sosta per il comparto di via Pistoiese, completo di relativa politica tariffaria	presentazione progetto	Report finale	in corso di realizzazione	90%	All'interno del comparto di Via Pistoiese si è proceduto come prima attività di rilievo al censimento di tutti gli stalli, comprese anche le aree dove la sosta è libera. Dopodichè si proceduto a proporre gli interventi ritenuti necessari per riorganizzare il sistema della sosta nel comparto, anche a seguito dei lavori di riqualificazione attualmente in corso. La bozza di revisione sarà inviata nel corso della prima settimana di settembre agli uffici competenti.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci	Presentazione di progetto per la ridefinizione delle varie zone/aree per la sosta e relative categorie di permessi	Completamento della predisposizione e della stesura del progetto	presentazione progetto	Report finale	in corso di realizzazione	50%	Si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle attuali categorie di permessi , effettuando insieme agli uffici comunali una valutazione su una revisione di carattere generale. L'obiettivo da raggiungere è quello di semplificare il complesso sistema attualmente in vigore. Sono in corso di definizione, assieme con gli uffici comunali, le principali modifiche proposte al sistema.
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'	Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA	Realizzazione di sistema gestionale per la presa in carico delle segnalazioni relative alle problematiche dello stato manutentivo stradale e correlata fornitura di risposta finale al cittadino/segnalante	Predisposizione ed aggiornamento di sistema gestionale informatizzato, definizione modalità di trasmissione/ricevimento segnalazioni, comunicazione di avvenuta presa in carico segnalazione al cittadino/segnalante e, comunicazione al cittadino/segnalante	Nr. segnalazioni ricevute, Nr. risposte presa in carico, Nr. Risposte esito finale	Report finale	In corso di realizzazione	40%	Si è proceduto ad indentificare il software da utilizzare, sul quale sono in corso di implementazione i moduli necessari. Allo stato le richieste sono ancora gestite con il precedente gestionale.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			e dell'esito finale attività espletata a seguito della segnalazione					
Città Diritti e Opportunità UNA CASA PER TUTTI	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Aumentare il patrimonio di alloggi ERP incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e recupero dell'esistente. Migliorare la qualità degli alloggi assegnati con interventi di verifica e di manutenzione straordinaria. Intervenire con azioni di controllo e verifica delle	Partecipare a bandi, anche in collaborazione con i competenti uffici comunali, per reperire risorse finalizzate a nuove costruzioni o ristrutturazioni. Intervenire sugli alloggi di risulta e renderli disponibili per gli assegnatari, con particolare attenzione alle risorse del PNRR. Risistemazione degli alloggi in seguito a fenomeni di degrado e povertà (es. ripristino caldaie e impianti interni, anche su proposta servizio sociale	a) nr. alloggi risulta risistemati - b) nr interventi di ripristino straordinari effettuati c) studio di fattibilità predisposto in condivisione con Comune di Prato e eventuale attivazione di procedure per il passaggio alloggi emergenza ad ERP.	a) 10 b) 10 c) 1 report	a) fatto b) fatto c) non fatto	a) 100% b) 100% c) 0%	a) Nr. 12 alloggi di risulta risistemati con fondi dedicati dal comune di Prato e dal Comune di Vernio b) POR 2015 piano di reinvestimento economie pregresse: ripristino parti in cemento armato dei terrazzi di 28 unità immobiliari in via carso; c) previsto nella seconda parte dell'anno

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		situazioni reddituali e patrimoniali degli assegnatari per agevolare il turnover in funzione dello stato di bisogno. Verificare e attivare fonti di finanziamento del PNRR. Aprire una fase di confronto con l'AC per verificare la possibilità di gestire tutto o parte del patrimonio edilizio di emergenza alloggiativa come alloggi ERP, previa attivazione del LODE e della Regione Toscana.	professionale). Verifica e studio di fattibilità, con eventuale attivazione, del passaggio in gestione EPP come alloggi ERP di parte o del totale degli alloggi di emergenza alloggiativa per assicurare la gestione condominiale e la manutenzione.					
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci	Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP, CIMP, Canone unico patrimoniale	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2022 >= importo previsto nel bilancio di previsione	In corso di realizzazione	50%	L'attività ed il suo grado di realizzazione infrannuale risultano coerenti ed in linea per il raggiungimento degli obiettivi fissati

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	importo incassi 2022>= 2021	In corso di realizzazione	50%	L'attività ed il suo grado di realizzazione infrannuale risultano coerenti ed in linea per il raggiungimento degli obiettivi fissati
		Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività effettuate	Implementazione portale web di comunicazione con gli utenti attraverso lo sviluppo dei servizi di informazione e dialogo con l'utenza e dei nuovi canali di pagamento	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	numero utenti serviti >= 2021; apertura nuovi strumenti di comunicazione e con gli utenti	In corso di realizzazione	/	L'attività ed il suo grado di realizzazione infrannuale risultano coerenti ed in linea per il raggiungimento degli obiettivi fissati
Città del futuro LA CITTA' CURATA	Tutelare il territorio e gli animali	Interventi di riqualificazione del Parco del CSN e del Parco di Galceti Villa-Fiorelli. Collegamento tra Parco CSN e Villa Fiorelli con apertura della nuova biglietteria, dello shop e di altri servizi di accoglienza ai visitatori. Progettazione definitiva della nuova sede del Museo di Scienze Planetarie presso	Chiusura della fase autorizzatoria per i lavori all'interno del Parco del CSN e avvio dei lavori di separazione dell'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici. Stesura dei progetti di riqualificazione del Parco di Galceti. Avvio dell'iter autorizzatorio per la realizzazione del collegamento tra Villa Fiorelli e il	Implementazione delle infrastrutture per l'accoglienza a degli animali. Avvio dei lavori di separazione delle aree a diversa destinazione presenti nel parco. Avvio delle fasi di progettazione e definitiva.	Incremento della ricettività per la cura dei selvatici. Separazione delle aree a diversa destinazione. Report relativo allo stato dell'arte per la progettazione e definitiva degli interventi.	1. In corso; 2. Fatto; 3. Non fatto; 4. Non fatto	1- 25%; 2- 90%; 3 - 0%; 4. 0%;	1 - La fase autorizzatoria è stata avviata dopo una prima richiesta (da parte degli uffici competenti) di revisione della documentazione presentata; 2 - Sono state concluse le fasi di progettazione di fattibilità; 3 - Si è verificato che tale attività è di competenza di specifico ufficio tecnico comunale; 4 - Non è stata bandita la progettazione poiché ad oggi manca la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Villa Fiorelli nell'ambito della nascita del Parco delle Scienze e della Cultura.	Parco CSN. Attribuzione incarico per la progettazione definitiva della nuova sede del Museo di Scienze Planetarie presso Villa Fiorelli nell'ambito della nascita del Parco delle Scienze e della Cultura					
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	100%	Le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentaione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	100%	Le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione						
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché l'Urban Center diventi centro di elaborazione e di diffusione delle pratiche di forestazione, di economia circolare di riqualificazione urbana, costituendo strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative	Programmazione e gestione attività Urban Center	calendario degli eventi	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Giovedì 31 marzo : serie di incontri legati a nuove uscite editoriali sul tema città : Antonio Pascale presenta con Valerio Barberis La foglia di fico – Storie di alberi, donne, uomini (Einaudi 2021). Progettazione con la curatela della Prof.ssa Elisa C. Cattaneo di un grande convegno sul Landscape Urbanism a 25 anni da quello di Chicago.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	28 aprile 2022: Presentazione del documentario Intrecci Etici di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri (Luma, 2021) Con la partecipazione del Comune di Prato e Confindustria Toscana Nord/Sistema Moda
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Presentazione, in qualità di capofila della Rete del Contemporaneo in Toscana, di un progetto per la realizzazione di una campagna promozionale condivisa a livello regionale e oltre finalizzata al rilancio delle attività istituzionali d'arte contemporanea in Toscana.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché l'innovazione e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: collaborare al progetto di crescita della reputazione del distretto attraverso il progetto TIPO. Turismo industriale Prato.	Progettazione e gestione attività TIPO	Programma delle attività	report attività svolta	fatto	100%	Il proseguimento sui primi quattro mesi del 2022 di quanto avviato nel 2021 è stato portato a compimento. Il format ha ricalcato quanto progettato per il 2021. Al momento si è al lavoro per il lancio della seconda edizione che interesserà gli ultimi tre mesi dell'anno e i primi mesi del 2023.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Prosegue la partecipazione del Museo alle attività del sistema museale Pratomusei. Sono state portate a termine le attività previste dal progetto Cantiere digitale, rivolto alle scuole e dal progetto Collezionando esperienze rivolto alle famiglie. Tali attività sono inserite nel bando 2021 Regione Toscana-sistemi museali. Nel corso del semestre è proseguita l'attività di progettazione delle attività educative da inserire nel bando 2022 Regione Toscana-sistemi museali che vedono l'allargamento della rete con l'ingresso del Castello e del Cassero per quanto riguarda l'offerta didattica da rivolgere alle scuole e famiglie Sul fronte del fundraising si segnala la ripresa della campagna di adesione al Supporter Club, interrotta dalla pandemia, ed è proseguita anche la ricerca di bandi di ambito nazionale.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	La programmazione espositiva, nel periodo in esame, ha visto la chiusura al 24 gennaio della mostra "Turandot e l'Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba"; l'apertura tra febbraio e luglio della mostra "Novecento elegante. Abiti e accessori dalla donazione Fineschi"; la preparazione della mostra "Due secoli di Textile e Fashion Design" (inaugurazione 14 luglio). Si segnala il progetto di inclusione Tessuti Sociali, terminato a giugno 2022 dopo due anni di sperimentazione che ha permesso lo svolgimento di azioni pilota per avvicinare le principali comunità straniere alla vita del museo e permesso la creazione di brevi percorsi di visita in lingua cinese, urdu, arabo e albanese tramite apposita app (per maggiori info si veda la pagina dedicata sul sito del museo. E' proseguita l'attività di comunicazione sui social delle varie iniziative e sono allo studio nuove conferenze e seminari per il pubblico adulto sui temi della sostenibilità ambientale e della storia del tessuto. da

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	70%	"MetJazz", rassegna che vede la collaborazione della Scuola di Musica Verdi e Biblioteca Lazzerini, febbraio/marzo "Il concerto degli alberi", in co-produzione con la compagnia TPO, Giardino del Teatro Fabbrichino, giugno "Io non muoio più. Letture", ciclo di incontri organizzato grazie alla sinergia tra Teatro Metastasio, Arci Prato, Centro anti violenza La Nara, Biblioteca Lazzerini, Centro Salute Donna e CGIL Prato per raccontare il progetto, presso circoli ARCI e Biblioteca Lazzerini, maggio e giugno "School of Met" è un percorso di incontri ispirato all'attività del regista Milo Rau fautore di una radicale relazione fra arte e attivismo politico, rivolto a studenti e studentesse di diverse scuole secondarie di secondo grado di Prato, da gennaio a febbraio. Da marzo a giugno il teatro ha ospitato assemblee cittadine curate dai ragazzi sui temi che vorranno discutere con la comunità di Prato, in collaborazione con la Consulta degli studenti.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	in corso di realizzazione	70%	<p>Progetto “Casa Teatro” in collaborazione con UNICOOP FIRENZE e MURMURIS, prevede laboratori per creare un gruppo di spettatori consapevoli e promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento attivo del pubblico nella vita del teatri toscani, da gennaio a aprile “Laboratorio delle arti e della scena”, formazione propedeutica teatrale per le nuove generazioni, da gennaio a maggio al Teatro Magnolfi</p> <p>“Laboratorio teatrale” in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale della ASL e Teatro di Piazza o d'Occasione, da gennaio a giugno al Teatro Magnolfi</p> <p>Partecipazione al progetto “Stoom - l'arte torna libera”, realizzato da The Loom Movement Factory e STA, Spazio Teatrale Allincontro, con la rassegna “Parla con loro” che vede la partecipazione di alcuni degli artisti presenti con i propri spettacoli nel cartellone del Teatro Metastasio, da febbraio a maggio in vari luoghi cittadini</p>

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	60%	A. Realizzazione del convegno annuale (LII Settimana di Studi) sia in presenza, presso il PIN di Prato, che online B. Realizzazione del seminario avanzato Datini/Ester presso la Casa Pia dei Ceppi C. Gestione biblioteca specializzata e archivi D. Realizzazione, in collaborazione con vari sponsor, di un documentario su Francesco Datini E. Organizzazione della LIII Settimana di Studi (2023), della LIV Settimana (call 2024) e del Seimnario Datini/Ester 2023
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	50%	A. Realizzazione e progettazione laboratori per scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con la Casa Pia dei Ceppi B. Progettazione, con Museo del Tessuto di Prato, del volume "Un panno medievale dell'azienda pratese di Francesco Datini"

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Operare affinché le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale	Progettare e gestire le attività di Prato Circular city	Programma delle attività	report attività svolta	In corso di realizzazione	70%	<ul style="list-style-type: none"> . Completato il percorso all'interno del Progetto URGE - Fase II con elaborazione Roadmap e Integrated Action Plan. Attività conclusa ad Aprile 2022. . Avviata l'attività per l'elaborazione della Guida per una Strategia Circolare per le città (modello INNOMED-UP), che si concluderà entro il secondo semestre 2022. . Partecipazione e supporto all'organizzazione dei tavoli di lavoro di PCC, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Prato, nell'ambito del Tavolo "Distretto Tessile"; - Sviluppo dei progetti Prato Smart City e Casa delle Tecnologie Emergenti – PRISMA, nell'ambito del Tavolo "Transizione Digitale" . Supporto alla predisposizione del documento Next Generation Prato e adesione al

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2022-2024 - (Dcc n.33/2022) al 31/07/2022					GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2022/2024	AZIONI 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realiz zazio ne	breve descrizione attività svolte
								protocollo di Governance. . Supporto a GIDA per le attività relative al Tavolo "Acque Reflue Urbane"
