



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 2° semestre Anno 2022
dati al 31/12/2022

INDICE

<p>PREMESSA Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo Struttura del Report Il contesto di riferimento</p>	<p>Pag. 3</p>
<p>PARTE 1 1.1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi 1.2 I principali risultati raggiunti dall’inizio del mandato 1.3 I principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030</p>	<p>Pag. 8 Pag. 9 Pag.60 Pag. 77</p>
<p>PARTE 2 Il grado di realizzazione finanziaria</p>	<p>Pag. 97</p>
<p>PARTE 3 Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche</p>	<p>Pag. 105</p>
<p>PARTE 4 La qualità dei servizi</p>	<p>Pag. 121</p>
<p>PARTE 5 Considerazioni secondo semestre 2022</p>	<p>Pag. 138</p>
<p>PARTE 6 Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate</p>	<p>Pag. 139</p>

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.


In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto:

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo

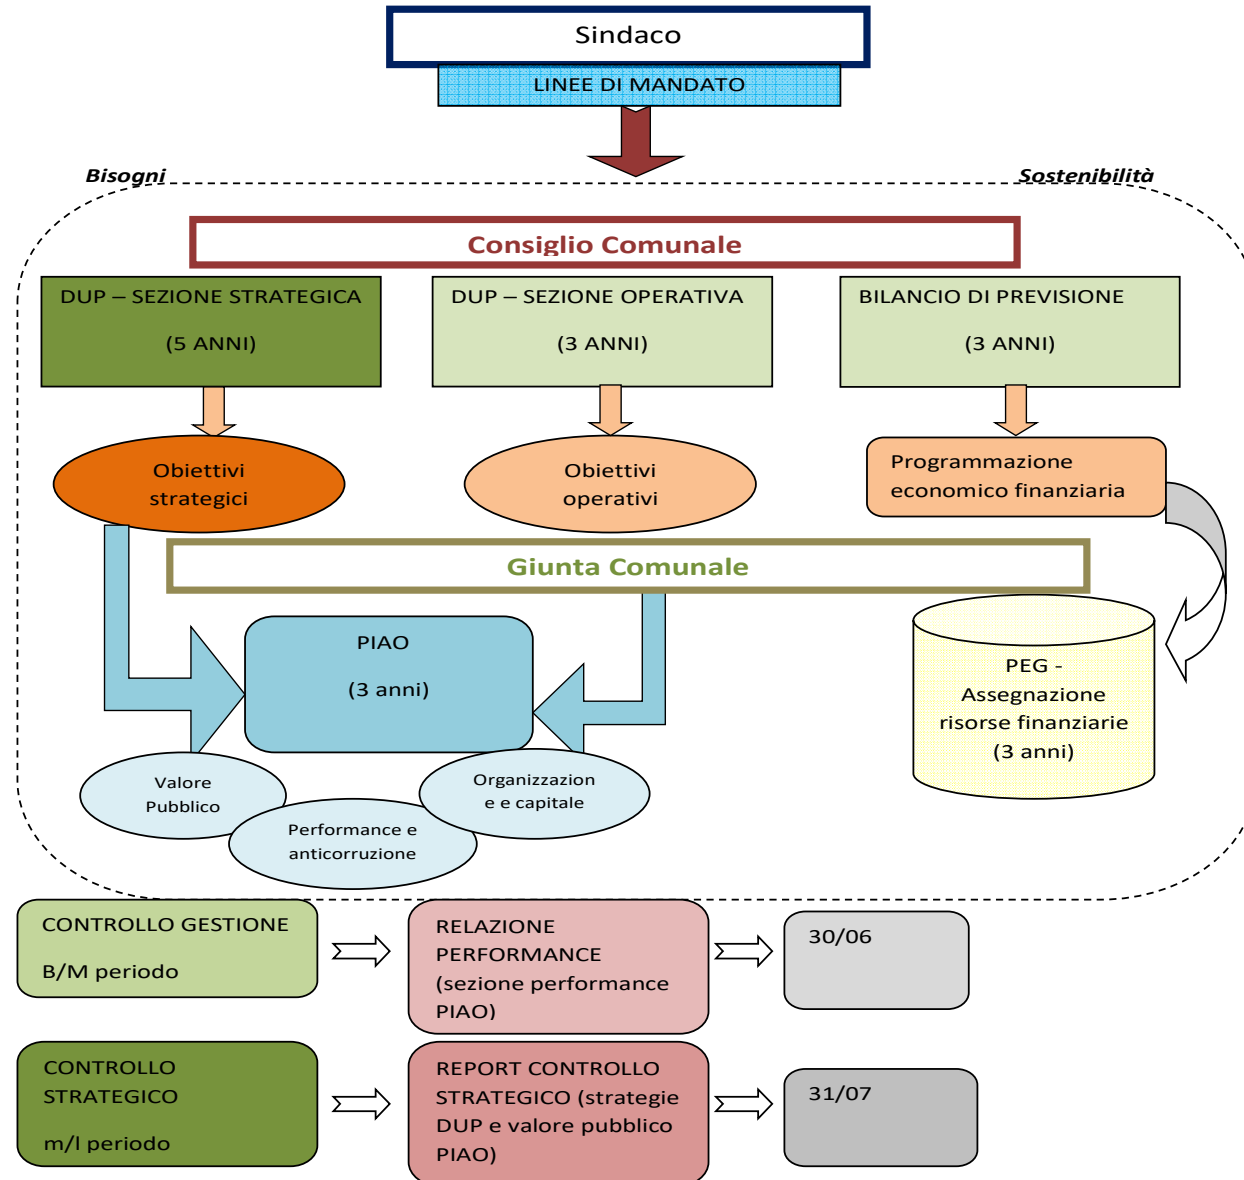



Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2022-2024	Delibera di Consiglio n. 50 del 09/09/2021
DUP 2022/2024 – Nota di Aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 33 del 23/06/2022
DUP 2022/2024 – Nota di Aggiornamento variazione sezione operativa	Delibera di Consiglio n. 66 del 17/11/2022
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale - variazione	Variato contestualmente alla variazione della Nota di Aggiornamento al DUP sezione operativa
Bilancio di Previsione 2022/2024	Delibera di Consiglio n. 34 del 23/06/2022
Piano della Performance 2022/2024	Delibera di Giunta n. 79 del 29/03/2022
Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022-2024 - approvazione assegnazione risorse, performance organizzativa e nuovi obiettivi	Delibera di Giunta n. 229 del 06/07/2022
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024	Delibera di Giunta n. 393 del 08/11/2022
PEG- Piano della Performance 2022/2024 - Stato avanzamento obiettivi al 30/06/2022	Delibera di Giunta n. 259 del 02/08/2022

Relazione Performance 2022/2024

Delibera di Giunta del 04/07/2023

STRUTTURA REPORT

Il presente REPORT è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione nel Dup 2022/2024 e si compone di 4 parti:

La prima sezione riporta il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi con riferimento agli indicatori di impatto approvati nel Dup 2022/2024.

La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite) aggregati per obiettivi strategici.

La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell'opera al patrimonio dell'ente e permette, se correttamente alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori.

La quarta sezione riporta delle considerazioni sull'andamento delle strategie nel 2° semestre 2022.

La quinta sezione riguarda il grado di realizzazione al 31/12/2022 degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipate.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La cessazione dello stato di emergenza sanitaria al 31/03/2022 ha permesso la graduale ripresa di tutti i servizi e attività.

Purtroppo lo scenario nazionale e internazionale è stato segnato dall'inizio della guerra in Ucraina. Il Governo e di conseguenza anche tutti gli Enti locali, sono stati impegnati nella gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini. La guerra ha innescato anche un'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che ha avuto un impatto notevole sui costi dei servizi e delle forniture, ma anche sui costi e sulla disponibilità delle materie prime necessarie per portare avanti le opere pubbliche.

L'inizio del 2022 è stato però anche caratterizzato dal finanziamento di 23 progetti presentati dal Comune di Prato al bando Rigenerazione urbana del ministero dell'Interno per l'assegnazione dei fondi Pnrr, per un totale di 19 milioni di euro a cui si è aggiunto nel corso dell'anno il finanziamento di ulteriori bandi. Il PNRR è, da un lato un'opportunità irripetibile, dall'altra, è un impegno notevole per l'amministrazione comunale, sia in termine di organizzazione che di carico di lavoro, poiché i progetti dovranno entro il 2026. Seguiranno quindi quattro anni a ritmo serrato per la realizzazione delle opere nel rispetto dei tempi previsti.


Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

1.1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto **un quarto ambito strategico** (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** declinati, a loro volta, in **53 obiettivi operativi**. Gli obiettivi operativi sono declinati a loro volta in obiettivi di Peg, così come risulta nella figura seguente.

Ciò significa che gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli

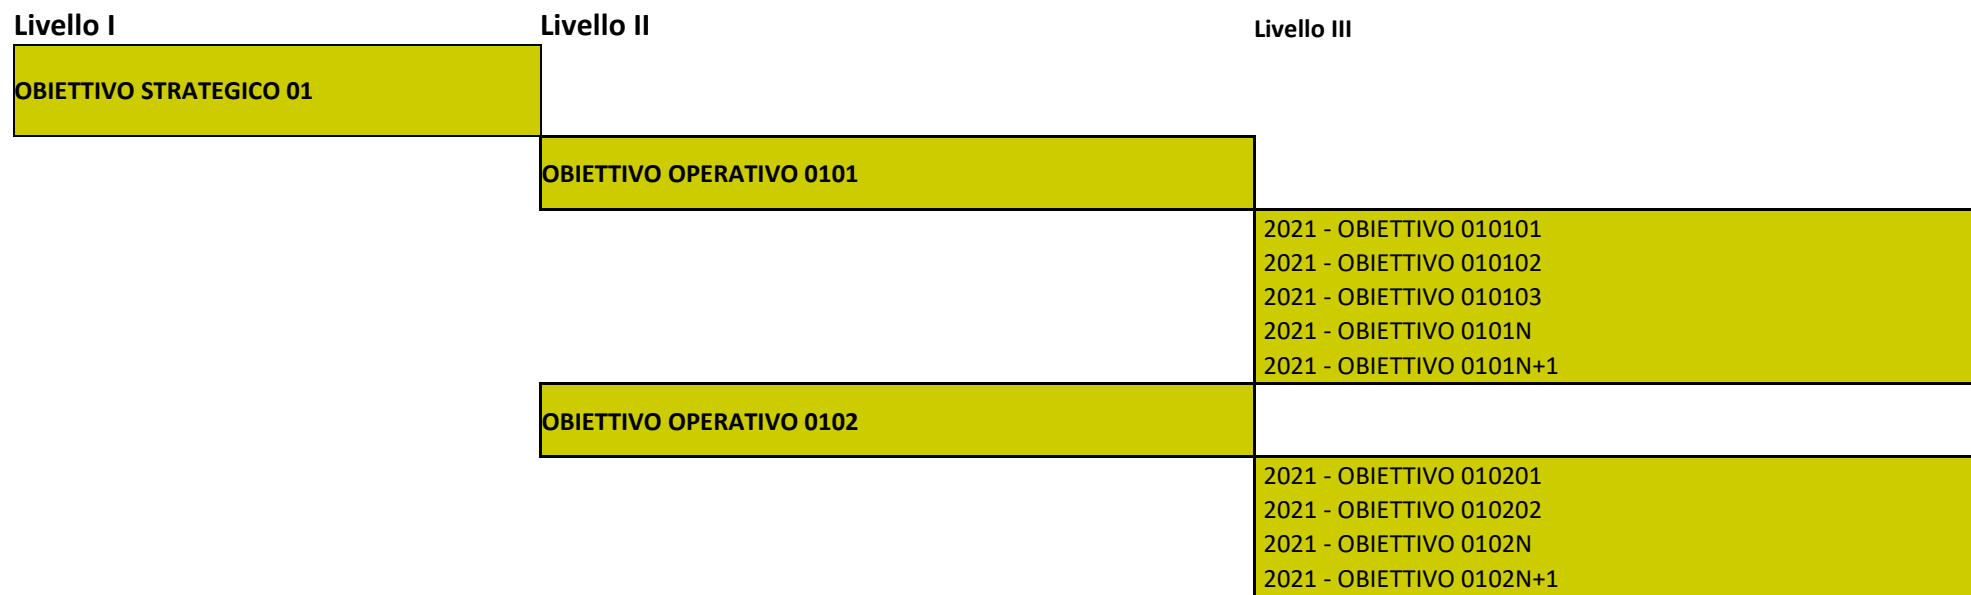

Nel Dup 2022/2024, per la prima volta sono stati associati agli obiettivi operativi degli indicatori di impatto con dei target attesi alla fine del triennio. Il presente report di controllo strategico vuole evidenziare come attraverso il raggiungimento degli obiettivi annuali ci stiamo avvicinando al target atteso. Qui di seguito viene riportato il grado di realizzazione di ogni obiettivo operativo, nell'ambito strategico di riferimento, con l'indicazione degli

indicatori previsti e la percentuale di realizzazione degli stessi. Prima di ogni ambito strategico viene riportato un grafico che riepiloga il livello di avanzamento degli obiettivi operativi.



Grafico 1

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico

1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro

Obiettivi di sviluppo sostenibile globale



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio	La promozione del distretto tessile è stata portata avanti attraverso numerosi progetti. Il progetto Smarty Smes per la diffusione nelle piccole e medie imprese di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi ha realizzato le attività pianificate, con particolare riferimento alla elaborazione dei Piani di Azione, i documenti attraverso i quali i partner di progetto definiscono le modalità per agevolare il trasferimento delle conoscenze apprese negli strumenti di programmazione e di finanziamento dei livelli di governo regionali e nazionali finalizzati a sostenere la transizione digitale dei territori coinvolti. Il Comune di Prato in particolare ha incentrato il proprio Piano di Azione sulla individuazione delle modalità per la migliore redazione dei prossimi bandi PRISMA finalizzati all'attivazione di progetti di ricerca e sviluppo da realizzare congiuntamente tra imprese, università e centri di ricerca, progetti che sfrutteranno le tecnologie emergenti per sviluppare prototipi che permettano alle imprese del settore Tessile & Moda e del Made in Italy di affrontare con maggiore consapevolezza la transizione digitale. Ad Aprile 2022 è stata inaugurata la sede di	n. start up o pmi innovative nel Comune di Prato: n. imprese Progetto Prisma: Progetto E.y.e.- n. idee progettuali sviluppate:	27 10 12	40 15 15	71%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>PRISMA in via Galcianese, nella quale si sono insediate 3 start-up e sono stati organizzati numerosi eventi con imprese, associazioni di categoria, start-up, partner tecnico-scientifici, etc. Sono continuati inoltre gli avvisi pubblici a carattere ricorrente per la selezione dei progetti di ricerca e sviluppo sostenuti dai Laboratori PRISMA ospitati dal PIN e delle start-up da inserire nello specifico programma di accelerazione sviluppato da StartUp Italia per conto del progetto PRISMA.</p> <p>Nel corso dell'anno è iniziato il progetto Creative, che ha lo scopo di promuovere i rapporti economici fra le piccole e medie imprese del Mediterraneo in settori come il tessile, il calzaturiero, la pelle, etc. Parallelamente, per le imprese dello stesso ambito, è iniziata una sperimentazione pilota di modelli di business alternativi.</p> <p>Sempre in ambito di imprenditorialità, è continuata con il progetto EYE, la promozione della cultura imprenditoriale in 5 istituti superiori della Provincia di Prato, allo scopo di sviluppare nuove opportunità per i giovani che si affacceranno nel modo del lavoro e promuovere nel medio lungo termine la nascita e lo sviluppo di start up.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire	<p>Le azioni hanno riguardato principalmente il sostegno del commercio e la gestione dei mercati. E' stata data la concessione della gestione, con cadenza biennale della "Fiera degli Ambulanti". Inoltre è stato pubblicato il calendario delle mostre mercato in centro storico e il calendario delle edizioni straordinarie del mercato centrale. Per valorizzare le imprese della filiera corta agro-</p>	<p>tasso di imprenditorialità</p> <p>tasso di occupazione</p>	<p>11,78%</p> <p>68,3%</p>	<p>11,7%</p> <p>69%</p>	<p>71%</p>


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività	<p>alimentare è stato stipulato un protocollo d'intesa con le associazioni volto allo svolgimento di azioni congiunte.</p> <p>Per quanto riguarda gli aiuti al distretto tessile per il rilancio della filiera produttiva dopo l'emergenza epidemiologica, è stato firmato il protocollo d'intesa con le parti sociali per la pubblicazione del bando e la selezione delle imprese beneficiarie.</p>	<p>tasso di occupazione giovanile</p> <p>sostegni alle imprese - importo erogato alle imprese</p>	<p>43,3%</p> <p>0</p>	<p>52%</p> <p>€ 10.000.000</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori	<p>Partecipazione insieme alla Asl al Piano straordinario regionale per il lavoro sicuro, che oltre a rilevare situazioni di illegalità lavorativa, permette di individuare fenomeni di evasione dei tributi locali, soprattutto da parte delle imprese straniere.</p> <p>Applicazione del protocollo Si.smi.co sottoscritto fra Comune di Prato, Alia e So.Ri, per il contrasto all'evasione tributaria, rendendo stabili i controlli sul territorio, accompagnati da specifici strumenti comunicativi orientati all'integrazione interculturale.</p> <p>Si sono intensificati i controlli del nucleo antievasione per il recupero dei tributi locali, ponendo particolare attenzione all'imposta di soggiorno. Sono state accertate numerose irregolarità e di conseguenza è aumentato l'importo dei tributi recuperati.</p> <p>Sono stati effettuati i controlli da parte della Polizia Municipale sui prodotti messi in vendita, allo scopo di verificarne la sicurezza e il rispetto delle normative. I controlli hanno riguardato prevalentemente cosmetici e abbigliamento.</p>	<p>imprese irregolari</p> <p>recupero tributi comunali imprese</p>	<p>57,40%</p> <p>820.676</p>	<p>45%</p> <p>300.000</p>	89%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>1.4 Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</p>	<p>Nell'ambito del progetto Innomed-up è stata realizzata una raccolta di materiali e oggetti da destinare al riuso ed una guida per applicare i principi dell'economia circolare alle PMI delle industrie culturali e creative del Mediterraneo.</p> <p>E' inoltre in corso un progetto per la concessione di sovvenzioni (per un importo massimo di 5mila euro) ad 8 soggetti del territorio (PMI, Associazioni e professionisti) intenzionati a ricollocare la propria attività in un contesto di Economia Circolare tramite lo sviluppo di prodotti innovativi, l'acquisto di nuova strumentazione, il ricorso a consulenze specialistiche.</p> <p>Inoltre, relativamente al progetto URGE è stato predisposto e presentato l' "Integrated Action Plan", il documento che ha analizzato e definito le modalità più efficaci di trasferimento della conoscenza appresa durante i meeting transnazionali svoltisi negli anni precedenti e con il quale si elabora una proposta per definire politiche pubbliche mirate e ulteriori possibili azioni per implementare nel territorio cittadino pratiche destinate a incrementare il tasso di circolarità nei grandi interventi infrastrutturali.</p> <p>E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativo alla realizzazione dell'Hub del Riciclo Tessile, consolidando il ruolo di Prato come polo tecnologico e operativo del riciclo tessile a livello europeo. Il protocollo coinvolge il Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, CNA Toscana centro, Camera del Lavoro CGIL PRATO, CISL Firenze-Prato, UIL TOSCANA - Prato Coordinamento Territoriale, Alia Servizi Ambientali S.p.A., Next Technology Tecnotessile. Il progetto, presentato da Alia, è stato finanziato dal PNRR.</p>	<p>imprese coinvolte nei processi di economia circolare</p>	<p>9</p>	<p>11</p>	<p>82%</p>


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	<p>L'alta formazione viene promossa attraverso la valorizzazione della presenza universitaria a Prato, che riguarda sia la collaborazione con il Pin, che i rapporti con le università straniere presenti sul territorio. Per quanto riguarda il Pin, è stata prevista l'attivazione di un percorso di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana ed è stata data continuità all'iniziativa Premi di laurea Città di Prato. Relativamente ai rapporti con le università straniere, è stata coorganizzata insieme al Pin, l'iniziativa "Prato Campus CleanUp"</p> <p>Per quanto riguarda il lavoro, nell'ambito del Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze siglato nel 2021 con Regione Toscana, associazioni di categoria e CCIAA, è stato attivato l'osservatorio permanente sulla domanda e l'offerta di lavoro e di formazione, attraverso un accordo con il PIN.</p>	<p>tasso neet</p> <p>Osservatorio mercato del lavoro</p>	<p>11,5</p> <p>1</p>	<p>12,5</p> <p>1</p>	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>2.1 Valorizzare il cuore antico della città promuovendone la riqualificazione</p>	<p>Nel biennio 2020-2021, è stato avviato un processo di partecipazione e di co-progettazione sul centro storico, con la finalità di individuare azioni per la rigenerazione del tessuto urbano e la creazione di reti sociali tra le realtà operanti nell'area. Nel 2022 sono proseguite le attività di partecipazione, di coprogettazione e il coordinamento con gli attori locali. Per la valorizzazione e l'animazione del centro storico, sono stati organizzati numerosi eventi culturali e commerciali</p> <p>Relativamente all'occupazione di spazi esterni con dehor, è stata approvata una modifica la regolamento per la definizione delle modalità di occupazione e per l'approvazione dell'Abaco degli elementi di arredo ammessi.</p> <p>Nell'ambito del progetto di riqualificazione di Via Pistoiese, è stata avviata la predisposizione del piano della sosta dell'area via Pistoiese- via Giordano.</p> <p>Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici del centro storico, sono ancora in corso i lavori di riqualificazione del Bastione delle Forche e di Palazzo Pacchiani, mentre si è concluso il restauro della facciata della Scuola di musica Verdi.</p>	<p>Attività produttive in centro storico</p> <p>Esercizi di somministrazione in centro storico</p> <p>Residenze in centro storico</p> <p>Eventi in centro storico</p> <p>Interventi di riqualificazione centro storico</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>8.055</p> <p>69</p> <p>1</p>	<p>15 (valore annuale)</p> <p>13 (valore annuale)</p> <p>40.824 (è stato considerato il n. dei residenti nella circoscrizione centro anzichè nel centro storico)</p> <p>60 (valore annuale)</p> <p>3</p>	<p>52,05%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali	<p>Il potenziamento delle funzioni pubbliche nei centri minori ha riguardato la valorizzazione dei centri civici, attraverso la riorganizzazione degli spazi e la realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento. Le attività dei centri civici sono riprese in collaborazione con le associazioni ed è iniziato un percorso partecipativo con i rappresentanti delle associazioni per rilanciare le attività.</p> <p>Sono stati conclusi i lavori di realizzazione della nuova biblioteca di Casale</p>	<p>Attività produttive nei paesi</p> <p>Servizi/funzioni attivati o integrati</p>	<p>38</p> <p>4</p>	<p>38 (valore annuale)</p> <p>7</p>	79%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la	<p>L'organizzazione degli eventi culturali ha visto l'azione sinergica delle varie associazioni culturali presenti sul territorio, dalla rete Pratomusei, ai teatri cittadini, alla Camerata strumentale, etc.</p> <p>Fra gli eventi di richiamo troviamo la rassegna Prato Estate e le iniziative invernali, che sono state organizzate in</p>	<p>Soddisfazione utenza scuola di musica</p> <p>Soddisfazione utenza Palazzo</p>	<p>8,17</p> <p>5,38</p>	<p>8</p> <p>5,5</p>	67%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	<p>diverse location del centro storico. Nell'ambito delle iniziative estive si è rinnovata la collaborazione con la Fondazione Museo Pecci per l'organizzazione del "Centro Pecci summer live".</p> <p>Attraverso il lavoro della rete Prato Musei, sono state realizzate numerose iniziative e laboratori didattici per le scuole, dando attuazione al progetto "Cantiere Digitale".</p> <p>Sono stati regolati i rapporti con Manifatture digitali del cinema attraverso la concessione degli spazi.</p> <p>Per quanto riguarda la Scuola di Musica Verdi, è continuata la collaborazione con la Camerata Strumentale, che ha permesso di svolgere regolarmente le lezioni, così come le attività concertistiche. La scuola di Musica ha partecipato al Festival europeo delle scuole di musica che ha avuto luogo nel mese di maggio in Lussemburgo e si è rinnovato il progetto di scambio culturale con Taverny.</p>	<p>Pretorio</p> <p>Iniziative scolastiche Prato Musei: incremento % classi partecipanti</p>	n.d.	5%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	<p>Sono state realizzate numerose iniziative per l'ampliamento dell'offerta culturale di Palazzo Pretorio in collaborazione con la scuola di musica e la Camerata strumentale, allo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e storico cittadino. Nel corso dell'anno sono state organizzate 3 mostre: Hi Woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, gli amici pittori di Cesare Guasti.</p> <p>Il Museo si è dimostrato fortemente inclusivo, realizzando visite specifiche per pubblici speciali, con una particolare sensibilità nei confronti degli utenti autistici. In</p>	<p>Partecipazione spettacoli</p> <p>Spesa media pro capite in spettacoli</p> <p>Eventi culturali per 1000 abitanti</p>	<p>232.476 (dato 2021)</p> <p>€ 8,36 (dato 2021)</p> <p>38,66 (dato 2021)</p>	<p>88.690</p> <p>€ 26,20</p> <p>2,08</p>	76%



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>collaborazione con il Museo del tessuto, sono state organizzate le visite guidate al Polo culturale Campolmi dal titolo "Tesori in Campolmi", così da poter far riscoprire ai cittadini il più grande complesso industriale di origine ottocentesca dentro le mura del centro storico di Prato e che ha il riconoscimento come sito di prestigio di archeologia industriale in Europa.</p> <p>Per promuovere gli eventi culturali della città è in corso di realizzazione il nuovo portale eventi.</p> <p>Per quanto riguarda l'offerta culturale rivolta ai giovani, presso Officina giovani sono stati organizzati gli spettacoli della rassegna estiva "Officina OG", sono continuate le attività di Officina Teen, è stata realizzata la rassegna teatrale nelle scuole "Officina on stage", così come sono continuate le attività formative nelle scuole alle quali hanno partecipato circa 300 ragazzi.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura	Sono state realizzate iniziative, laboratori, visite guidate e mostre per la valorizzazione del Cassero e del Castello dell'imperatore. E' stata valorizzata la Galleria comunale attraverso il percorso espositivo della mostra "Gli amici pittori di Guasti", che oltre al Palazzo Pretorio prevede un percorso espositivo nel Palazzo Comunale. Sono stati realizzati lavori di restauro e manutenzione sulle opere	Strutture culturali riqualificate	3	6	50%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>presenti nei depositi del Palazzo Pretorio e sono state rese fruibili con un progetto di allestimento. Al fine di valorizzare le armi e i materiali facenti parte dell'antico Museo del Risorgimento che aveva sede nel palazzo Pretorio, è stato stipulato un accordo con il Coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali. Tale accordo consente di rivedere l'inventario delle armi e dei materiali, di ricostruirne la storia e la provenienza.</p> <p>Sono stati portati avanti interventi di valorizzazione e fruibilità dei fondi dell'Archivio Fotografico Toscano, attraverso la pubblicazione del nuovo sito e la catalogazione e conservazione di due nuovi fondi.</p> <p>Per quanto riguarda gli immobili culturali, si sono conclusi i lavori di rifacimento della facciata della scuola di musica, e sono stati conclusi i lavori di accessibilità del laboratorio d'arte Leonetto Tintori. In seguito ai finanziamenti PNRR relativi alla rigenerazione urbana, sono stati approvati i progetti di fattibilità relativi al Museo Pecci, Officina Giovani e S. Caterina, mentre è stato approvato il progetto definitivo relativo alla Gualchiera di Coiano.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più	Il 2022 è segnato dalla ripresa del settore turistico, con il ritorno delle presenze straniere che erano drasticamente diminuite durante la pandemia, ritornando ai valori pre covid. E' continuata l'attività di promozione e valorizzazione dei cammini e d è stato inaugurato "La via	<p>Presenze turistiche</p> <p>Presenze strutture ricettive (gg medi)</p>	<p>352.050</p> <p>2</p>	<p>464.548</p> <p>2</p>	89%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>attrattiva</p>	<p>delle rocche" un nuovo cammino nell'Appennino pratese tra medioevo e natura che unisce per la prima volta la Rocca di Montemurlo, Torre Melagrana in Calvana, Rocca Cerbaia e Rocca di Vernio.</p> <p>E' stata realizzata la consueta manifestazione EAT Prato 2022 e sono state organizzate varie iniziative di trekking urbano.</p> <p>Il turismo industriale ha riscontrato un notevole successo: molte persone che hanno partecipato a spettacoli in fabbrica, ai laboratori per le famiglie, ai tour in azienda e ai trekking sul territorio di Prato. Sono stati organizzati 8 itinerari di turismo industriale che hanno toccato oltre 25 luoghi tra edifici di archeologia industriale, archivi aziendali e fabbriche in attività, visitandone otto. Allo scopo di far diventare il turismo industriale un'azione permanente per la promozione del distretto tessile, è stata creata la rete "amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali.</p>	<p>Gettito tassa di soggiorno</p>	<p>469.187,57 (annuale)</p>	<p>€ 505.301,5 (annuale)</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi	<p>E' continuata la migrazione dei software applicativi verso componenti tecnologici più moderni e meno costosi. Sono stati integrati e/o completati con nuove funzionalità alcuni interventi di informatizzazione già realizzati (es. procedura cimiteri, nuovo sistema gestione assenze/presenze, dispiegamento del fascicolo gare sul portale Tuttogare e dell'archiviazione sostitutiva su DAX)</p> <p>Sono stati installati 22 telefoni VOIP nelle scuole comunali, così come è continuata la diffusione della banda larga nelle scuole. Sono state installate due nuove salette per le videoconferenze in Palazzo Comunale. E' continuata l'espansione della rete wi-fi comunale installando 20 nuovi punti.</p>	<p>Diffusione tecnologica nelle scuole: n. plessi scolastici con banda larga</p> <p>Diffusione banda larga</p> <p>Punti wifi in città</p>	<p>66</p> <p>86%</p> <p>81</p>	<p>70</p> <p>95%</p> <p>95</p>	90%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle	Sono stati innalzati i livelli di sicurezza informatica attraverso il rinnovo delle piattaforme, attività formative rivolte ai dipendenti, e campagne anti phishing che hanno	Formazione personale in materia di sicurezza	33,59%	80%	43%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
informazioni e delle comunicazioni digitali della PA	visto il coinvolgimento di circa 300 persone.	informatica			



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini	<p>Nel mese di aprile è stata approvata l'Agenda Digitale 2022/2024.</p> <p>Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi servizi on line, sono stati realizzati i seguenti servizi: il servizio di cambio di residenza sulla piattaforma ANPR del Ministero dell'Interno; l'installazione di POS per facilitare i pagamenti elettronici presso le sedi anagrafiche decentrate, l'attivazione della nuova procedura per il rilascio nulla osta passi carrabili, l'attivazione del nuovo catalogo on line della rete bibliotecaria pratese, la procedura per i crediti di accesso ai nidi convenzionati, il sito internet didattica on line che riguarda nidi e scuole dell'infanzia e che contiene tutta la documentazione educativa e didattica, la procedura di rilascio permessi ZTL fuori APU e la procedura per i concorsi on line.</p> <p>E' proseguita l'implementazione dei servizi su PagoPa (ordinanze di ingiunzione per ambiente, turismo e sociale, matrimoni, orti e oliveti sociali, edilizia).</p> <p>E' continuato il progetto per il rilascio delle credenziali SPID</p>	<p>Pago PA: servizi e tariffe pagabili tramite PagoPA</p> <p>Servizi digitali inseriti nell'App IO</p> <p>Servizi on line</p> <p>Alfabetizzazione digitale: n. persone formate</p> <p>Cittadini supportati per le nuove tecnologie spid</p>	<p>67%</p> <p>12</p> <p>134</p> <p>1.745</p> <p>1.745</p>	<p>70%</p> <p>10</p> <p>100</p> <p>3.000</p> <p>2000</p>	<p>88%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>alla cittadinanza, coinvolgendo le sedi decentrate del Comune e la biblioteca, in vista dell'attivazione del nuovo catalogo, il cui accesso avverrà tramite Spid. E' stata avviata l'attività della Control Room, integrando i flussi di dati nella piattaforma regionale in uso.</p>				





Grafico 2

AMBITO STRATEGICO - Città del futuro


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
5. Rigenerazione urbana	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti	Dall'attività di monitoraggio del Piano Operativo, per verificarne l'impatto sulla trasformazione del territorio, risultano presentati 13 piani attuativi in attuazione delle aree di trasformazione. I permessi da costruire convenzionati richiesti sono 11. Il principale ambito di intervento ha riguardato quindi le nuove edificazioni, in particolare per la destinazione residenziale ed artigianale. Gli interventi di riuso delle aree di trasformazione sono solamente 4 e riguardano principalmente dei piani attuativi, tra questi la destinazione commerciale è quella più richiesta. Parallelamente è stato portato avanti il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale, che nel 2022 ha visto la predisposizione del materiale per la conferenza di copianificazione indetta dalla Regione.	Consumo di suolo (% superf urbanizzata) Premessi a costruire (valore annuale) Cambi destinazione d'uso (valore annuale) Perequazioni immobiliari	33,2 (dato 2021) 222 168 3	33,2 300 200 5	80%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.2 Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni	I progetti di riqualificazione dello spazio pubblico hanno riguardato le zone di San Paolo e Chiesanuova, compresi nel progetto Piu- Urban Places. Si tratta della riqualificazione dei giardini di via Vivaldi, via dell'Alberaccio, via Spontini, via Da Prato, via Wangen.	Spazi pubblici riqualificati	3	3	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	<p>Per rafforzare la sicurezza, si è agito potenziando il controllo del territorio, incentivando la presenza delle pattuglie nelle frazioni e nel centro storico. Nelle frazioni è stata portata avanti un'attività strutturata di polizia di prossimità, attraverso i punti mobili di ascolto presenti nelle zone di massima aggregazione. E' stato ulteriormente esteso il sistema di videosorveglianza cittadino, in seguito al contributo regionale e sono stati installati 8 nuovi punti. Coerentemente con la ripresa dell'attività post-pandemica, è stato intensificato il presidio del territorio in occasione degli eventi e manifestazioni programmate nei giorni festivi.</p> <p>Sono stati organizzati servizi specifici di controllo diretti alla repressione di comportamenti cause di incidenti stradali, come la guida in stato di ebbrezza, la guida con il cellulare la guida senza assicurazione o senza patente.</p>	<p>sicurezza del territorio: (n. agenti di Pm/ numero abitanti)*1000</p> <p>indice di criminalità: numero denunce/100.000 abitanti</p> <p>telecamere di videosorveglianza comunali connesse con le forze dell'ordine (ogni 1000 abitanti)</p> <p>n. servizi appiedati polizia municipale</p>	<p>0,92</p> <p>4.517,23</p> <p>0,90</p> <p>1.045</p>	<p>1</p> <p>5000</p> <p>1</p> <p>1100</p>	<p>93%</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
7. Dal decoro della città alla tutela del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	Si sono conclusi i lavori di risagomatura di quattro fossi di raccolta delle acque di drenaggio per la riduzione del rischio di esondazione nelle zone di: S.Giorgio a Colonica, Tavola, Paperino, Castelnuovo.	Risagomatura canali, n.	4	4	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade,	La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria è stata portata avanti durante tutto l'anno senza interruzioni. Sono stati realizzati interventi di riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale e di eliminazione delle barriere architettoniche. È stato regolarmente svolto il servizio di illuminazione pubblica, così come l'attività di manutenzione del verde	manutenzione strade: mq intervento manutenzione ordinaria strade illuminazione stradale:	122.906 32,89	95.756 33	92%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
giardini, piazze, cimiteri)	<p>pubblico, Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi verdi, sono stati conclusi i lavori nei seguenti giardini: Via Carlo Marx, Via Valori a Galciana, Via Capponi, Via Hermada, area verde di Via Tirso, area sgambature via Curtatone, nei giardini della scuola infanzia Da Quarata, giardini nido via Paisiello. E' stato inoltre approvato il progetto definitivo del nuovo parco Giocagiò che sarà realizzato in Via Turchia e il progetto esecutivo della riqualificazione del Parco Giocagiò 1, con la realizzazione dell'area Andiamo al Mare. Si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione ed eliminazione di barriere architettoniche presso vari cimiteri comunali.</p>	<p>punti luce/ km strade n. giardini riqualificati</p>	9	12	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.3 Garantire l'efficienza dei servizi a rete	La gara delle reti del gas è stata rimandata al 2023 per definire le modalità con cui proseguire in seguito alle recenti sentenze del Consiglio di stato.	Tasso di depurazione delle acque reflue prodotte	97	97	n.d

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità	<p>Il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti) è stato svolto regolarmente. E' in corso la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in Via Paronese a cura di Alia, mentre è stato approvato il progetto di fattibilità e adottata la variante urbanistica per la</p>	<p>% raccolta differenziata produzione pro capite rifiuti urbani</p>	<p>72,88% 605,50</p>	<p>72,50% 630</p>	67%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
ambientale	realizzazione di un secondo centro di raccolta in via Marconi.	nuovi centri di raccolta	0	2	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	<p>Il servizio Protezione civile è stato coinvolto fino al 31/03/2022 nel coordinamento della COC, attiva 24h, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Con la cessazione dello Stato di Emergenza è stata avviata la fase di "Superamento dell'emergenza", attraverso il coordinamento di tutte le attività necessarie al ripristino dello stato ordinario.</p> <p>Si è concluso il percorso formativo per i volontari di protezione civile, che sono stati inseriti nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.</p>	n. volontari a disposizione per la protezione civile	200	300	67%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Per quanto riguarda la tutela degli animali, è stato fatto il nuovo affidamento del canile, del servizio S.O.S. animali 24h/24h e dell' oasi felina gattile "la Bogaia" e delle colonie feline. E' iniziato il servizio di cattura dei gatti di colonia finalizzato alla sterilizzazione degli esemplari.	<p>Realizzazione nuovo canile</p> <p>Arre sgambatura cani: n aree sgambatura/n.parchi e giardini</p>	<p>0</p> <p>8,26%</p>	<p>1</p> <p>7,80%</p>	50%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	<p>Gli interventi per la riduzione dell'inquinamento hanno riguardato sia la bonifica di siti inquinati che la riduzione delle emissioni e della plastica. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, si è conclusa la bonifica del Piazzale Palasaccio ed è stata approvata la progettazione per la bonifica del Canale della Corsa delle Cascine di Tavola.</p> <p>In vista dell'adozione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) si è conclusa l'analisi dei risultati delle indagini di vulnerabilità climatica del territorio e la valutazione degli assorbimenti di carbonio. Il Comune di Prato è stato selezionato dalla Commissione Europea tra le 100 città dell'Unione che parteciperanno alla missione "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030" con le conseguenti attività che dovranno necessariamente coordinarsi ed integrarsi con la stesura del PEASC. Essere stati selezionati dalla Commissione Europea per la missione suddetta, comporta una necessaria rivalutazione degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti fissati per il PAESC, che necessariamente dovranno tendere alla neutralità climatica al 2030, anziché la riduzione inizialmente prevista del 40%.</p>	inquinamento aria (PM10): superamento qualità dell'aria	14	22,5	61%
		inquinamento aria (NO2): superamento qualità dell'aria	0	0	
		emissione CO2 procapite	3,99 (dato 2020)	<0,77	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	Sempre con riferimento alla riduzione dell'inquinamento e quindi della plastica, è stato realizzato un nuovo fontanello a Mezzana e ed è avviata la procedura per realizzarne un altro in via dell'Olmo. Sono state portate avanti le analisi chimiche e microbiologiche periodiche sui 23 impianti di affinamento dell'acqua installati in alcune scuole ed edifici comunali.				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.2 Interventi di efficientamento energetico	Con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici sono iniziati i lavori presso la scuola Borgosanpaolo – Le Girandole. Si sono invece conclusi i lavori di Palazzo Benassai. E' stata indetta la gara per il nuovo Servizio Energia, che vista la notevole complessità, è ancora in corso. Per quanto riguarda il servizio di pubblica illuminazione continua l'attuale gestione con la progressiva sostituzione dei punti luce con illuminazione a Led, al fine di diminuire i consumi	consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/ tot. Consumi interni n. edifici riqualificati da un punto di vista energetico punti luce illuminazione pubblica a LED/ totale punti luce	n.d. 4 38,93%	6,9 14 40%	63%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</p>	<p>Sulla base del Piano di Forestazione urbana contenuto nel Piano Operativo del Comune di Prato esiste un legame tra forestazione, salute umana, biodiversità vegetale e faunistica e resilienza urbana. L'amministrazione ha lavorato in tale direzione partecipando a progetti europei e regionali. Il progetto Verde Urbano Carbon Neutral, finanziato dalla Regione Toscana, ha realizzato tre lotti funzionali relativi ad aree prospicienti la Declassata area Via Rimini, area Pecci e area Nenni. Parallelamente alla forestazione urbana, viene portato avanti il progetto Urban Jungle, che ha lo scopo di creare hub verdi tra la comunità, costruire cioè nuove isole verdi ad alta densità in spazi/ strutture vicini ad aree particolarmente critiche (isole di calore, inquinamento). La sperimentazione prevede la riprogettazione in chiave green di alcuni edifici e delle aree urbane limitrofe per sfruttare la capacità naturale delle piante di abbattere le sostanze inquinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione della comunità e trasformare le aree marginali in veri e propri hub verdi all'interno della città. Con riferimento al progetto pilota del Macrolotto 0 – mercato metropolitano, sono in corso i lavori, così come per gli alloggi popolari Via Turchia, la cui realizzazione verrà portata avanti da EPP. Sempre nell'ambito del progetto Urban Jungle sono state installate 28 centraline in collaborazione con il CNR per misurare l'efficacia degli interventi di forestazione sulla qualità dell'aria. E' continuata la promozione della alla piattaforma informatica Prato Forest City, lanciando la campagna "Dona un albero" che permette di acquistare un albero, collocarlo in un parco e dargli un nome.</p>	<p>Forestazione urbana: alberi/ 100 abitanti in aree pubbliche</p> <p>Verde pubblico fruibile: mq verde pubblico urbano fruibile/ tot. abitanti</p>	<p>18,20</p> <p>25,46</p>	<p>20</p> <p>13,5</p>	<p>96%</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>9. Mobilità sostenibile</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</p>	<p>La Polizia Municipale di Prato ha dedicato particolare attenzione al progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Ha elaborato ed organizzato progetti formativi che hanno come obiettivo l'apprendimento delle regole della circolazione e l'educazione alla legalità ed al rispetto degli altri. Durante l'anno sono state effettuate 485 ore di educazione stradale.</p> <p>Sono stati effettuati controlli specifici sull' autotrasporto nelle aree produttive ed artigianali e in prossimità dei sovrappassi autostradali in collaborazione con la Polizia stradale.</p> <p>Sono stati attivati controlli per limitare e contrastare tutti quei comportamenti scorretti e contrari al codice della strada, che vengono posti in essere nel camminare e nel guidare biciclette e monopattini. Oltre ai controlli, sono stati effettuati incontri con gruppi di cittadini extracomunitari, che fanno un frequente utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile, al fine di porre l'attenzione sull'utilizzo corretto dei questi mezzi e sul rispetto del codice della</p>	<p>n. incidenti con danni alle persone</p> <p>indice di lesività stradale</p>	<p>791</p> <p>1,22</p>	<p><900</p> <p><0,85</p>	<p>85%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	strada. Inoltre sono stati realizzati alcuni interventi per la sicurezza stradale, come quelli relativi a viale Borgovalsugana e altri interventi per ridurre l'incidentalità.				



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione	E' stato realizzato il collegamento stradale tra vi aManzoni e via Garduna in località Iolo. Sono iniziati i lavori per il collegamento fra Via S. Allende e Via Tobbianese e i lavori per la messa in sicurezza dell'intersezione via Manzoni, via Bigoli, via Verzoni. Sono iniziati anche i lavori di mitigazione ambientale della seconda tangenziale, che riguardano la sistemazione idraulica dei prismi arginali. Sempre con riferimento alla II tangenziale, è stato predisposto il nuovo accordo di programma definendo gli interventi necessari per portare a compimento il Protocollo d'intesa iniziale (lotto 4B e lotto 6). Nell'ambito del sistema della sosta a pagamento dell'intero territorio comunale, è stato effettuato il rilevamento complessivo di tutti gli stalli di sosta esistenti, la loro suddivisione ed attribuzione numerica rispetto alle varie vie e/o piazze, la definizione della relativa tariffazione e dell'indice medio di rotazione.	n. nuove infrastrutture stradali realizzate	1	9	11%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</p>	<p>Relativamente alla ciclovia Firenze-Prato, dopo la conclusione dei lavori del lotto 1 nel 2021, nel 2022 sono iniziati i lavori del lotto 2. Per quanto riguarda la Ciclovia del sole, è stato approvato il progetto definitivo.</p> <p>In merito alla realizzazione di piste ciclabili cittadine, queste beneficiano di due importanti finanziamenti: il Credito sportivo e il PNRR. Per quanto riguarda gli interventi del Credito sportivo, sono stati approvati 9 progetti definitivi/ esecutivi su un totale di 11 interventi previsti. Relativamente agli interventi finanziati con fondi PNRR, sono stati approvati i progetti esecutivi di tutti e 7 i lotti funzionali previsti.</p> <p>Per quanto riguarda la mobilità Casa-scuola, si sono conclusi i lavori del Polo scolastico Galcianese lotto 1, stralcio 1 e 2, mentre è avviata la procedura di gara per gli altri 4 interventi del medesimo polo scolastico.</p> <p>Con riferimento al Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), è stato approvato uno dei piani di settore, ossia il Biciplan (Piano urbano della mobilità ciclistica).</p> <p>Relativamente al servizio di trasporto pubblico, è stata pubblicata la gara per la realizzazione di una campagna di rilevazione e di monitoraggio della qualità reale e percepita dei servizi di trasporto pubblico, sia in riferimento al TPL che al servizio ferroviario, nonché alle loro interconnessioni. La realizzazione della rilevazione è stata rimandata al 2023.</p>	<p>Km piste ciclabili</p> <p>numero auto/100 abitanti</p> <p>% utilizzo del trasporto pubblico</p> <p>Km rete tpl / popolazione</p> <p>n. colonnine di ricarica elettrica</p> <p>n. percorsi pedibus attivati</p>	<p>118</p> <p>60,88</p> <p>9,57</p> <p>0,11</p> <p>40</p> <p>19</p>	<p>118</p> <p>56</p> <p>11%</p> <p>0,11</p> <p>60</p> <p>19</p>	<p>91%</p>



Grafico 3



AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>10. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità</p>	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</p>	<p>Si è concluso il passaggio alla gestione diretta della SdS. Il percorso, iniziato nel 2020, ha visto prima il passaggio a gestione diretta degli altri comuni della Provincia e delle assistenti sociali di tutti i comuni, per poi concludersi nel primo semestre 2022 con il passaggio delle attività socio assistenziali del Comune di Prato previste dalla convenzione. Si è così data effettività e concretezza all'obiettivo regionale di attuare, tramite la forma del consorzio pubblico delle società della salute, l'integrazione funzionale tra i servizi socio sanitari e socio assistenziali delle aree zonali.</p>	<p>Attivazione gestione diretta SdS</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>100%</p>



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
<p>10.2 Sostenere le fragilità diffuse</p>	<p>I servizi di inclusione sociale sono stati offerti in modalità integrata con i servizi sociali degli altri comuni soci SDS, in particolare attivato il Nuovo Social Board che consiste in servizi di sostegno sociale e di inclusione socio- lavorativa. Sono stati attivati i progetti utili alla collettività nell'ambito</p>	<p>n. anziani in carico al 31/12/ tot popolazione anziana*1000 abitanti n. minori inseriti in famiglia/</p>	<p>47 72%</p>	<p>53 65%</p>	<p>94%</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>degli interventi previsti in attuazione delle misure sul reddito di cittadinanza. E' stato avviato il centro diurno e il centro servizi leggero a disposizione delle persone senza fissa dimora.</p> <p>E' stato approvato il regolamento del sistema in inclusione sociale per l'abitare, per disciplinare l'emergenza alloggiativa.</p> <p>Per quanto riguarda la tutela dei minori, è stata favorita la permanenza in famiglia attraverso progetti di supporto alla genitorialità e laddove ciò non è stato possibile, si è intervenuti con le famiglie affidatarie.</p> <p>Sono proseguiti i servizi di assistenza domiciliare e fornitura pasti caldi, sia per le persone anziane e disabili, così come avviata la nuova convenzione del servizio di trasporto sociale. Sono stati rilasciati gli accreditamenti agli operatori individuali in seguito alla nuova normativa in materia di accreditamento delle badanti.</p> <p>Sono partite le procedure per l'inserimento di anziani autosufficienti nei gruppi appartamento Si tratta di un nuovo servizio per l'area pratese avviato negli ultimi mesi del 2021 e che consente di proporre risposte a tematiche abitative con necessità assistenziali e di tutela per persone anziane e fragili.</p> <p>Sono stati finanziati tramite il PNRR progetti sulla genitorialità, il supporto alla disabilità e la realizzazione di un centro servizi per la marginalità.</p>	<p>minori presi in carico</p>			

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
11. Una casa per tutti	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.1 Housing sociale	La maggior parte delle azioni relative all'housing sociale saranno portate avanti nel 2023.	alloggi in social housing	72	140	51%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	<p>E' stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono stati assegnati 10 alloggi ai primi in graduatoria. Si prevede di assegnare la maggior parte degli alloggi nel 2023 e nel 2024.</p> <p>E' continuata l'attività di controllo sugli assegnatari di case popolari, permettendo di recuperare 3 alloggi, che possono essere riassegnati.</p>	n. alloggi assegnati/ tot cittadini in graduatoria	1,025%	9,55%	10%



Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
12. Accogliere, includere, integrare le diversità	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.	<p>I servizi in materia di immigrazione e protezione internazionale sono proseguiti regolarmente. La strutturazione dello sportello consente una progressiva qualificazione e il conseguente rafforzamento dell'erogazione dei servizi al cittadino, in sinergia con altri servizi dell'A.C., la Questura di Prato, la Prefettura di Prato - UTG, nonché l'Ufficio estero e il Centro salute mentale dell'Azienda USL Toscana Centro.</p> <p>Sono state realizzate le attività relative ai seguenti progetti di integrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto L.A.I.V. (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità), che prevede azioni di inclusione scolastica per l'insegnamento della lingua italiana ad alunni non italofoni; - progetto TEAMS che prevede il rafforzamento dell'accesso consapevole per la presa in carico integrata in ambito socio-lavorativo; - progetto LINEE EDUCATIVE URBANE che riguarda azioni socio educative e di recupero scolastico, laboratori di didattica inclusiva, orientamento alle scuole superiori; - progetto APRITI SESAMO che si occupa di corsi di lingua e 	<p>livello gradimento sportello immigrazione (scala 1-5) 4,88</p> <p>rom e sinti: famiglie coinvolte dall'accompagnamento alloggiativo 8</p> <p>campi sgomberati 0</p>	<p>4,8</p> <p>8</p> <p>3</p>	67%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>corsi di formazione specifici rivolti a cittadini di Paesi Terzi, in particolare a target vulnerabili di beneficiari (donne, disoccupati, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto EMBRACE specifico per azioni di ricerca e analisi territoriale, supporto alla partecipazione dei migranti nei processi decisionali e nell'implementazione delle politiche di inclusione. - progetto L.I.P.S. si riferisce alla promozione della lettura destinate alle comunità immigrate. <p>Inoltre sono stati portati avanti i seguenti progetti di accoglienza degli immigrati, con particolare attenzione ai richiedenti asilo: progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza e Integrazione) e S.A.T.I.S. (Sistema Antitratto Toscano Interventi Sociali) che riguarda l'emersione dello sfruttamento lavorativo, l'accoglienza e la tutela delle vittime.</p> <p>Nell'ambito del progetto di superamento delle aree di sosta di rom e sinti, sono stati approvati: il Regolamento per la permanenza delle famiglie rom e sinti nelle aree residenziali attrezzate e per il loro superamento e il Piano per il superamento delle aree. E' in corso l'orientamento e l'accompagnamento alloggiativo di 8 famiglie per il superamento dell'Area di sosta di V.le Manzoni.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.2 Tutelare i diritti di	Sono state portate avanti iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere una cultura delle pari opportunità, che hanno	Accessibilità edifici comunali: edifici senza	69,70%	70%	99%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	riguardato: la Giornata internazionale dei diritti della donna, la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, la giornata internazionale della violenza contro le donne. E' stato sottoscritto l'Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY.(Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni). Nell'ambito di tale accordo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa a livello provinciale per l'adesione al centro antidiscriminazione. E' stato presentato un progetto per realizzare attività di sensibilizzazione nelle classi di scuola secondaria di primo grado, primaria e d'infanzia al fine di sollecitare una riflessione critica sugli stereotipi. Per quanto riguarda l'inclusione delle persone con disabilità, il Comune ha partecipato ad un progetto per l'inclusione sportiva, attraverso l'acquisto di attrezzatura sportiva e ausili ginnici specifici, da concedere mediante comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che si occupano di sport inclusivo. Nel corso dell'anno è avvitata la gara per l'acquisto delle attrezzature. Il progetto si concluderà nel 2023.	barriere architettoniche/tot edifici comunali attivazione servizio taxi per disabili	31/12/2022	31/12/2022	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	<p>Il Comune di Prato gestisce in modo diretto nove strutture di Nido d'infanzia nell'a.e 2021/2022, che sono diventate dieci nell'a.e 2022/2023 grazie all'apertura da settembre del Nido "Le Fontanelle", accogliendo oltre 350 bambini.</p> <p>La gestione diretta del servizio unitamente al sistema integrato pubblico/privato, dove accanto ai nidi comunali operano, alle stesse condizioni, i nidi privati convenzionati, garantisce una offerta diffusa ed uniforme nella città. E' approvata la nuova convenzione fra Comune e nidi privati con una prospettiva temporale triennale e con la messa a punto di un meccanismo che, sostenendo le famiglie nell'esborso economico per il pagamento della rette di frequenza, garantisca la sopravvivenza delle imprese operanti in questo settore, duramente colpite dal protrarsi dell'emergenza pandemica.</p> <p>Attraverso questionari somministrati alle famiglie è stata valutata la qualità del servizio, che ha raggiunto il punteggio di 5,37 su una scala da 1 a 6.</p>	Indicatore di Lisbona; bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia/ popolazione in età 3-36 mesi	40,6	40,6	94%
		soddisfazione del servizio asili nido (scala 1-6)	5,48	5,55	
		soddisfazione servizi integrativi (scala 1-6)	4,24	5,07	
		soddisfazione servizi scuola infanzia (scala 1-6)	5,08	4,93	
		soddisfazione servizio refezione scolastica (scala 1-6)	4,48	5	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>Per promuovere le attività e il gioco dei bambini all'aria aperta è proseguito il Progetto "Crescendo...tutti all'aria" con attività nei giardini dei nidi e delle scuole.</p> <p>E' stato fatto il nuovo l'affidamento dei Servizi integrativi per l'infanzia: Spazi Gioco Centri per Bambini e Famiglie e Laboratori estivi con una durata pluriennale, così da garantire una continuità educativa. Il nuovo servizio è avviato con l'a.e 2022/2023.</p> <p>E' stato modificato il Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi scolastici, è stato riaffidato il servizio di trasporto scolastico, la cui nuova gestione è partita dall'a.s. 2022/2023. E' avviata la procedura di gara per la riorganizzazione del servizio pre-post scuola.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure	<p>Si sono conclusi i lavori della scuola primaria di Casale relativi allo spazio polivalente e sono iniziati i lavori del parcheggio.</p> <p>Si sono conclusi i lavori dello spazio polivalente della scuola Santa Gonda e quelli di ampliamento della scuola di Cafaggio (1°e 2° lotto)</p> <p>Sono iniziati i lavori del Nido Arcobaleno e della mensa della scuola Marcocci. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, sono stati conclusi i lavori di adeguamento sismico</p>	<p>spesa media manutenzione ordinaria scuole</p> <p>n. ampliamenti e nuove costruzioni scuole</p> <p>n. plessi con giardini riqualificati</p>	<p>€ 7.651</p> <p>4</p>	<p>€ 5.415</p> <p>13</p> <p>50</p>	44%


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>di 15 scuole. Per quanto riguarda i finanziamenti PNRR, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola Pier Cironi e il progetto di fattibilità per la riqualificazione dei giardini scolastici. Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3.</p>				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.3 Per una scuola inclusiva	<p>Le attività per l'inclusione scolastica degli alunni con background migratorio si sono svolte durante tutto l'anno scolastico, sia per quanto riguarda gli alunni delle scuole primarie e secondarie, sia per quanto riguarda i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Nello specifico è stato attivato il servizio di supporto ai genitori per le iscrizioni scolastiche, sia per i servizi educativi che per le scuole primarie e secondarie. Sono stati realizzati i laboratori di facilitazione linguistica e di didattica inclusiva a classe intera. In ciascun Istituto Scolastico sono state realizzate attività di sostegno alla genitorialità attraverso l'attivazione di sportelli di mediazione linguistico-culturale così da poter mantenere e migliorare le comunicazioni scuola-famiglia. Sono inoltre stati organizzati, con modalità diffusa in tutti gli istituti, i corsi estivi di lingua italiana L2 rivolti agli alunni della scuola primaria. Sono continuati gli interventi garantire il diritto allo studio</p>	Integrazione linguistica alunni stranieri: % alunni (scuola dell'obbligo) che a fine a.s hanno competenze linguistiche minime	68	86	79%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria. Continuano i controlli e i monitoraggi sull'assolvimento dell'obbligo scolastico.				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale	<p>E' stata portata avanti un'attività di promozione degli spazi e dei servizi della Lazzerini attraverso visite guidate finalizzate alla conoscenza e promozione dei servizi e delle collezioni della biblioteca, e gli incontri con le classi di infanzia, primaria e secondaria. Sono inoltre ripartite le aperture domenicali della Biblioteca Lazzerini. Per quanto riguarda le biblioteche decentrate, è proseguito il Progetto lettura che ha coinvolto le scuole del territorio.</p> <p>E' stato realizzato anche quest'anno il progetto scolastico "Letture per l'estate", cioè la elaborazione e successiva messa a disposizione on line di bibliografie specifiche per gli alunni dei vari gradi scolastici, rivolte agli insegnanti.</p> <p>Per ampliare la fascia di utenza delle biblioteche sono state attivate azioni mirate alle fasce di pubblico 0-6 anni e agli adolescenti. Per quanto riguarda la fascia 0-6 si è aderito alla rete Nati per leggere, organizzando incontri e letture. Per quanto riguarda gli adolescenti, sono stati organizzati incontri e visite guidate con le scuole secondarie.</p> <p>Inoltre sono stati portati avanti vari progetti culturali e formativi, tra cui: l'organizzazione di rassegne, mostre, corsi formativi ed eventi dedicati alla sezione bambini e</p>	<p>utilizzo servizio biblioteca: iscritti attivi al servizio bibliotecario/ popolazione</p> <p>Realizzazione Nuova Biblioteca Casale</p>	14,31%	23,26%	81%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	<p>ragazzi che hanno permesso di incrementare le presenze in biblioteca.</p> <p>E' stato adottato il Patto Intercomunale per la lettura, che ha coinvolto i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese (Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio). Ciò ha permesso di ottenere la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022/2023 (iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali) che ha consentito di realizzare molte iniziative di promozione del libro e della lettura.</p>				


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi	<p>Sono stati approvati i seguenti progetti di fattibilità Tecnico Economica, ammessi, a fine 2021, a finanziamento nell'ambito del PNRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo da calcio Paperino II lotto; - Piscina Galilei: riqualificazione impianti - Adeguamento antincendio palestra di via Roma piano primo; - Riqualificazione vari campi da calcio e rugby (Viaccia, Maliseti, Montano e Fantaccini). <p>Nel 2022 è stata ammessa a finanziamento del PNRR anche la realizzazione della nuova piscina olimpionica ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico.</p> <p>Sono stati inoltre approvati i progetti relativi a: pavimentazione pista di atletica Ferrari, sostituzione telone di copertura del pattinodromo, rifacimento spogliatoi piscina via Roma.</p> <p>Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo campo sportivo di Paperino e la realizzazione di due nuove palestre del complesso multidisciplinare di San Paolo e sono stati affidati i lavori per il risanamento conservativo della Tribuna d'onore dello stadio Lungobisenzio.</p> <p>Per il dettaglio dei lavori si veda la parte 3.</p>	impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione/ tot impianti sportivi	17	30,95	55%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.2 Promuovere uno stile di vita	Sono proseguite le attività a sostegno dei principali eventi sportivi cittadini e la promozione e organizzazione dell'attività motoria degli anziani.	Promozione sportiva nelle scuole: n. bambini partecipanti all'attività	37%	32%	47%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore atteso al 2024	% avanzamento
sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	<p>E' stato siglato il nuovo protocollo d'intesa per l'attività del Trofeo Città di Prato per la promozione dello sport nelle scuole, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze del rinnovato contesto di riferimento. Il protocollo è diventato operativo dall'a.s. 2022/2023.</p> <p>E' entrata a regime la nuova piattaforma che permette ai concessionari degli impianti sportivi di richiedere alla A.C. interventi di manutenzione straordinaria.</p> <p>Sono stati classificati gli impianti sportivi secondo la rilevanza economica, al fine di individuare i modelli gestionali adeguati e le conseguenti modalità di affidamento.</p> <p>E' stata fatta un'ulteriore mappatura degli impianti sportivi per avere un quadro esaustivo delle discipline praticabili e del livello federale delle attività che possono essere svolto nelle varie strutture. Questa rilevazione è funzionale ad una migliore allocazione degli spazi fra le società cittadine, tenendo conto dei successi sportivi ottenuti che richiedono impianti dotati di determinate caratteristiche strutturali.</p>	<p>del Trofeo città di Prato / popolazione scolastica</p> <p>Offerta eventi sportivi: n. eventi sportivi/ 1000 abitanti</p>	0,042	0,5	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>15. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
15.1 Diritto di essere ascoltati	Dopo l'istituzione del Consiglio dei ragazzi nel 2021, nel corso dell'anno 2022 si è regolarmente riunito, con 3 sedute. I ragazzi del Consiglio prenderanno parte al percorso partecipativo del nuovo piano strutturale, che partirà nel 2023.	n. atti-procedure a cui partecipano bambini e adolescenti	0	1	50%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
15.2 Diritto di accesso ai servizi di base	Il percorso per il riconoscimento di Città amica dei bambini e degli adolescenti è iniziato nel 2022 con l'istituzione del garante dei diritti dell'infanzia. La gran parte delle attività del percorso di riconoscimento verrà svolta nel 2023.	Riconoscimento Città Amica dei Bambini	0	1	10%

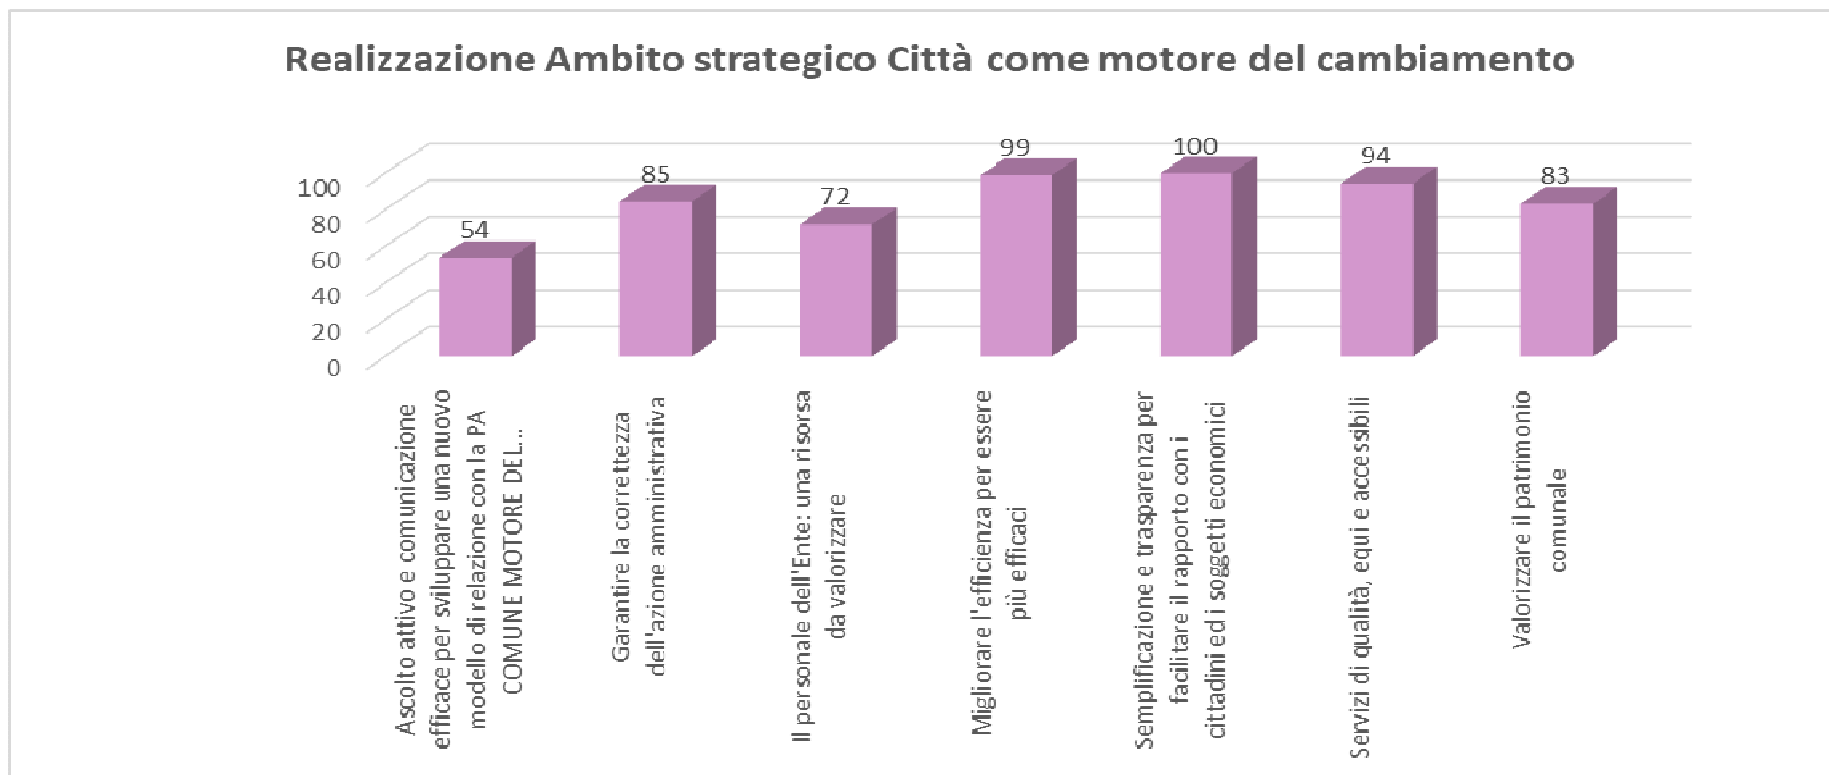


Grafico 4

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>16. L'amministrazione efficace e efficiente</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
<p>16.1 Il personale dell'ente, una risorsa da valorizzare</p>	<p>Nell'ottica di conciliare i tempi di vita lavoro è stato variato il Regolamento sul lavoro agile per adeguarsi alle linee guida in materia di lavoro agile emanate per le amministrazioni pubbliche. Sono state poste in essere le azioni previste nel piano delle azioni positive, che hanno riguardato la mappatura dei part time e il monitoraggio dei turni di lavoro e l'attivazione di corsi di formazione relativi sulle competenze digitali, su mobbing e discriminazione. Inoltre è stato predisposto il progetto, in collaborazione con l'ordine degli psicologi, per l'attivazione di uno sportello di ascolto all'interno dell'Amministrazione. Lo sportello ha lo scopo di favorire un completo benessere psico-fisico e sociale del personale del Ente.</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, è stato approvato il Piano della formazione e sono stati attivati i vari corsi di formazione. Inoltre, dopo due anni di stop sono stati riattivati i tirocini formativi.</p> <p>Relativamente all'incentivazione, è stato modificato il sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo conto delle indicazioni del Nucleo di valutazione finalizzate ad una semplificazione del sistema.</p> <p>Per quanto riguarda il Datore di lavoro sono state regolarmente espletate le attività formative, le attività di sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi degli edifici.</p>	<p>n. dipendenti assunti nel triennio</p>	<p>48</p>	<p>67</p>	<p>72%</p>


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
16.2 Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	<p>Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e al fine di garantire il raggiungimento di livelli di performance più elevati, si è lavorato sull'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente, attraverso azioni di riduzione delle spese e di recupero delle entrate.</p> <p>Con l'assegnazione al Comune di Prato delle risorse PNNR e la costante pubblicazione di nuovi bandi di finanziamento, si è resa necessaria un'attenta attività di presidio e coordinamento al fine di poter cogliere le opportunità che si presentano selezionando accuratamente i bandi di interesse. Inoltre è stata attivata una procedura di controllo degli interventi finanziati, integrando il sistema di programmazione e controllo esistente.</p> <p>Sono stati approvati tutti gli atti necessari per la rimozione dei vincoli sul prezzo di vendita o canone di locazione degli alloggi costruiti su aree PEEP.</p> <p>E' stato revisionato il Regolamento per i contributi e patrocini.</p>	<p>Tempestività pagamento fatture: gg effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento</p> <p>Capacità di riscossione dell'amministrazione comunale</p> <p>Controlli di regolarità amm.va: auditing interno % anomalie riscontrate</p>	-6,06	-5	99%
			75,56%	78%	
			4,7%	<7%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
16.3 Garantire la correttezza amministrativa	E' stato regolarmente assicurato lo svolgimento delle funzioni a supporto del Segretario Generale in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza, di controllo di regolarità amministrativa ex-post (cd. auditing) e di tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali ex Regolamento UE 2016/679. È stato predisposto e	% rispetto misure piano anticorruzione	84,59%	100%	85%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
	<p>adottato il Piano di auditing 2022 ed è stata rivolta particolare attenzione alla correttezza amministrativa degli atti PNRR, creando una procedura informatica ad hoc per monitorare gli interventi.</p> <p>In relazione al trattamento dei dati personali è stata costituita la rete dei referenti per la privacy ed è stato svolto l'evento formativo webinar "Le misure organizzative dell'Ente in materia di tutela dei dati personali" rivolto proprio a tutti i referenti privacy.</p> <p>E' stato regolarmente adottato anche il Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'ente 2022-2024 adeguato alle indicazioni operative date da ANAC nel PNA 2019 e alle successive delibere, nonché aggiornato al documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022". il PTPCT presenta una sezione dedicata al whistleblowing, che definisce le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni rese ai sensi dell'art. 54bis del d.lgs. 165/2001 ed è stata attivata la nuova piattaforma Openwhistleblowing per l'invio e la gestione delle segnalazioni, con l'occasione è stato proposto a tutti i dipendenti e ai fornitori dell'Ente un evento formativo sul tema.</p> <p>E' stato aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni in relazione alle novità normative e alla giurisprudenza.</p> <p>Sulla base delle deliberazioni dell'ANAC, è stato approvato lo schema tipo di disciplinare per le procedure telematiche aperte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Con riferimento alle società partecipate controllate, in seguito alle nuove modalità di reclutamento del personale, sono stati inviati dei suggerimenti in merito agli elementi di base che devono essere contenuti in un regolamento di reclutamento del</p>				


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
	personale.				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	<p>È proseguita regolarmente l'attività di gestione della consistenza patrimoniale dell'ente attraverso la tenuta dell'inventario e la corretta valutazione economica dei beni del patrimonio immobiliare. Sono state quindi avviate le azioni finalizzate ad ottimizzare e armonizzare con l'attuale normativa l'uso degli spazi comunali attualmente utilizzati per finalità sociali, nonché migliorare la conoscenza di tutto il patrimonio comunale per poi avviare azioni di razionalizzazione e valorizzazione. E' stato ricollocato l'archivio storico di S.Caterina, per consentire la realizzazione degli interventi PNRR previsti sull'immobile.</p> <p>Per la gestione delle richieste di acquisizione/locazione/concessione di immobili o terreni da privati è stata attivata una procedura ad hoc.</p> <p>E' stata pubblicata la gara per il nuovo affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti antincendio negli edifici del Comune di Prato e sono stati approvati i progetti per la riorganizzazione degli accordi quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, attraverso nuovi accordi per gli immobili di edilizia scolastica e sportiva.</p>	n. edifici riqualificati	5	6	83%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
17. L'amministrazione al servizio della città	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
17.1 Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici	<p>Per agevolare i cittadini nell'accesso alle informazioni e ai servizi dell'amministrazione, sono stati promossi nuovi canali di comunicazione Facebook e on line con l'URP, è stata rinnovata la pagina internet Urp e il canale di comunicazione T-comunico. Inoltre è stato fornito il supporto per il rilascio degli SPID, sia presso l'Urp che presso la biblioteca Lazzerini.</p> <p>Per comunicare e promuovere gli eventi organizzati a Prato, è in corso di realizzazione il nuovo portale eventi.</p> <p>Per semplificare la richiesta di informazioni sui servizi demografici, è stata attivata e pubblicizzata un'apposita procedura.</p> <p>E' stato messo on line il nuovo portale dedicato ai dati statistici del Comune di Prato (PRATO CONTA).</p>	% rispetto adempimenti in materia di trasparenza	100%	100%	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili	Per garantire l'erogazione di servizi di qualità, sono state periodicamente effettuate analisi di customer, che hanno riguardato i servizi educativi (asili nido, centri gioco, scuola dell'infanzia), la refezione scolastica, la scuola di musica, il museo civico, i progetti di officina giovani rivolti ai ragazzi, lo sportello immigrazione e l'Urp della polizia municipale. Sono stati inoltre elaborati dati statistici a supporto dei processi decisionali e per la partecipazione a progetti. E' stata pubblicato il nuovo Albo dei rilevatori statistici, che eseguiranno nei prossimi anni, per conto dell'ISTAT o del comune di Prato, le interviste alle famiglie o alle aziende in relazione al Censimento e/o alle varie indagini in corso. E' stata effettuata la gestione e organizzazione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022.	Media customer servizi al cittadino	5	5,3	94%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
18. L'amministrazione che dialoga: una nuova comunicazione pubblica	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
---------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	--------------------	---------------


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2022	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Previsione al 2024	% avanzamento
<p>18.1 Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</p>	<p>Sono proseguite le attività per il completamento del nuovo sito istituzionale e l'attività di comunicazione e promozione sul sito "Città di Prato" e sui canali social. Sono state realizzate specifiche campagne informative su progetti strategici come Prato Urban Jungle, Prato Forest City, PNRR e Next Generation EU, Prisma, TIPO, Prato Circular City. L'Urp ha ripreso la propria attività in presenza, riattivando così quel contatto fisico con i cittadini, che era mancato nel periodo dell'emergenza sanitaria. Parallelamente sono state promosse anche le modalità indirette di contatto.</p>	<p>Diffusione canali sociale: follower/1000 abitanti Accessi nuovo sito Processi partecipativi attivati</p>	<p>116 8.617.850 3</p>	<p>500 11.000.000 5</p>	<p>54%</p>

1.2 I principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato

Nel presente paragrafo vengono riportati in maniera sintetica i principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato per ogni obiettivo operativo. La tabella e il grafico seguenti riepilogano la percentuale di realizzazione per ogni obiettivo strategico.

OBIETTIVO STRATEGICO	% realizzazione
DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	83
IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	66
CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	71
INNOVAZIONE DIGITALE COME LEVA DI PROGRESSO E CRESCITA DELLA CITTA'	74
RIGENERAZIONE URBANA	90
SPAZI PUBBLICI SICURI E INCLUSIVI	93
DAL DECORO DELLA CITTA' ALLA TUTELA DEL TERRITORIO	75
PRATO CITTA' GREEN	73
MOBILITA' SOSTENIBILE	62
POLITICHE PER LE FAMIGLIE E WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'	97
UNA CASA PER TUTTI	31
ACCOGLIERE, INCLUDERE, INTEGRARE LE DIVERSITA'	83
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PER INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO	74
SPORT COME STRUMENTO EDUCATIVO E FATTORE DI TRASFORMAZIONE SOCIALE	51
PRATO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI	30
L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	85
L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'	97
L'AMMINISTRAZIONE CHE DIALOGA	54

Realizzazione strategie di mandato

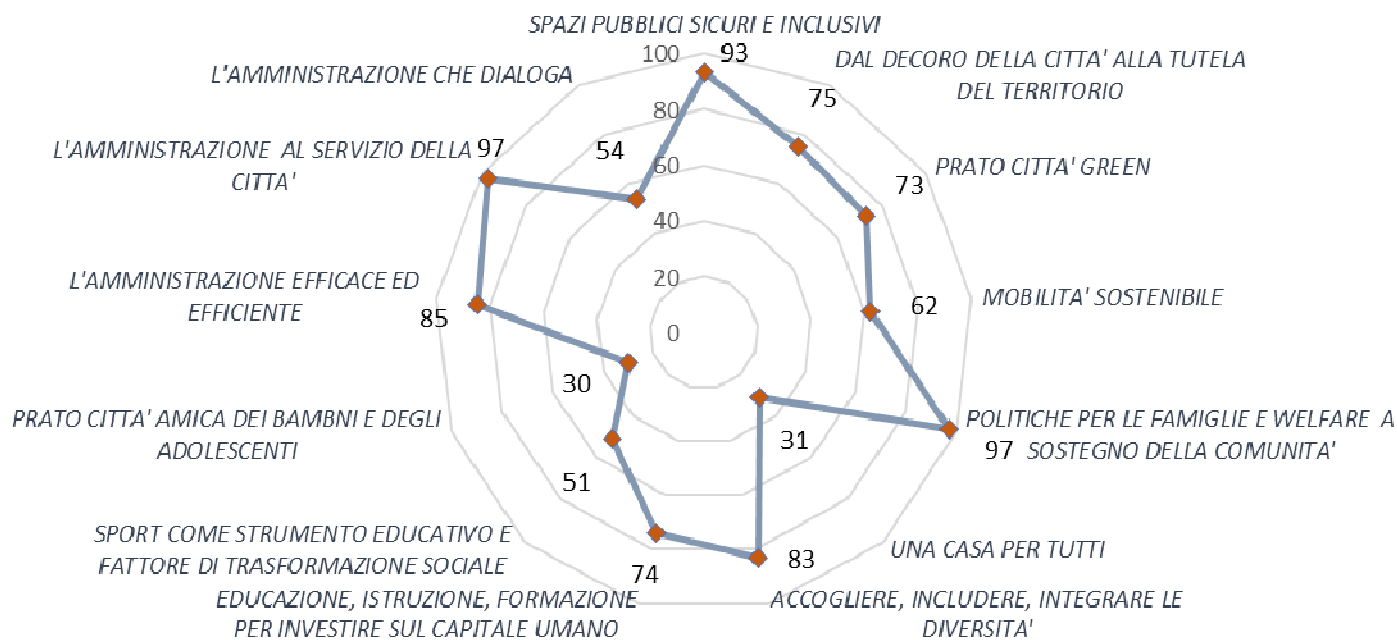

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	<ul style="list-style-type: none"> -iniziato progetto Smarty Smes per la diffusione nelle p/m imprese di nuove tecnologie e modelli di business innovativi; -adesione al progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda -presentato progetto PRISMA Casa tecnologie emergenti 	<ul style="list-style-type: none"> -individuate le sedi del progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) presso il Pin , l'ex CREAM e la Medialibrary -bando per progetti di R&S nelle imprese del settore tessile e moda -bando per start up con alto potenziale di innovazione tecnologica che parteciperanno al programma di accelerazione -conclusione progetto Native 	<ul style="list-style-type: none"> -Inaugurata sede PRISMA in via Galcianese -bando start up con alto potenziale di innovazione da inserire nel programma di accelerazione -elaborato il Piano di azione del progetto Smarty Smes per la diffusione nelle PMI di nuove tecnologie e modelli di business alternativi -iniziato progetto Creative per promuovere i rapporti fra PMI del Mediterraneo nei settori manifatturieri -portato avanti il progetto EYE nelle scuole superiori per la promozione della cultura imprenditoriale e la nascita di start up.
1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione - selezionati due progetti di valorizzazione di start up 	<ul style="list-style-type: none"> -Ristori alle imprese e agli operatori commerciali ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza Covid 	<ul style="list-style-type: none"> -sottoscritto protocollo d'intesa on le associazioni per la valorizzazione delle imprese della filiera corta agro-alimentare -sottoscritto il protocollo d'intesa con le parti sociali relativo al bando e alla selezione delle imprese beneficiarie degli aiuti al distretto tessile
1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Partecipazione al protocollo Sismico con Alia e Sori per il contrasto all'evasione tributaria 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Rinnovato il Procollo Sismico per il contrasto all'evasione tributaria fino al 2024 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese -attivazione controlli sull'imposta di soggiorno -controlli sulla sicurezza e il rispetto della normativa dei prodotti messi in

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
				vendita in particolare cosmetici e abbigliamento
1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Gestione progetto Innomed-up per lo sviluppo di imprese creative nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile -Organizzazione Recò Festival Economia circolare in modalità a distanza -Adesione ai progetti Urge per lo smaltimento e il riutilizzo materiali di risulta provenienti dalle demolizioni -Inizio progetto Prato Circular City per creare un modello di governo cittadino dell'economia circolare 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto Innomed- up: individuati soggetti idonei per sviluppare percorsi di innovazione orientati alla sostenibilità -progetto URGE: elaborato un piano di azione integrato per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sul nostro territorio -Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City attraverso l'approvazione del documento Next Generation Prato, che riporta gli interventi da realizzare per lo sviluppo locale sostenibile 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto Innomed-up: realizzata una guida per applicare i principi dell'economia circolare alle PMI delle industrie culturali e creative -progetto URGE: presentato l'Integrated Action Plan per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sulla circolarità nei grandi interventi infrastrutturali -sottoscritto protocollo d'intesa per la realizzazione dell' Hub del riciclo tessile, finanziato da risorse PNRR
1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Osservatorio sul lavoro e sulle esigenze formative: individuati ambiti di formazione professionale sui quali intervenire 	<ul style="list-style-type: none"> -Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze: monitoraggio costante del mercato del lavoro e fabbisogni formativi delle imprese -Istituzione "Premi di laurea città di Prato" in collaborazione con il PIN 	<ul style="list-style-type: none"> -Accordo con il Pin per l'attivazione dell'osservatorio permanente sulla domanda e l'offerta di lavoro e di formazione -Accordo con il Pin per l'attivazione di un percorso di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana
2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento occupazione suolo pubblico per favorire la ripartenza delle attività commerciali -Processo partecipativo centro storico -Premiati cinque progetti presentati da associazioni e consorzi per la rigenerazione del centro storico 	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività -Processo partecipativo centro storico -Progetto di riqualificazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio 	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento dei dehor e approvazione abaco degli elementi di arredo ammessi -Processo partecipativo e di co-progettazione in centro storico -Organizzazione di eventi culturali e commerciali di animazione del centro -Riqualificazione edifici pubblici del centro storico

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	-Inizio lavori per la realizzazione di uno spazio polivalente e di una biblioteca nel quartiere di Casale, presso la scuola	-Realizzato immobile in via Giordano da adibire a mercato -Adeguamento immobili e riorganizzazione centri civici	-Riapertura 4 centri civici -Conclusione lavori biblioteca di Casale
3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	-Garantiti corsi a distanza della scuola di musica in seguito al covid -approvata nuova convenzione del sistema museale Prato Musei e Regolamento sistema museale	-Convenzione con il Museo del Tessuto per comunicazione e promozione congiunta Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto -Supporto Politeama Spa nella trasformazione da associazione a fondazione	-Rete Prato Musei: organizzazione iniziative e laboratori didattici per le scuole -Concessione spazi Manifatture digitali del cinema -Collaborazione con Fondazione Museo Pecci per organizzazione “Centro Pecci Summer live”
3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	-Prorogata mostra "Dopo Caravaggio" al Palazzo Pretorio -organizzazione iniziative musicali e teatrali all'aperto nel periodo di riapertura estiva	-Prato estate -Officina Jungle -Settembre Prato è spettacolo -Prato Festival -Organizzazione mostra Hi Woman Palazzo Pretorio, mostra Soresen e mostra Bartolini -Iniziativa 700 anni morte di Dante	-Mostre Palazzo Pretorio: Hi woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, gli amici pittori Cesare Guasti -Visite Palazzo Pretorio per pubblici speciali (es. autistici) -Visite guidate “Tesori della Campolmi” per la valorizzazione del Polo Culturale Campolmi -Rassegne culturali Prato estate, Settembre Prato e Prato Festival -Offerta culturale rivolta i giovani: Officina OG, Officina On stage, Officina Teen
3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	-Conclusi lavori ex teatro S.Caterina -digitalizzazione patrimonio AFT	-Conclusi lavori corte interna S.Caterina e mura urbane via S.Caterina -Riapertura al pubblico del Cassero con tre mostre	-Valorizzazione Cassero e Castello con iniziative, mostre e visite guidate -Valorizzazione percorso espositivo Galleria Comunale -Restauro e allestimento delle opere presenti nei depositi del Palazzo Pretorio

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
				-Accordo con Coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali per valorizzare la raccolta di armi presenti nel Palazzo Pretorio -Nuovo sito AFT -Conclusione lavori facciata scuola di musica e accessibilità laboratorio d'arte Leonetto Tintori
3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	-Sviluppo e promozione Cammini: convenzione attuativa Via della lana e delle seta; convenzione via Medicea; convenzione cammino di San Jacopo -Organizzazione Eat Prato con nuovi itinerari -Presentato progetti "Dal fascino della fabbrica al museo di famiglia" per visitare le fabbriche storiche	-Promozione cammini, ampliando l'offerta con laboratori, eventi, gastronomia -Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili -Organizzati eventi legati al progetto "Dal fascino della fabbrica al Museo di famiglia" -Organizzazione Eat Prato Walking	-Inaugurato cammino "La via delle Rocche" -Organizzazione Eat Prato e iniziative di trekking urbano -Turismo industriale: crea la rete "Amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali
4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	-Garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale -Strumenti di comunicazione per l'attività politica on-line	-Nuovo software centrale operativa Polizia Municipale -Rinnovo postazioni di lavoro -Dismissione server obsoleti e passaggio verso nuove piattaforme -Ampliata rete wifi comunale -Rivista infrastruttura informatica scuole e dotazione telefoni voip	-Migrazione dei software applicativi verso componenti tecnologici più moderni -Installati telefoni VOIP nelle scuole -Completamento diffusione banda larga nelle scuole -Installazione nuovi punti wi-fi in città
4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	- Estensione firma digitale - Innalzato il livello di sicurezza dei sistemi informatici	-Sottoscritto nuovo contratto in house per hotline e manutenzione postazioni informatiche	-Rinnovo piattaforme -Formazione ai dipendenti in ambito di sicurezza informatica e phishing

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line per i cittadini -Ampliati servizi presenti su PagoPa 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line ai cittadini -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo di nuovi servizi on line -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione Agenda Digitale 2022-2024 -Attivata Control Room
5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavori in corso progetto Priuss per riqualificazione area lungo il Bisenzio -conclusi i lavori del Mercato Metropolitano e del Playground del progetto PIU -presentato un piano attuativo relativo alla fabbrica a confine con Campolmi -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 -approvazione "Agenda urbana 2050: indirizzi e strategie per il nuovo piano strutturale" 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto PRIUSS: conclusi lavori area lungo il Bisenzio e apertura piazzole attrezzate -adozione variante al Piano operativo -avviato procedimento del nuovo piano strutturale -presentati 3 piani attuativi per riqualificazione aree attraverso perequazione -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 	<ul style="list-style-type: none"> -Piano strutturale: predisposizione materiale per la conferenza di copianificazione indetta dalla Regione
5.2	<i>Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> -approvazione progetti di riqualificazione degli spazi di San Paolo e via Wangen (PIU2) 	<ul style="list-style-type: none"> -aggiudicazione lavori di riqualificazione spazi San Paolo -inizio lavori mobilità sostenibile via Giordano e via Pistoiese -conclusi lavori P.za Milton Nesi a Coiano -regolamento street art 	<ul style="list-style-type: none"> -Conclusi i lavori di riqualificazione degli spazi di S. Paolo e Chiesanuova (progetto Piu urban places) -conclusi i lavori via Giordano e via Pistoiese
6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -progetto di prossimità nel Macrolotto 0 insieme ad Alia per contrastare l'abbandono di rifiuti e sensibilizzare la popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -controlli sul decoro urbano -Regolamento videosorveglianza 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza PM nelle frazioni e nel centro storico -estensione sistema di videosorveglianza cittadino con 8 nuovi punti -attivazione controlli specifici sui comportamenti cause di incidenti

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
				stradali
7.1	<i>Tutelare il territorio</i>		iniziati i lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio	-conclusi i lavori di risagomatura dei 4 fossi
7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	-conclusi lavori riqualificazione giardini via Torelli e giardini scuola infanzia lolo -pompa idrovora Cascine di Tavola -lavori in corso recupero Villa Fiorelli	-conclusi lavori di riqualificazione giardini via Visiana e campo basket giardini scuole Rodari -inaugurato nuovo chiosco presso Giocagiò -conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola -bonificata la pineta Marittima di Galceti -affidamento gestione manutentiva dei 4 playground cittadini -realizzati interventi di riqualificazione stradale per € 2.300.000 -ampliati 3 cimiteri comunali	-conclusi i lavori di riqualificazione dei giardini di via MARx, via Valori, via Capponi, via Hermada, via Tirso-riqualificati i giardini scolastici del nido via Paisiello e scuola infanzia Da Quarata -approvato progetto esecutivo riqualificazione Giocagiò 1 -approvato progetto definitivo Giocagiò 2 via Turchia -conclusi interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche presso vari cimiteri
7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	-analisi consistenza rete tombata	-estensione rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino	
7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	-Concesse riduzioni tariffarie e prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -approvato studio di fattibilità per nuovo centro di raccolta comunale in via Paronese -affidati servizi di derattizzazione, disinfestazione e rimozione rifiuti su aree private	-prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -attività di sensibilizzazione su raccolta differenziata nel Macrolotto 0 -approvato progetto definitivo centro di raccolta via Paronese e individuazione area per un ulteriore centro	-approvato progetto di fattibilità e variante urbanistica per centro di raccolta via Marconi -inizio lavori centro raccolta via Paronese
7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria	-Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria -formazione personale volontario associazioni di protezione civile	-Cessazione stato di emergenza dal 01/04/2023 - formazione personale volontario associazioni di protezione civile

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	-Durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani -lavori per la realizzazione di aree sgambatura cani	-accettata eredità di una cittadina vincolata alla realizzazione di un nuovo canile -conclusi lavori 3 aree sgambatura (Visiana, Wangen, Bensa)	-nuovo affidamento del canile, del servizio S.O.S animali e dell'oasi fenile la Bogaia -conclusi lavori area sgambatura via Curtatone
8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	-partecipazione al progetto CREIAMO PA per calcolare l'impronta di carbonio -attività propedeutiche di ricerca alla definizione del nuovo Paesc	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: rilevazione emissioni CO2 e vulnerabilità climatica sul tema acqua -Progetto Creiamo PA: è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: indagini di vulnerabilità climatica del territorio e valutazione degli assorbimenti di carbonio -conclusione bonifica piazzale Palasaccio -realizzato nuovo fontanello a Mezzana
8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	-riqualificazione energetica asilo nido il Borgo e Astrolabio, scuola Manzi	-riqualificazione energetica scuole Rodari, Fermi succ, le Girandole e Corridoni	-conclusi i lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Benassai
8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	-sottoscritte due convenzioni con università per definire strategie di forestazione urbana -progettazione interventi Urban Jungle su Mercato Metropolitan ed alloggi ERP via Turchia	-consegnati dall'università i documenti della prima fase dello studio; -finanziamento da parte della Regione del progetto Verde Urbano Carbon Neutral, per la forestazione di aree prospicienti la Declassata. E' stato approvato il progetto del primo lotto -iniziati interventi Urban Jungle sul Mercato Metropolitan	-conclusi i tre lotti di lavori del Progetto verde Carbon Neutral che hanno interessato aree prospicienti declassata -in corso lavori Urban Jungle Macrolotto Zero e alloggi popolari via Turchia -installate 28 centraline CNR per misurare gli effetti della forestazione sull'aria -Piattaforma Prato Forest city per acquistare un albero
9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	-corsi di educazione stradale nelle scuole -riorganizzate le modalità di comunicazione informazioni sulla viabilità ai cittadini -realizzazione rotatoria via Roma e altri interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo anche sulla segnaletica	-corsi di educazione stradale nelle scuole sul tema alcool e responsabilità -realizzati interventi per la moderazione della velocità e la riduzione dell'incidentalità -realizzati lavori attraversamenti semaforizzati per non vedenti	-corsi di educazione stradale nelle scuole -controlli specifici sull'autotrasporto -realizzati interventi per la sicurezza stradale e la riduzione dell'incidentalità

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -realizzato collegamento viario Maliseti- via L.Rossi -realizzazione seconda complanare declassata al Soccorso -conclusi lavori rotatoria via Castruccio- via Manzoni 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori rotatoria di Capezzana -in corso lavori collegamento via Manzoni, via bigoli, via Verzoni 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo accordo di programma II tangenziale -Realizzato collegamento stradale via Manzoni-via Garduna -rilevamento degli stalli di sosta parcheggi a pagamento e definizione indice di rotazione
9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio 	<ul style="list-style-type: none"> -predisposizione Biciplan, Piano della mobilità elettrica e Piano della logistica -redatti piani di spostamento Casa Scuola -iniziati interventi per migliorare la mobilità del polo scolastico di via Galcianese -concluso 1° lotto lavori ciclabile Prato-Firenze, che collega il macrolotto 2 con Campi Bisenzio -conclusi lavori ciclabile via Montalese -progettato nuovo collegamento TPL Casale-ospedale 	<ul style="list-style-type: none"> -iniziati lavori lotto 2 Ciclovía Firenze-Prato -approvati 9 progetti definitivi/ esecutivi ciclabili bando Credito Sportivo -approvati progetti esecutivi piste ciclabili finanziate PNRR -conclusi lavori lotto 1 mobilità polo scolastico Galcianese -approvato Biciplan -gara per campagna di rilevazione della qualità del servizio TPL e ferroviario
10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione procedure e uffici in vista del passaggio alla gestione diretta della Sds 	<ul style="list-style-type: none"> -distacco presso la società della salute del personale con qualifica di assistente sociale -entrata in vigore nuovo regolamento Società della Salute per l'accesso ai servizi sociali 	<ul style="list-style-type: none"> -passaggio alla gestione diretta della Società della salute
10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	<ul style="list-style-type: none"> Attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria: -buoni spesa -spesa a casa e farmaci -bando contributi affitto Covid -riorganizzazione servizio assistenza domiciliare 	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale -riorganizzazione servizi minori e famiglie -presentato nuovo progetto Social Board -ultimati appartamenti per emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> -attivato nuovo Social Board -attività progetti utili alla collettività per il reddito di cittadinanza -avviato centro diurno e centro servizi leggere per persone senza fissa dimora -approvato regolamento per l'emergenza alloggiativa -nuova convenzione servizio trasporto

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
			<p>alloggiativa a Reggiana</p> <ul style="list-style-type: none"> -pubblicato elenco strutture socio assistenziali accreditate 	<p>sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> -inserimento di anziani autosufficienti nei gruppi di appartamento -attivati progetti di supporto alla genitorialità per mantenere i minori in famiglia -incremento dell'affido al posto delle strutture per minori -finanziati dal PNRR progetti sulla genitorialità, supporto alla disabilità e realizzazione di un centro servizi per la marginalità
11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	In corso lavori per la realizzazione di 72 alloggi da destinare a canone calmierato (Gello living)	Ultimati 72 alloggi del progetto Gello living, da destinare a canone calmierato	
11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	<ul style="list-style-type: none"> -acquistati 7 alloggi in via Compagnetto da destinare all'edilizia residenziale pubblica -pubblicato bando per l'assegnazione delle case popolari -conclusi i lavori della Casa di accoglienza la Ginestra per accogliere donne e bambini in emergenza abitativa 	<ul style="list-style-type: none"> -in corso istruttoria domande case popolari -apertura struttura Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli 	<ul style="list-style-type: none"> -approvata graduatoria definitiva per l'assegnazione case popolari -assegnati 10 alloggi ERP -controlli sugli assegnatari di case popolari, recuperando 3 alloggi da riassegnare per decadenza requisiti
12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzato sportello migranti con modalità a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -realizzazione specifiche campagne di comunicazione, con riferimento anche al Covid -accoglienza titolari di protezione internazionale -progetto antitratta 	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione sportello immigrazione sia in presenza, sia a distanza -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -organizzazione corsi di lingua e di formazione specifici -realizzazione specifiche campagne di comunicazione -accoglienza titolari di protezione internazionale -rinnovo adesione al progetto antitratta 	<ul style="list-style-type: none"> -progetti di integrazione scolastica e linguistica degli alunni non italofofoni -progetti di integrazione stranieri -progetti di accoglienza dei richiedenti asilo -partecipazione al progetto antitratta per lo sfruttamento lavorativo -approvato il Regolamento per la permanenza delle famiglie Rom e Sinti nelle aree attrezzate -approvato piano per il superamento

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
			-Nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta da parte di rom e sinti	delle aree
12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	-censimento barriere architettoniche su strade e marciapiedi e presentazione al finanziamento progetto per l'eliminazione	-adesione alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) -protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazioni, con conseguente apertura dello sportello -approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi -iniziati lavori per eliminazione barriere architettoniche su strade e marciapiedi	-eliminate barriere architettoniche cimiteri -partecipazione al progetto Sport inclusivo per l'acquisto di attrezzatura sportiva specifica per disabili
13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	-organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria -didattica di vicinanza attraverso apposito sito internet -riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per il rispetto delle nuove norme igieniche -sostegno economico ai nidi privati -sostegno economico alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito a quarantene	-sviluppo sito internet per la didattica di vicinanza, come strumento di sostegno alla genitorialità -attivazione servizi integrativi estivi -piena operatività centri 0-6	-apertura nuovo Nido Fontanelle -approvata nuova convenzione triennale con i nidi privati convenzionati -nuova gestione servizi integrativi per l'infanzia a.e 2022/2023 -nuova gestione trasporto scolastico -gara per riorganizzazione Pre-post scuola -modificato regolamento servizi educativi per l'infanzia
13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	-realizzati interventi di adeguamento degli spazi per la riapertura in sicurezza delle scuole -conclusi i lavori alla scuola Santa Gonda e di adeguamento sismico scuola Zipoli	-manutenzione straordinaria nidi Fontanelle e Girandole -conclusa scuola infanzia Pacciana -indagini sismiche sui solai di 43 scuole	-conclusi lavori scuola primaria Casale -concluso ampliamento scuola di Cafaggio -concluso spazio polivalente scuola S.Gonda -conclusi i lavori di adeguamento sismico di 15 scuole -finanziati progetti PNRR scuola Cironi e

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
				riqualificazione giardini scolastici
13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzate in modalità a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -sportello di mediazione linguistico culturale -formazione docenti -contributi straordinari per centri estivi -attivazione controlli sull' evasione scolastica nella scuola dell'obbligo 	<ul style="list-style-type: none"> -riattivazione in presenza delle attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -contributi centri estivi 2021 	<ul style="list-style-type: none"> -attivazione servizio di supporto ai genitori stranieri per le iscrizioni scolastiche -laboratori di facilitazione linguistica in classe -sportelli di mediazione linguistico culturale -corsi estivi di lingua italiana per alunni primaria
13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -potenziati servizi digitali aumentando offerta film ed e-book - potenziamento canali social - riorganizzazione prestito, gestione utenza e accesso sale studio -riorganizzazione sale e raccolte 	<ul style="list-style-type: none"> -promuovere la lettura on line attraverso potenziamento MLOL -riorganizzazione sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi -approvato regolamento biblioteche comunali -organizzazione attività didattiche e di promozione della lettura 	<ul style="list-style-type: none"> -ricominciate aperture domenicali Lazzerini -promozione spazi e servizi biblioteca Lazzerini -progetto lettura delle biblioteche decentrate con le scuole del territorio -adesione alla rete Nati per leggere per fascia 0-6 anni -promozione lettura adolescenti -adozione Patto intercomunale per la lettura -ottenuta qualifica “Città che legge” 2022/2023
14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori Campo di calcio S.Giusto e Galleni -conclusi lavori di manutenzione straordinaria piscina di Mezzana -adeguate le convenzioni di gestione degli impianti per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo la fine del lock down 	<ul style="list-style-type: none"> -Rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce -Realizzati due campi in sintetico Campo sportivo Rossi a Coiano -riattivato stadio per campionato dilettantistico -manutenzione straordinaria piscina Galilei 	<ul style="list-style-type: none"> -finanziati dal PNRR e approvati progetti di fattibilità: riqualificazione impianti piscina Galilei, campo calcio Paperino Il lotto, riqualificazione vari campi calcio e rugby, antincendio palestra via Roma, nuova piscina olimpionica

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Attività promozionale ridotta e quasi sospesa in seguito all'emergenza sanitaria.	Sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria	-siglato nuovo protocollo d'intesa con Trofeo città di Prato -organizzazione attività motoria anziani -sostegno e patrocinio alle associazioni del territorio per organizzazione eventi sportivi
15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	Nessuna azione realizzata	attivazione Consiglio Comunale dei ragazzi e approvazione Regolamento	-3 sedute consiglio comunale dei ragazzi
15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	Nessuna azione realizzata	-mappatura dei servizi rivolti all'infanzia erogati dall'amministrazione	-istituzione garante dei diritti dell'infanzia
16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	-attivazione smart working -approvato regolamento per la disciplina dello Smart working -fornitura DPI ai dipendenti -approvato documento di valutazione del rischio in emergenza sanitaria	-modifica Regolamento aziendale sugli orari di lavoro -modifica disciplina modalità di assunzione all'impiego -approvazione Pola -rinnovo CUG -sottoscritto nuovo contratto decentrato dirigenti -modificata la struttura organizzativa -modificato sistema di misurazione e valutazione -adeguato documento di valutazione del rischio	-Modificato regolamento del lavoro agile -Modificato sistema di misurazione e valutazione della performance -approvato Piano della formazione -attivati corsi di formazione sulle competenze digitali, mobbing e discriminazione -è stato predisposto il progetto per l'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico
16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	-revisione contratti di servizio (pulizie, assicurazioni) -riorganizzazione procedure e processi di lavoro	-gestione fondo Covid per sostenere le maggiori spese e le minori entrate dovute all'emergenza sanitaria -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -attivazione monitoraggio puntuale sui residui delle opere pubbliche -riorganizzazione e informatizzazione procedure	-attivazione coordinamento e monitoraggio progetti PNRR -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -modifica regolamento contributi e patrocini

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
16.3	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	-adeguamento Piano anticorruzione e trasparenza alle nuove disposizioni dell'ANAC -verifiche sulle attività extraistituzionali dei dipendenti	-nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -Piano anticorruzione 2021-2023 con nuove indicazioni ANAC -Codice di comportamento	-Piano auditing 2022 -Piano anticorruzione 2022-2024 -attivazione piattaforma per whistleblowing -costituita rete dei referenti per la privacy -aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni
16.4	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Nessuna azione realizzata	-analisi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare -apertura bagno pubblico in centro in via dei Manassei	-Ricollocato archivio storico di S.Caterina -attivazione procedura per richieste di acquisizione, locazioni, concessioni di immobili da privati -attivazione procedura per richieste manutenzioni straordinaria agli impianti sportivi -gara per gestione e manutenzione impianti antincendio
17.01	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	-digitalizzazione delibere del Consiglio precedenti al 1990 -revisionato portale procedimenti attività produttive	-campagna comunicativa sull'accesso ai servizi demografici digitali -nuove modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora alla Casa Comunale	-attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP -sportello rilascio SPID presso Urp e biblioteca Lazzerini -attivazione nuova procedura per richiesta informazioni servizi demografici -nuovo portale sui dati statistici Prato Conta
17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	-riorganizzazione servizi di sportello (anagrafe, Urp, Suap) in situazione emergenziale implementando i servizi on line -effettuate rilevazioni di customer -analisi statistiche sul contesto socio economico (redditi, fecondità, demografia)	-riorganizzata modalità di accesso ai servizi demografici -effettuate rilevazioni di customer su 13 servizi -analisi statistiche sul contesto socio economico (esercizi commerciali, demografia)	-Effettuate rilevazioni di customer su 11 servizi

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022
18.01	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> -informazioni tempestive e multicanale per Covid -rimodulazione modalità di accesso ai servizi attraverso canali non fisici -sedute consiglio comunale on line 	<ul style="list-style-type: none"> -rinnovato sito Lazzerini e Polo regionale di documentazione interculturale -revisione regolamento della partecipazione -ampliati servizi Urp attraverso convenzioni con altri enti -promozione accesso ai servizi in modalità web -campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione -promozione sito "Citta di Prato" -promozione sui social -attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP

1.3 I principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030

Nel secondo semestre 2021 il Comune di Prato ha partecipato al progetto “Comuni Sostenibili”, promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili, che ha lo scopo di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 da parte dei comuni. Attraverso la compilazione di un set di 101 indicatori è stato possibile monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. L’attenzione alle tematiche di sostenibilità la ritroviamo già nel Dup 2021/2023, dove accanto agli obiettivi strategici ed operativi sono stati riportati anche gli obiettivi di riferimento dell’Agenda 2030. Dopo aver lavorato al progetto dei Comuni sostenibili, la classificazione che era stata fatta inizialmente è stata un po’ rivista. Qui di seguito i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo vengono riportati con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030, seguendo la classificazione del progetto dei Comuni sostenibili.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
1	Povertà	11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	In corso lavori per la realizzazione di 72 alloggi da destinare a canone calmierato (Gello living)	Ultimati 72 alloggi del progetto Gello living, da destinare a canone calmierato	
1	Povertà	11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	-acquistati 7 alloggi in via Compagnetto da destinare all'edilizia residenziale pubblica -pubblicato bando per l'assegnazione delle case popolari -conclusi i lavori della Casa di accoglienza la Ginestra per accogliere donne e bambini in emergenza abitativa	-in corso istruttoria domande case popolari -apertura struttura Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli	-approvata graduatoria definitiva per l’assegnazione case popolari -assegnati 10 alloggi ERP -controlli sugli assegnatari di case popolari, recuperando 3 alloggi da riassegnare per decadenza requisiti
3	Salute e benessere	14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Attività promozionale ridotta e quasi sospesa in seguito all'emergenza sanitaria.	Sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria	-siglato nuovo protocollo d’intesa con Trofeo città di Prato -organizzazione attività motoria anziani

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
						-sostegno e patrocinio alle associazioni del territorio per organizzazione eventi sportivi
3	Salute e benessere	7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria	-Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria -formazione personale volontario associazioni di protezione civile	-Cessazione stato di emergenza dal 01/04/2023 - formazione personale volontario associazioni di protezione civile
3	Salute e benessere	9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	-corsi di educazione stradale nelle scuole -riorganizzate le modalità di comunicazione informazioni sulla viabilità ai cittadini -realizzazione rotatoria via Roma e altri interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo anche sulla segnaletica	-corsi di educazione stradale nelle scuole sul tema alcool e responsabilità -realizzati interventi per la moderazione della velocità e la riduzione dell'incidentalità -realizzati lavori attraversamenti semaforizzati per non vedenti	-corsi di educazione stradale nelle scuole -controlli specifici sull'autotrasporto -realizzati interventi per la sicurezza stradale e la riduzione dell'incidentalità
3	Salute e benessere	10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	-riorganizzazione procedure e uffici in vista del passaggio alla gestione diretta della Sds	-distacco presso la società della salute del personale con qualifica di assistente sociale -entrata in vigore nuovo regolamento Società della salute per l'accesso ai servizi sociali	-passaggio alla gestione diretta della Società della salute
4	Istruzione	13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	-organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria -didattica di vicinanza attraverso apposito sito	-sviluppo sito internet per la didattica di vicinanza, come strumento di sostegno alla genitorialità -attivazione servizi integrativi estivi	-apertura nuovo Nido Fontanelle -approvata nuova convenzione triennale con i nidi privati convenzionati -nuova gestione servizi

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
				internet -riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per il rispetto delle nuove norme igieniche -sostegno economico ai nidi privati -sostegno economico alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito a quarantene	-piena operatività centri 0-6	integrativi per l'infanzia a.e 2022/2023 -nuova gestione trasporto scolastico -gara per riorganizzazione Pre-post scuola -modificato regolamento servizi educativi per l'infanzia
4 Istruzione		13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	-realizzati interventi di adeguamento degli spazi per la riapertura in sicurezza delle scuole -conclusi i lavori alla scuola Santa Gonda e di adeguamento sismico scuola Zipoli	-manutenzione straordinaria nidi Fontanelle e Girandole -conclusa scuola infanzia Pacciana -indagini sismiche sui solai di 43 scuole	-conclusi lavori scuola primaria Casale -concluso ampliamento scuola di Cafaggio -concluso spazio polivalente scuola S.Gonda -conclusi i lavori di adeguamento sismico di 15 scuole -finanziati progetti PNRR scuola Cironi e riqualificazione giardini scolastici
4 Istruzione		13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	-riorganizzate in modalità a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -sportello di mediazione linguistico culturale -formazione docenti -contributi straordinari per centri estivi -attivazione controlli sull'	-riattivazione in presenza delle attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -contributi centri estivi 2021	-attivazione servizio di supporto ai genitori stranieri per le iscrizioni scolastiche -laboratori di facilitazione linguistica in classe -sportelli di mediazione linguistico culturale -corsi estivi di lingua italiana per alunni primaria

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
				evasione scolastica nella scuola dell'obbligo		
5	Equità di genere	12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	-censimento barriere architettoniche su strade e marciapiedi e presentazione al finanziamento progetto per l'eliminazione	-adesione alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) -protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazioni, con conseguente apertura dello sportello -approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi -iniziati lavori per eliminazione barriere architettoniche su strade e marciapiedi	-eliminate barriere architettoniche cimiteri -partecipazione al progetto Sport inclusivo per l'acquisto di attrezzatura sportiva specifica per disabili
7	Energia pulita e accessibile	8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	-riqualificazione energetica asilo nido il Borgo e Astrolabio, scuola Manzi	-riqualificazione energetica scuole Rodari, Fermi succ, le Girandole e Corridoni	-conclusi i lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Benassai
7	Energia pulita e accessibile	8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	-partecipazione al progetto CREIAMO PA per calcolare l'impronta di carbonio -attività propedeutiche di ricerca alla definizione del nuovo Paesc	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: rilevazione emissioni CO2 e vulnerabilità climatica sul tema acqua -Progetto Creiamo PA: è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: indagini di vulnerabilità climatica del territorio e valutazione degli assorbimenti di carbonio -conclusione bonifica piazzale Palasaccio -realizzato nuovo fontanello a Mezzana

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Partecipazione al protocollo Sismico con Alia e Sori per il contrasto all'evasione tributaria 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Rinnovato il Protocollo Sismico per il contrasto all'evasione tributaria fino al 2024 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese -attivazione controlli sull'imposta di soggiorno -controlli sulla sicurezza e il rispetto della normativa dei prodotti messi in vendita in particolare cosmetici e abbigliamento
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Osservatorio sul lavoro e sulle esigenze formative: individuati ambiti di formazione professionale sui quali intervenire 	<ul style="list-style-type: none"> -Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze: monitoraggio costante del mercato del lavoro e fabbisogni formativi delle imprese -Istituzione "Premi di laurea città di Prato" in collaborazione con il PIN 	<ul style="list-style-type: none"> -Accordo con il Pin per l'attivazione dell'osservatorio permanente sulla domanda e l'offerta di lavoro e di formazione -Accordo con il Pin per l'attivazione di un percorso di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	<ul style="list-style-type: none"> -iniziato progetto Smarty Smes per la diffusione nelle p/m imprese di nuove tecnologie e modelli di business innovativi; -adesione al progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda -presentato progetto PRISMA Casa tecnologie emergenti 	<ul style="list-style-type: none"> -individuate le sedi del progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) presso il Pin , l'ex CREAM e la Medialibrary -bando per progetti di R&S nelle imprese del settore tessile e moda -bando per start up con alto potenziale di innovazione tecnologica che parteciperanno al programma di accelerazione -conclusione progetto Native 	<ul style="list-style-type: none"> -Inaugurata sede PRISMA in via Galcianese -bando start up con alto potenziale di innovazione da inserire nel programma di accelerazione -elaborato il Piano di azione del progetto Smarty Smes per la diffusione nelle PMI di nuove tecnologie e modelli di business alternativi -iniziato progetto Creative per promuovere i rapporti fra PMI del Mediterraneo nei settori manifatturieri -portato avanti il progetto EYE nelle scuole superiori per la promozione della cultura imprenditoriale e la nascita di start up.
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione - selezionati due progetti di valorizzazione di start up 	<ul style="list-style-type: none"> -Ristori alle imprese e agli operatori commerciali ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza Covid 	<ul style="list-style-type: none"> -sottoscritto protocollo d'intesa on le associazioni per la valorizzazione delle imprese della filiera corta agro-alimentare -sottoscritto il protocollo d'intesa con le parti sociali relativo al bando e alla selezione delle imprese beneficiarie degli aiuti al distretto tessile

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale -Strumenti di comunicazione per l'attività politica on-line 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo software centrale operativa Polizia Municipale -Rinnovo postazioni di lavoro -Dismissione server obsoleti e passaggio verso nuove piattaforme 	<ul style="list-style-type: none"> -Migrazione dei software applicativi verso componenti tecnologici più moderni -Installati telefoni VOIP nelle scuole -Completamento diffusione banda larga nelle scuole -Installazione nuovi punti wi-fi in città
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estensione firma digitale - Innalzato il livello di sicurezza dei sistemi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> -Ampliata rete wifi comunale -Rivista infrastruttura informatica scuole e dotazione telefoni voip -Sottoscritto nuovo contratto in house per hotline e manutenzione postazioni informatiche 	<ul style="list-style-type: none"> -Rinnovo piattaforme -Formazione ai dipendenti in ambito di sicurezza informatica e phishing
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line per i cittadini -Ampliati servizi presenti su PagoPa 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line ai cittadini -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo di nuovi servizi on line -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione Agenda Digitale 2022-2024 -Attivata Control Room

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
10	Ridurre le disuguaglianze	10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	<p>Attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> -buoni spesa -spesa a casa e farmaci -bando contributi affitto Covid -riorganizzazione servizio assistenza domiciliare 	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale -riorganizzazione servizi minori e famiglie -presentato nuovo progetto Social Board -ultimati appartamenti per emergenza alloggiativa a Reggiana -pubblicato elenco strutture socio assistenziali accreditate 	<ul style="list-style-type: none"> -attivato nuovo Social Board -attività progetti utili alla collettività per il reddito di cittadinanza -avviato centro diurno e centro servizi leggere per persone senza fissa dimora -approvato regolamento per l'emergenza alloggiativa -nuova convenzione servizio trasporto sociale -inserimento di anziani autosufficienti nei gruppi di appartamento -attivati progetti di supporto alla genitorialità per mantenere i minori in famiglia -incremento dell'affido al posto delle strutture per minori -finanziati dal PNRR progetti sulla genitorialità, supporto alla disabilità e realizzazione di un centro servizi per la marginalità
10	Ridurre le disuguaglianze	12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzato sportello migranti con modalità a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo 	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione sportello immigrazione sia in presenza, sia a distanza -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -organizzazione corsi di lingua 	<ul style="list-style-type: none"> -progetti di integrazione scolastica e linguistica degli alunni non italofofoni -progetti di integrazione stranieri -progetti di accoglienza dei richiedenti asilo

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
				-realizzazione specifiche campagne di comunicazione, con riferimento anche al Covid -accoglienza titolari di protezione internazionale -progetto antitratta	e di formazione specifici -realizzaione specifich campagne di comunicazione -accoglienza titolari di protezione internazionale -rinnovo adesione al progetto antitratta -Nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta da parte di rom e sinti	-partecipazione al progetto antitratta per lo sfruttamento lavorativo -approvato il Regolamento per la permanenza delle famiglie Rom e Sinti nelle aree attrezzate -approvato piano per il superamento delle aree
10	Ridurre le disuguaglianze	15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	Nessuna azione realizzata	-mappatura dei servizi rivolti all'infanzia erogati dall'amministrazione	-istituzione garante dei diritti dell'infanzia
11	Città e comuni sostenibili	2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	-Modifica regolamento occupazione suolo pubblico per favorire la ripartenza delle attività commerciali -Processo partecipativo centro storico -Premiati cinque progetti presentati da associazioni e consorzi per la rigenerazione del centro storico	-Modifica regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività -Processo partecipativo centro storico -Progetto di riqualificazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio	-Modifica regolamento dei dehor e approvazione abaco degli elementi di arredo ammessi -Processo partecipativo e di co-progettazione in centro storico -Organizzazione di eventi culturali e commerciali di animazione del centro -Riqualificazione edifici pubblici del centro storico
11	Città e comuni sostenibili	2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	-Inizio lavori per la realizzazione di uno spazio polivalente e di una biblioteca nel quartiere di Casale, presso la scuola	-Realizzato immobile in via Giordano da adibire a mercato -Adeguamento immobili e riorganizzazione centri civici	-Riapertura 4 centri civici -Conclusione lavori biblioteca di Casale

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
11	Città e comuni sostenibili	3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	-Garantiti corsi a distanza della scuola di musica in seguito al covid -approvata nuova convenzione del sistema museale Prato Musei e Regolamento sistema museale	-Convenzione con il Museo del Tessuto per comunicazione e promozione congiunta Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto -Supporto Politeama Spa nella trasformazione da associazione a fondazione	-Rete Prato Musei: organizzazione iniziative e laboratori didattici per le scuole -Concessione spazi Manifatture digitali del cinema -Collaborazione ocn Fondazione Museo Pecci per organizzazione "Centro Pecci Summer live"
11	Città e comuni sostenibili	3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	-Prorogata mostra "Dopo Caravaggio" al Palazzo Pretorio -organizzazione iniziative musicali e teatrali all'aperto nel periodo di riapertura estiva	-Prato estate -Officina Jungle -Settembre Prato è spettacolo -Prato Festival -Organizzazione mostra Hi Woman Palazzo Pretorio, mostra Soresen e mostra Bartolini -Inizitive 700 anni morte di Dante	-Mostre Palazzo Pretorio: Hi woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, gli amici pittori Cesare Guasti -Visite Palazzo Pretorio per pubblici speciali (es. autistici) -Visite guidate "Tesori della Campolmi" per la valorizzazione del Polo Culturale Campolmi -Rassegne culturali Prato estate, Settembre Prato e Prato Festival -Offerta culturale rivolta i giovani: Officina OG, Officina On stage, Officina Teen
11	Città e comuni sostenibili	3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	-Conclusi lavori ex teatro S.Caterina -digitalizzaione patrimonio AFT	-Conclusi lavori corte interna S.Caterina e mura urbane via S.Caterina -Riapertura al pubblico del Cassero con tre mostre	-Valorizzazione Cassero e Castello con iniziative, mostre e visite guidate -Valorizzazione percorso espositivo Galleria Comunale -Restauro e allestimento delle

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
						opere presenti nei depositi del Palazzo Pretorio -Accordo con Coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali per valorizzare la raccolta di armi presenti nel Palazzo Pretorio -Nuovo sito AFT -Conclusione lavori facciata scuola di musica e accessibilità laboratorio d'arte Leonetto Tintori
11	Città e comuni sostenibili	3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	-Sviluppo e promozione Cammini: convenzione attuativa Via della lana e delle seta; convenzione via Medicea; convenzione cammino di San Jacopo -Organizzazione Eat Prato con nuovi itinerari -Presentato progetti "Dal fascino della fabbrica al museo di famiglia" per visitare le fabbriche storiche	-Promozione cammini, ampliando l'offerta con laboratori, eventi, gastronomia -Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili -Organizzati eventi legati al progetto "Dal fascino della fabbrica al Museo di famiglia" -Organizzazione Eat Prato Walking	-Inaugurato cammino "La via delle Rocche" -Organizzazione Eat Prato e iniziative di trekking urbano -Turismo industriale: creata la rete "Amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
11	Città e comuni sostenibili	5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavori in corso progetto Priuss per riqualificazioen area lungo il Bisenzio -conclusi i lavori del Mercato Metropolitano e del Playground del progetto PIU -presentato un piano attuativo relativo alla fabbrica a confine con Campolmi -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 -approvazione "Agenda urbana 2050: indirizzi e strategie per il nuovo piano strutturale" 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto PRIUSS: conclusi lavori area lungo il Bisenzio e apertura piazzole attrezzate -adozione variante al Piano operativo -avviato procedimento del nuovo piano strutturale -presentati 3 piani attuativi per riqualificazione aree attraverso perequazione -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 	<ul style="list-style-type: none"> -Piano strutturale: predisposizione materiale per la conferenza di copianificazione indetta dalla Regione
11	Città e comuni sostenibili	5.2	<i>Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> -approvazione progetti di riqualificazione degli spazi di San Paolo e via Wangen (PIU2) 	<ul style="list-style-type: none"> -aggiudicazione lavori di riqualificazione spazi San Paolo -inizio lavori mobilità sostenibile via Giordano e via Pistoiese -conclusi lavori P.za Milton Nesi a Coiano -regolamento street art 	<ul style="list-style-type: none"> -Conclusi i lavori di riqualificazione degli spazi di S. Paolo e Chiesanuova (progetto Piu urban places) -conclusi i lavori via Giordano e via Pistoiese

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
11	Città e comuni sostenibili	7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori riqualificazione giardini via Torelli e giardini scuola infanzia lolo -pompa idrovora Cascine di Tavola -lavori in corso recupero Villa Fiorelli 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori di riqualificazione giardini via Visiana e campo basket giardini scuole Rodari -inaugurato nuovo chiosco presso Giocagiò -conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola -bonificata la pineta Marittima di Galceti -affidamento gestione manutentiva dei 4 playground cittadini -realizzati interventi di riqualificazione stradale per € 2.300.000 -ampliati 3 cimiteri comunali 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi i lavori di riqualificazione dei giardini di via Marx, via Valori, via Capponi, via Hermada, via Tirso-riqualificati i giardini scolastici del nido via Paisiello e scuola infanzia Da Quarata -approvato progetto esecutivo riqualificazione Giocagiò 1 -approvato progetto definitivo Giocagiò 2 via Turchia -conclusi interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche presso vari cimiteri
11	Città e comuni sostenibili	7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	-analisi consistenza rete tombata	-estensione rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino	
11	Città e comuni sostenibili	9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	-riorganizzazione trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio	<ul style="list-style-type: none"> -predisposizione Biciplan, Piano della mobilità elettrica e Piano della logistica -redatti piani di spostamento Casa Scuola -iniziati interventi per migliorare la mobilità del polo scolastico di via Galcianese -concluso 1° lotto lavori ciclabile Prato-Firenze, che collega il macrolotto 2 con 	<ul style="list-style-type: none"> -iniziati lavori lotto 2 Ciclovía Firenze-Prato -approvati 9 progetti definitivi/ esecutivi ciclabili bando Credito Sportivo -approvati progetti esecutivi piste ciclabili finanziate PNRR -conclusi lavori lotto 1 mobilità polo scolastico Galcianese -approvato Biciplan -gara per campagna di

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
					Campi Bisenzio -conclusi lavori ciclabile via Montalese -progettato nuovo collegamento TPL Casale-ospedale	rilevazione della qualità del servizio TPL e ferroviario
11	Città e comuni sostenibili	13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	-potenziati servizi digitali aumentando offerta film ed e-book - potenziamento canali social - riorganizzazione prestito, gestione utenza e accesso sale studio -riorganizzazione sale e raccolte	-promuovere la lettura on line attraverso potenziamento MLOL -riorganizzazione sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi -approvato regolamento biblioteche comunali -organizzazione attività didattiche e di promozione della lettura	-ricominciate aperture domenicali Lazzerini -promozione spazi e servizi biblio0teca Lazzerini -progetto lettura delle biblioteche decentrate con le scuole del territorio -adesione alla rete Nati per leggere per fascia 0-6 anni -promozione lettura adolescenti -adozione Patto intercomunale per la lettura -ottenuta qualifica “Città che legge” 2022/2023
11	Città e comuni sostenibili	14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	-conclusi lavori Campo di calcio S.Giusto e Galleni -conclusi lavori di manutenzione straordinari apiscina di Mezzana -adeguate le convenzioni di gestione degli impianti per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo la fine del lock down	-Rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce -Realizzati due campi in sintetico Campo sportivo Rossi a Coiano -riattivato stadio per campionato dilettantistico -manutenzione straordinaria piscina Galilei	finanziati dal PNRR e approvati progetti di fattibilità: riqualificazione impianti piscina Galilei, campo calcio Paperino Il lotto, riqualificazione vari campi calcio e rugby, antincendio palestra via Roma, nuova piscina olimpionica

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
11	Città e comuni sostenibili	9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -realizzato collegamento viario Maliseti- via L.Rossi -realizzazione seconda complanare declassata al Soccorso -conclusi lavori rotatoria via Castruccio- via Manzoni 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori rotatoria di Capezzana -in corso lavori collegamento via Manzoni, via bigoli, via Verzoni 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo accordo di programma Il tangenziale -Realizzato collegamento stradale via Manzoni-via Garduna -rilevamento degli stalli di sosta parcheggi a pagamento e definizione indice di rotazione
12	Consumo e produzione responsabili	1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Gestione progetto Innomed-up per lo sviluppo di imprese creative nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile -Organizzazione Recò Festival Economia circolare in modalità a distanza -Adesione ai progetti Urge per lo smaltimento e il riutilizzo materiali di risulta provenienti dalle demolizioni -Inizio progetto Prato Circular City per creare un modello di governo cittadino dell'economia circolare 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto Innomed- up: individuati soggetti idonei per sviluppare percorsi di innovazione orientati alla sostenibilità -progetto URGE: elaborato un piano di azione integrato per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sul nostro territorio -Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City attraverso l'approvazione del documento Next Generation Prato, che riporta gli interventi da realizzare per lo sviluppo locale sostenibile 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto Innomed-up: realizzata una guida per applicare i principi dell'economia circolare alle PMI delle industrie culturali e creative -progetto URGE: presentato l'Integrated Action Plan per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sulla circolarità nei grandi interventi infrastrutturali -sottoscritto protocollo d'intesa per la realizzazione dell' Hub del riciclo tessile, finanziato da risorse PNRR

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
12	Consumo e produzione responsabili	7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Concesse riduzioni tariffarie e prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -approvato studio di fattibilità per nuovo centro di raccolta comunale in via Paronese -affidati servizi di derattizzazione, disinfestazione e rimozione rifiuti su aree private 	<ul style="list-style-type: none"> -prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -attività di sensibilizzazione su raccolta differenziata nel Macrolotto 0 -approvato progetto definitivo centro di raccolta via Paronese e individuazione area per un ulteriore centro 	<ul style="list-style-type: none"> -approvato progetto di fattibilità e variante urbanistica per centro di raccolta via Marconi -inizio lavori centro raccolta via Paronese
13	Agire per il clima	7.1	<i>Tutelare il territorio</i>		iniziati i lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio	conclusi i lavori di risagomatura dei 4 fossi
15	La vita sulla terra	8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	<ul style="list-style-type: none"> -sottoscritte due convenzioni con università per definire strategie di forestazione urbana -progettazione interventi Urban Jungle su Mercato Metropolitan ed alloggi ERP via Turchia 	<ul style="list-style-type: none"> -consegnati dall'università i documenti della prima fase d'Uello studio; -finanziamento da parte della Regione del progetto Verde Urbano Carbon Neutral, per la forestazione di aree prospicienti la Declassata. E' stato approvato il progetto del primo lotto -iniziati interventi Urban Jungle sul Mercato Metropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi i tre lotti di lavori del Progetto verde Carbon Neutral che hanno interessato aree prospicienti declassata -in corso lavori Urban Jungle Macrolotto Zero e alloggi popolari via Turchia -installate 28 centraline CNR per misurare gli effetti della forestazione sull'aria -Piattaforma Prato Forest city per acquistare un albero
15	La vita sulla terra	7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani -lavori per la realizzazione di aree sgambatura cani 	<ul style="list-style-type: none"> -accettata eredità di una cittadina vincolata alla realizzazione di un nuovo canile -conclusi lavori 3 aree sgambatura (Visiana, Wangen, 	<ul style="list-style-type: none"> -nuovo affidamento del canile, del servizio S.O.S animali e dell'oasi fenile la Bogaia -conclusi lavori area sgambatura via Curtatone

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
					Bensa)	
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -progetto di prossimità nel Macrolotto 0 insieme ad Alia per contrastare l'abbandono di rifiuti e sensibilizzare la popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -controlli sul decoro urbano -Regolamento videosorveglianza 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza PM nelle frazioni e nel centro storico -estensione sistema di videosorveglianza cittadino con 8 nuovi punti -attivazione controlli specifici sui comportamenti cause di incidenti stradali
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.3	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Nessuna azione realizzata	<ul style="list-style-type: none"> -analisi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare -apertura bagno pubblico in centro in via dei Manassei 	<ul style="list-style-type: none"> -Piano auditing 2022 -Piano anticorruzione 2022-2024 -attivazione piattaforma per whistleblowing -costituita rete dei referenti per la privacy -aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.4	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> -adeguamento Piano anticorruzione e trasparenza alle nuove disposizioni dell'ANAC -verifiche sulle attività extraistituzionali dei dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> -nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -Piano anticorruzione 2021-2023 con nuove indicazioni ANAC -Codice di comportamento 	<ul style="list-style-type: none"> -Ricollocato archivio storico di S.Caterina -attivazione procedura per richieste di acquisizione, locazioni, concessioni di immobili da privati -attivazione procedura per richieste manutenzioni straordinaria agli impianti

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
						sportivi -gara per gestione e manutenzione impianti antincendio
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.1	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	-digitalizzazione delibere del Consiglio precedenti al 1990 -revisionato portale procedimenti attività produttive	-campagna comunicativa sull'accesso ai servizi demografici digitali -nuove modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora alla Casa Comunale	-attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP -sportello rilascio SPID presso Urp e biblioteca Lazzarini -attivazione nuova procedura per richiesta informazioni servizi demografici -nuovo portale sui dati statistici Prato Conta
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	Nessuna azione realizzata	attivazione Consiglio Comunale dei ragazzi e approvazione Regolamento	3 sedute consiglio comunale dei ragazzi
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	18.1	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	-informazioni tempestive e multicanale per Covid -rimodulazione modalità di accesso ai servizi attraverso canali non fisici -sedute consiglio comunale on line	-rinnovato sito Lazzarini e Polo regionale di documentazione interculturale -revisione regolamento della partecipazione -ampliati servizi Urp attraverso convenzioni con altri enti -promozione accesso ai servizi in modalità web -campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione	- campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione -promozione sito "Città di Prato" -promozione sui social -attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	-revisione contratti di servizio (pulizie, assicurazioni)	-gestione fondo Covid per sostenere le maggiori spese e	-attivazione coordinamento e monitoraggio progetti PNRR

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
	forti			-riorganizzazione procedure e processi di lavoro	le minori entrate dovute all'emergenza sanitaria -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -attivazione monitoraggio puntuale sui residui delle opere pubbliche -riorganizzazione e informatizzazione procedure	-recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -modifica regolamento contributi e patrocini
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	-attivazione smart working -approvato regolamento per la disciplina dello Smart working -fornitura DPI ai dipendenti -approvato documento di valutazione del rischio in emergenza sanitaria	-modifica Regolamento aziendale sugli orari di lavoro -modifica disciplina modalità di assunzione all'impiego -approvazione Pola -rinnovo CUG -sottoscritto nuovo contratto decentrato dirigenti -modificata la struttura organizzativa -modificato sistema di misurazione e valutazione -adeguato documento di valutazione del rischio	-Modificato regolamento del lavoro agile -Modificato sistema di misurazione e valutazione della performance -approvato Piano della formazione -attivati corsi di formazione sulle competenze digitali, mobbing e discriminazione -è stato predisposto il progetto per l'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	-riorganizzazione servizi di sportello (anagrafe, Urp, Suap) in situazione emergenziale implementando i servizi on line -effettuate rilevazioni di customer -analisi statistiche sul contesto	-riorganizzata modalità di accesso ai servizi demografici -effettuate rilevazioni di customer su 13 servizi -analisi statistiche sul contesto socio economico (esercizi commerciali, demografia)	-Effettuate rilevazioni di customer su 11 servizi

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	risultati 2022
				socio economico (redditi, fecondità, demografia)		

Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria

L'analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell'impegnato e dell'accertato di competenza al 31.12.2022.

La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate e gli impegni e accertamenti in competenza. Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro.


Tabella 2: Risorse assestate, accertamenti e impegni per obiettivo strategico

Obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Entrate al 31/12/2022	Accertato al 31/12/2022	% accertato	Uscite al 31/12/2022	Impegnato al 31/12/2022	% impegnato
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	11.237.064,15	10.674.742,30	95%	2.187.678,52	1.411.014,45	64%
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	5.322.957,49	6.729.555,72	126%	20.000,00	-	0%
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	17.923.098,67	2.851.046,15	16%	28.561.827,59	10.213.763,90	36%
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	2.215.918,00	97.432,26	4%	6.098.081,04	4.029.076,90	66%
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	16.437.087,78	9.162.769,96	56%	13.082.134,52	5.228.278,39	40%
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	18.924.337,66	20.346.064,47	108%	13.548.772,88	12.742.423,12	94%
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	52.707.153,57	51.844.721,65	98%	62.297.650,67	58.450.932,16	94%
Prato città green	2021-OBST-08	11.873.643,91	11.261.817,77	95%	7.110.019,62	4.764.023,89	67%
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	15.967.184,60	5.707.465,28	36%	18.287.041,22	5.777.120,44	32%
Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	2.367.941,54	2.547.025,06	108%	17.954.835,07	16.888.377,10	94%
Una casa per tutti	2021-OBST-11	1.166.168,09	941.281,00	81%	2.928.889,54	2.320.531,49	79%


Obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Entrate al 31/12/2022	Accertato al 31/12/2022	% accertato	Uscite al 31/12/2022	Impegnato al 31/12/2022	% impegnato
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	3.379.770,08	1.707.584,25	51%	3.524.110,56	2.786.615,23	79%
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	20.707.808,49	12.249.947,98	59%	46.151.893,76	34.300.648,24	74%
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	13.056.571,81	12.571.616,78	96%	8.613.628,31	6.486.129,56	75%
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	-	-		-	-	
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	141.347.269,45	123.400.388,51	87%	87.001.614,18	35.921.021,01	41%
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	2.955.375,86	2.895.261,95	98%	10.897.734,34	10.080.331,52	92%
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	8.264,00	2.065,82	25%	1.041.862,15	1.029.281,37	99%

*l'accertato è più alto della previsione di entrata per l'incasso di arretrati COSAP.

**sono state escluse le anticipazioni di cassa

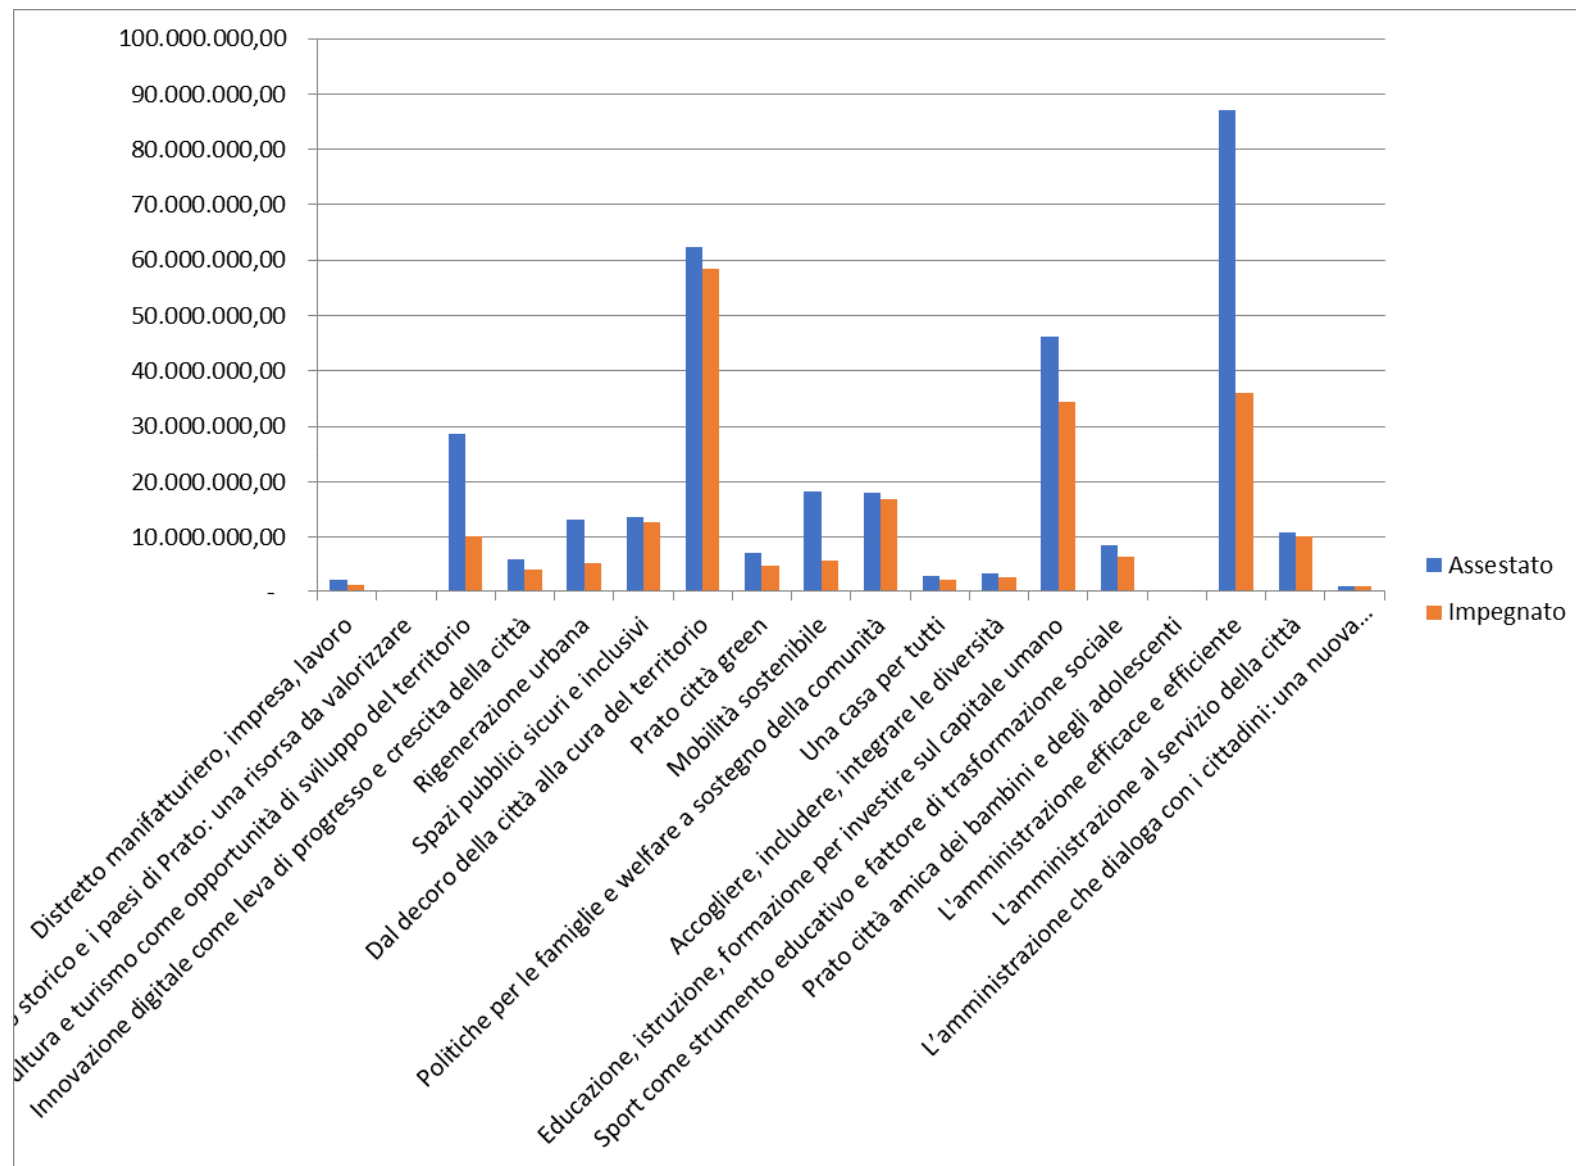

Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici.

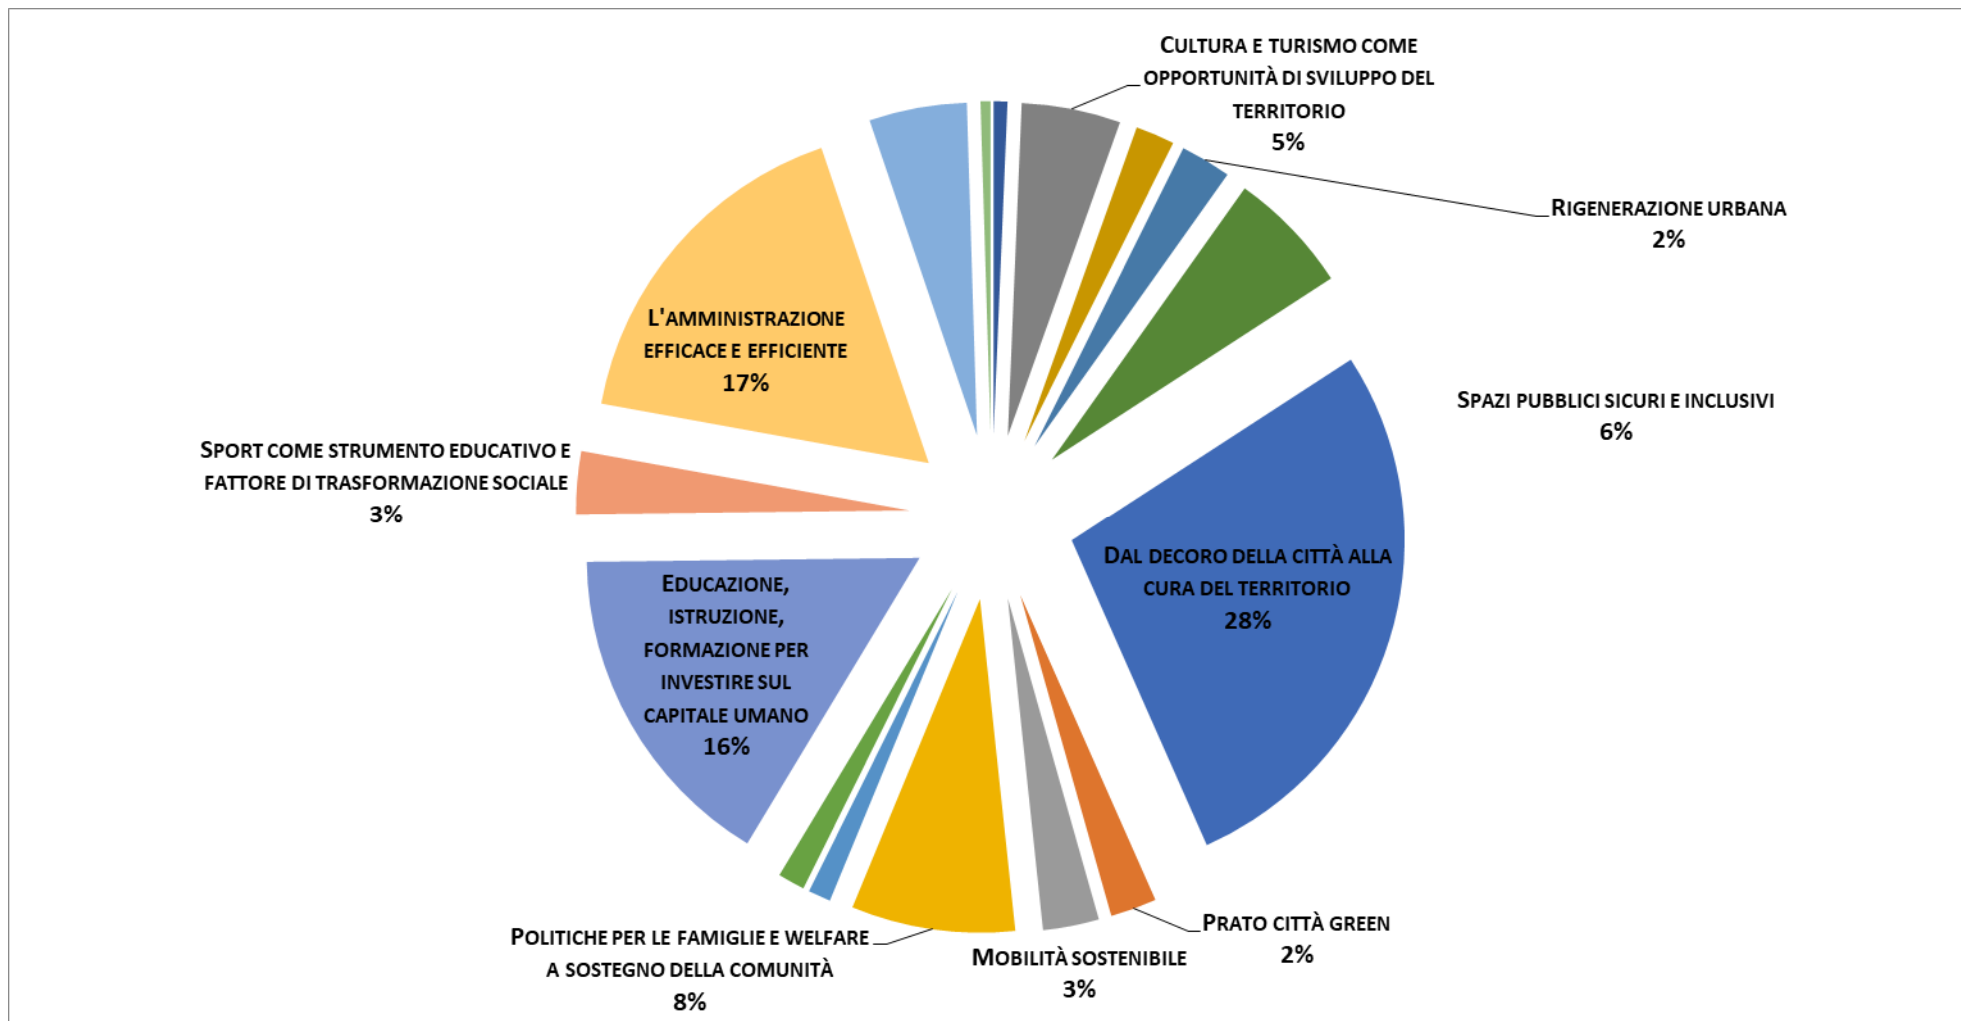

Gli obiettivi strategici dove le spese dell'amministrazione sono state più rilevanti sono:

- *Dal decoro della città alla cura del territorio*, con il 28%: la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- *Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano*, con il 16%: in questo obiettivo rientrano i servizi rivolti ai bambini e giovani (mensa scolastica, asili nido, scuola dell'infanzia, centri gioco e biblioteche) e gli interventi di edilizia scolastica;
- *L'amministrazione efficace e efficiente*, con il 17% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti gli uffici interni dell'amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini;
- *Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità* con l'8%: qui troviamo tutta la spesa per i servizi sociali.

La tabella e i grafici seguenti riportano la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all'incremento delle attività finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 riferito alle partite di giro).

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte corrente la 31/12/2022
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	1.367.743,32
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	-
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	8.652.654,28
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	3.791.391,08
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	1.375.806,80
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	12.485.078,00
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	55.221.641,28
Prato città green	2021-OBST-08	2.184.752,06
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	3.193.620,79

Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	16.803.908,38
Una casa per tutti	2021-OBST-11	2.273.440,04
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	2.681.415,23
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	31.395.901,63
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	3.516.829,57
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	18.417.881,39
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	10.013.325,53
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	1.029.281,37

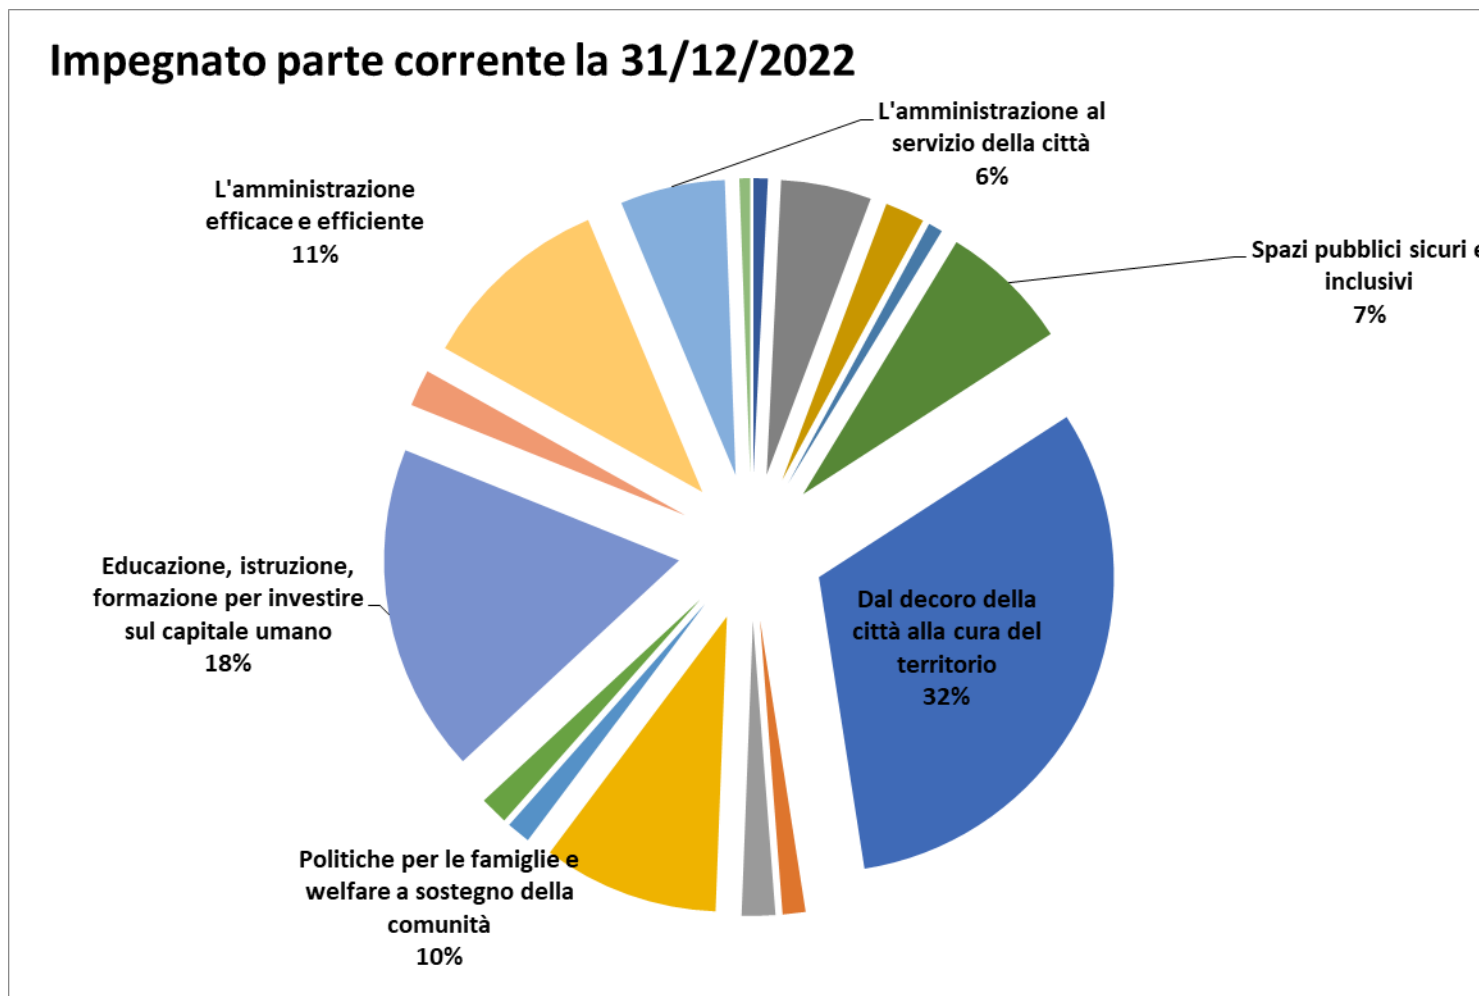


Tabella 3: Spesa corrente per obiettivo strategico

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa corrente sono: “Dal decoro della città alla cura del territorio”, “Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano”, “L’amministrazione efficace ed efficiente” e “Politiche per le famiglie e welfare a sostegno di comunità”.

Descrizione obiettivo strategico	Codice obiettivo strategico	Impegnato parte capitale la 31/12/2022
Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2021-OBST-01	43.271,13
Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	2021-OBST-02	-
Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2021-OBST-03	1.561.109,62
Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2021-OBST-04	237.685,82
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	3.852.471,59
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	257.345,12
Dal decoro della città alla cura del territorio	2021-OBST-07	3.226.030,48
Prato città green	2021-OBST-08	2.579.271,83
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	2.583.499,65
Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	84.468,72
Una casa per tutti	2021-OBST-11	47.091,45
Accogliere, includere, integrare le diversità	2021-OBST-12	105.200,00
Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	2021-OBST-13	2.904.746,61
Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	2.969.299,99
Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	2021-OBST-15	-
L'amministrazione efficace e efficiente	2021-OBST-16	345.640,43
L'amministrazione al servizio della città	2021-OBST-17	67.005,99
L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	2021-OBST-18	-

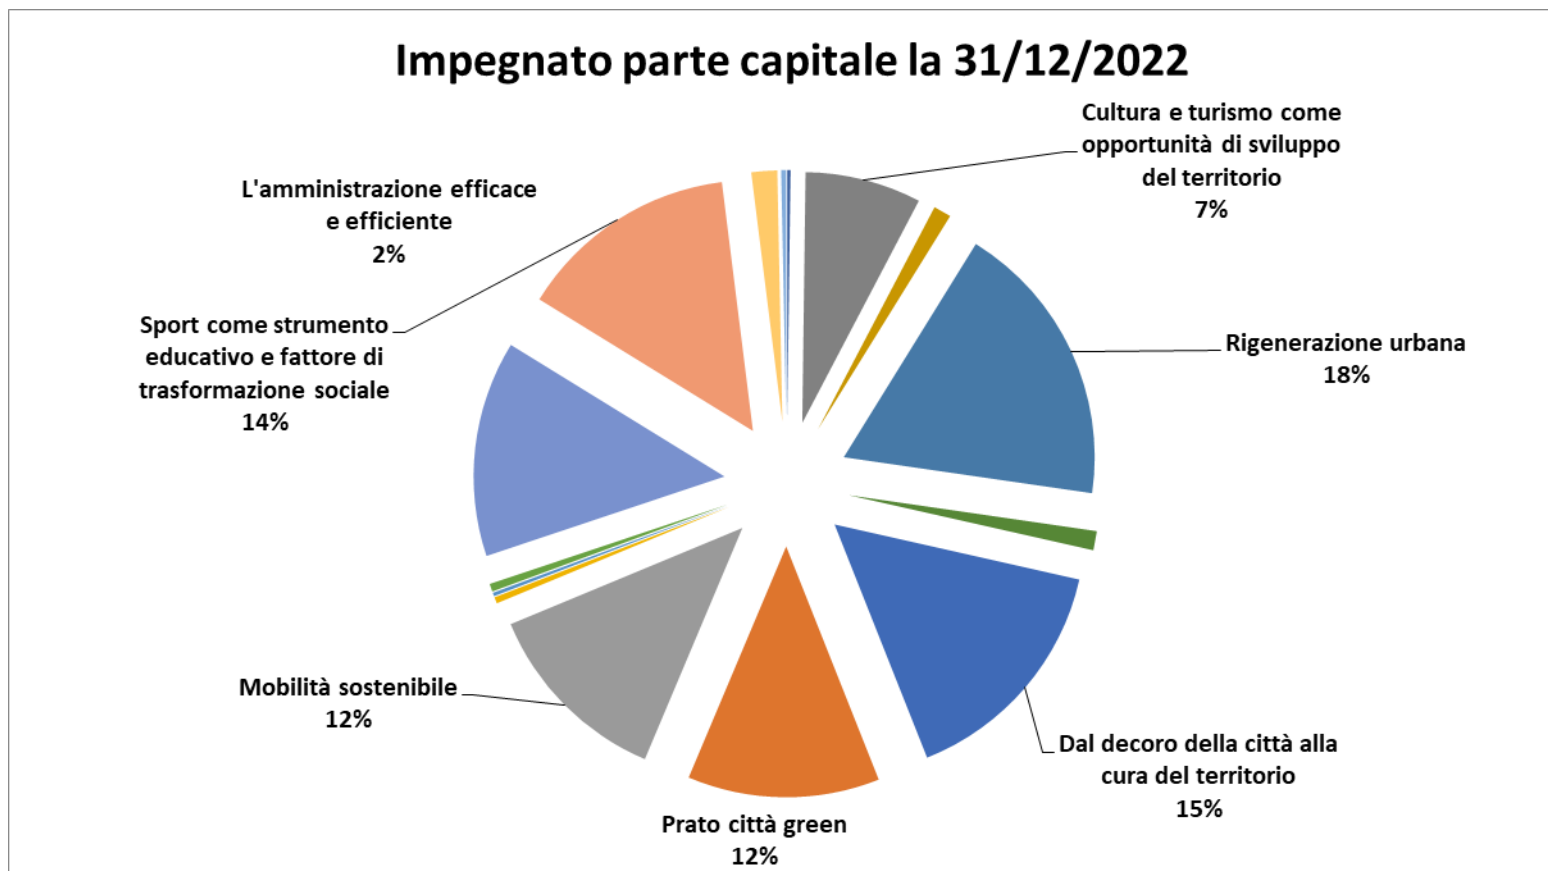


Tabella 4: Spesa in conto capitale per obiettivo strategico

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in conto capitale sono: Mobilità sostenibile, Rigenerazione urbana, Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale, Dal decoro della città alla cura del territorio, Prato città green.


Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 31 dicembre 2022

La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 31 dicembre 2022, per un totale di 215 opere. Di cui:

- 56 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024;
- 84 riguardano progetti del Piano Opere 2021/2023,
- 34 il piano opere 2020/2022
- 41 sono opere riferite ad anni precedenti.

Stato	anni precedenti	2020-2022	2021-2023	2022-2024	Totale	Importo progetto
conclusi	14	14	28	4	60	21.822.756,68
lavori in corso	17	15	12	1	45	30.545.023,54
aggiudicazione	2	1	6	2	11	2.911.623,65
gara			2		2	40.000,00
progetto esecutivo	1	2	16	15	34	28.940.074,63
progetto definitivo	6	1	12	10	29	40.806.516,67
progetto definitivo/ esecutivo			1	1	2	1.452.214,50
Studio fattibilità	1	1	7	23	32	34.643.735,00
Totale complessivo	41,00	34,00	84,00	56,00	215,00	161.161.944,67

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i vari stati d'avanzamento. Le opere concluse sono il 28%, quelle con lavori in corso il 21%, quelle aggiudicate il 5%, quelle in fase di gara il 15% e quelle con progetto approvato il 30%.

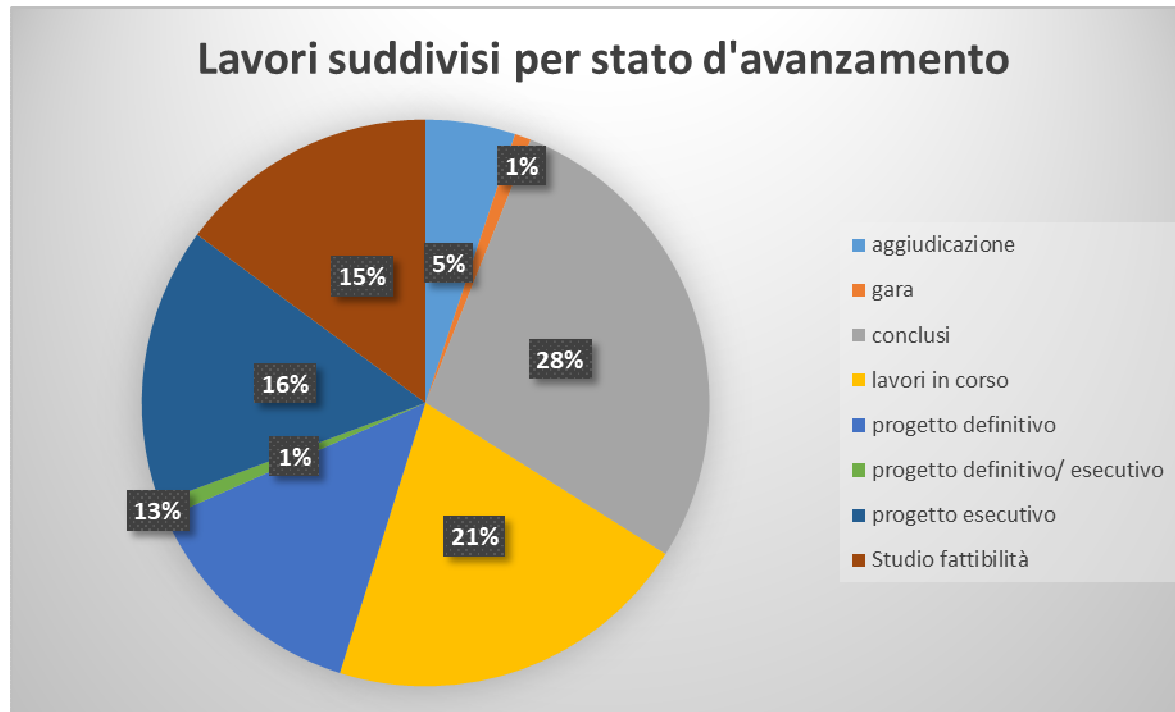

Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento.

OPERE CONCLUSE :

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
Nuovo impianto pompa di calore biblioteca Lazzerini	Altri immobili	24.998,40
Lavori per accessibilità Casa Museo e Laboratorio d'arte Leonetto Tintori- Vainella	Altri immobili	50.000,00
Biblioteca Lazzerini-realizzazione nuovi bagni	Altri immobili	50.000,00
Rifacimento facciata scuola di musica	Altri immobili	300.000,00
Lavori di riadattamento e ripristino locali ex centro sociale via Narnali	Altri immobili	21.925,82
Manutenzione straordinaria impianti riscaldamento uff demografici	Altri immobili	47.520,00
Museo Pecci. Progetto Cieli in città	Altri immobili	140.000,00
Nuova area di sgambatura via Curtatone	Ambiente	18.000,00
Giardini via Carlo Marx- Riquilificazione Parco giochi	Ambiente	55.000,00
Riquilificazione giardini via Valori Galciana	Ambiente	18.000,00
Riquilificazione area verde via Tirso adiacente campo sportivo Chiesanuova	Ambiente	23.000,00
Riquilificazione giardino scuola infanzia A.Da Quarata	Ambiente	12.000,00
Riquilificazione giardino nido via Paisiello San Paolo	Ambiente	18.200,00
Riquilificazione giardino via Capponi	Ambiente	37.603,12
Riquilificazione giardino via Hermada	Ambiente	51.940,88

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
Risagomatura fossi acque di drenaggio via del Leone	Ambiente	211.989,00
Risagomatura fossi acque di drenaggio via Mozza delle risaie, via delle Colombaie	Ambiente	179.197,00
Risagomatura fossi acque di drenaggio via della Torre armata, via della Rugea	Ambiente	214.095,00
Risagomatura fossi acque di drenaggio via Traversa per le Calvane	Ambiente	182.206,00
Dissesto idrogeologico via Delle Cave- ripristino tratto di strada	Ambiente	204.973,00
PH334 Manutenzione straordinaria cimiteri	Cimiteri	300.000,00
Miglioramento sismico scuola Da Vinci	Istruzione e servizi educativi	356.200,00
Miglioramento sismico scuola Munari San Giusto	Istruzione e servizi educativi	342.500,00
Rifacimento del manto e messa in sicurezza della copertura della scuola d'infanzia Fontanelle	Istruzione e servizi educativi	138.000,00
Rifacimento del manto e messa in sicurezza della copertura della scuola d'infanzia Tobbiana	Istruzione e servizi educativi	124.000,00
Scuola primaria di Casale- nuovo spazio polivalente	Istruzione e servizi educativi	863.285,17
Scuola primaria Bruni Casale- opere supplementari	Istruzione e servizi educativi	53.930,05
Scuola primaria Bruni di Casale- sistemazioni esterne lotto B	Istruzione e servizi educativi	119.394,12
Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 2° lotto- opere di completamento	Istruzione e servizi educativi	350.000,00
Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 1° lotto	Istruzione e servizi educativi	1.550.000,00
Installazione opera d'arte Spindles - zona ospedale	Riqualificazione	60.000,00

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
PH292A4bis - Rimodulazione carreggiate via Ferrucci lotto 2	Riqualificazione	159.000,00
Medialibrary , Coworking, Smart Grid	Riqualificazione	4.619.941,69
Riqualificazione giardino via Vivaldi San Paolo	Riqualificazione	541.805,30
Riqualificazione giardini via Spontini, via dell'Alberaccio, via Vivaldi, via Lorenzo Da Prato, via Becherini, via Ciabatti	Riqualificazione	619.811,39
Riqualificazione giardini via Wangen	Riqualificazione	738.357,84
PIU opere aggiuntive- riqualificazione sede stradale via Giordano- via Pistoiese	Riqualificazione	1.286.670,00
Riversibility - Parco Fluviale del Bisenzio	Riqualificazione	1.400.000,00
Piazza del Mercato Nuovo - interventi per le dotazioni di sicurezza dei luoghi sensibili e ristrutturazione palazzina bagni pubblici e vigili urbani	Riqualificazione	150.000,00
Stadio nuova recinzione lato ospiti	Sport	85.000,00
Copertura Piscina Via Roma	Sport	110.000,00
Collegamento stradale tra via Manzoni e via di Garduna in loc. Iolo	Viabilità e trasporti	99.883,40
Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 1° lotto	Viabilità e trasporti	354.200,00
PH308C Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola- area sosta biciclette	Viabilità e trasporti	167.000,00
PH308B Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola	Viabilità e trasporti	440.000,00
PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 3	Viabilità e trasporti	500.000,00

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
PH365 Riqualificazione viale Montegrappa lotto 4	Viabilità e trasporti	240.000,00
PH308E Mobilità casa scuola- sistemazione esterna polo scolastico S.Paolo via Galcianese- lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2	Viabilità e trasporti	679.397,40
PH366B Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica stradale	Viabilità e trasporti	150.000,00
PH364 Efficientamento pubblica illuminazione	Viabilità e trasporti	200.000,00
PH380/1 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 1	Viabilità e trasporti	565.000,00
PH380/3 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 3	Viabilità e trasporti	565.000,00
PH406C Interventi di messa in sicurezza muro a sostegno della pedecollinare via Valibona	Viabilità e trasporti	70.000,00
Adeguamento antincendio parcheggio Serraglio	Viabilità e trasporti	153.759,00
Sicurezza stradale- interventi di traffic calming viale Borgovalsugana	Viabilità e trasporti	216.000,00
PH351 Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	Viabilità e trasporti	210.000,00
PH409/1 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	Viabilità e trasporti	230.000,00
(PH404) Sicurezza stradale: Limitazione incidentalità e segnaletica	Viabilità e trasporti	79.000,00
Palazzo Benassai: riqualificazione energetica e facciata	Viabilità e trasporti	870.000,00

OPERE IN CORSO

Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti di investimento non ancora conclusi suddivisi per stato d'avanzamento e per area tematica

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
1	Castello dell'Imperatore - ascensore e piattaforma elevatrice	aggiudicazione	Altri immobili	78.386,00	
2	Officina giovani: manutenzione straordinaria copertura blocco ex celle frigo	aggiudicazione	Altri immobili	250.000,00	
3	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	aggiudicazione	Istruzione	300.000,00	
4	PH394 - Riqualificazione Via Visiana	aggiudicazione	Istruzione	83.000,00	
5	(PH398) Miglioramento funzionale di alcuni sottopassi nel Comune di Prato	aggiudicazione	Istruzione	110.000,00	
6	(PH395) Riqualificazione Via Luigi Spontini	aggiudicazione	Istruzione	130.000,00	
7	Messa a norma Stadio - tribuna d'onore	aggiudicazione	Sport	144.073,58	
8	PH333 Riqualificazione sottopasso ciclopedonale Questura	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	192.096,17	
9	PH401 Interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza dei Ponti carrabili e pedonali	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	224.067,90	
10	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 3 suddiviso in ulteriori 2 lotti Lotto 3A e Lotto 3B	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	650.000,00	sì
11	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 2 suddiviso in ulteriori 2 lotti Lotto 2A e Lotto 2B	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	750.000,00	sì
12	Restauro fontana p.za S.Francesco	gara	Altri immobili	30.000,00	
13	Restauro fontana p.za Mercatale	gara	Altri immobili	10.000,00	
14	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Altri immobili	6.000.000,00	
15	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Altri immobili	3.231.903,16	
16	Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	lavori in corso	Altri immobili	100.000,00	
17	Museo Pecci. Interventi di completamento appalto principale: messa in sicurezza dei parapetti, dei controsoffitti e illuminazione esterna.	lavori in corso	Altri immobili	130.000,00	
18	Restauro fontana p.za Duomo	lavori in corso	Altri immobili	90.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
19	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 1° lotto Via Rimini	lavori in corso	Ambiente	150.000,00	
20	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 2° lotto Area Pecci	lavori in corso	Ambiente	150.000,00	
21	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 3° lotto Area Nenni	lavori in corso	Ambiente	550.000,00	
22	Orti all'interno della cassa circondariale	lavori in corso	Ambiente	50.000,00	
23	Digital Twin per il rischio meteo climatico	lavori in corso	Ambiente	80.000,00	
24	Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	lavori in corso	Istruzione	915.000,00	
25	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Istruzione	1.000.000,00	
26	Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	lavori in corso	Istruzione	169.500,00	
27	Scuola primaria Bruni di Casale- realizzazione parcheggio lotto A	lavori in corso	Istruzione	261.563,89	
28	Nuova mensa scuola Marcocci	lavori in corso	Istruzione	350.000,00	
29	sostituzione degli infissi della scuola d'infanzia Corridoni sita in Via Filippo Corridoni e della scuola primaria Antonio Bruni sita in Via di Brugnano n.20	lavori in corso	Istruzione	210.000,00	
30	Ristrutturazione e risanamento strutturale Asilo Nido Arcobaleno	lavori in corso	Istruzione	650.000,00	
31	Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgo San Paolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	lavori in corso	Istruzione	275.000,00	
32	Copertura scuola Don Bosco	lavori in corso	Istruzione	100.000,00	
33	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	lavori in corso	Riqualificazione	824.851,65	
34	Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitano	lavori in corso	Riqualificazione	363.705,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
35	Start Park- realizzazione nuove infrastrutture verdi e blu presso i giardini del Soccorso	lavori in corso	Riqualificazione	198.250,00	
36	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la piscina di Via Roma	lavori in corso	Sport	1.420.000,00	
37	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	lavori in corso	Sport	354.369,00	
38	Nuovo Campo sportivo Paperino lotto 1	lavori in corso	Sport	601.000,00	
39	Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	lavori in corso	Sport	5.100.000,00	
40	Riqualificazione via Roma vasche bimbi	lavori in corso	Sport	447.712,84	
41	Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	lavori in corso	Viabilità e trasporti	1.091.602,01	
42	Reti di percorsi ciclopeditoni nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio A	lavori in corso	Viabilità e trasporti	866.814,00	
43	Reti di percorsi ciclopeditoni nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio B	lavori in corso	Viabilità e trasporti	483.480,00	
44	PH342- Mobilità Casa scuola -Progetto Demos due-Primus	lavori in corso	Viabilità e trasporti	92.983,00	
45	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	232.200,00	
46	PH363 Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
47	PH362 Manutenzione piste ciclabili	lavori in corso	Viabilità e trasporti	100.000,00	
48	PH360 Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
49	PH380/2 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	565.000,00	
50	PH380/4 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 4	lavori in corso	Viabilità e trasporti	445.956,65	
51	PH397 Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile via delle Fonti e via Fonda di Mezzana	lavori in corso	Viabilità e trasporti	429.627,00	
52	PH397 Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	317.369,00	
53	PH397 Ampliamento rete ciclabili- realizzazione percorso ciclopedonale su via Marini	lavori in corso	Viabilità e trasporti	193.392,00	
54	Il tangenziale- Lotto 4-Opere di sistemazione idraulica dei prismi arginali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	260.000,00	
55	PH358 Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione barriere architettoniche e ampliamenti funzionali	lavori in corso	Altri immobili	500.000,00	
56	PH367 Urbanistica tattica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
57	PH366A Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	lavori in corso	Viabilità e trasporti	150.000,00	
58	PH301-A Collegamento viabilità Maliseti	lavori in corso	Viabilità e trasporti	143.744,34	
59	Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine	progetto definitivo	Altri immobili	300.000,00	sì
60	Riqualificazione palazzina vigili S.Lucia	progetto definitivo	Altri immobili	150.000,00	
61	Adeguamento antincendio teatro Metastasio	progetto definitivo	Altri immobili	298.962,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
62	S.Caterina: tinteggiatura corte e teatro; restauro antiche mura nella corte	progetto definitivo	Altri immobili	140.000,00	sì
63	S.Caterina: locali ex archivio storico anagrafe	progetto definitivo	Altri immobili	240.000,00	sì
64	S.Caterina: sostituzione infissi	progetto definitivo	Altri immobili	250.000,00	sì
65	Realizzazione di un parco attrezzato in via Turchia (giocagìo 2)	progetto definitivo	Ambiente	866.146,87	
66	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Istruzione	4.498.008,00	
67	Adeguamento sismico scuola Villa Charitas 1° lotto	progetto definitivo	Istruzione	300.000,00	
68	Nuovo parcheggio scuola materna Pacciana	progetto definitivo	Istruzione	250.000,00	
69	Scuola primaria d'Amico: riqualificazione energetica	progetto definitivo	Istruzione	450.000,00	
70	Realizzazione parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	7.120.000,00	
71	Realizzazione deposito complementare al parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	700.000,00	
72	Riqualificazione impianti piscina lolo	progetto definitivo	Sport	1.650.000,00	
73	Riqualificazione vasca 50m piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	1.402.287,00	
74	Impianto natatorio a lolo- piscina olimpionica	progetto definitivo	Sport	16.000.000,00	sì
75	Complesso scolastico sportivo via Galcianese- cabina elettrica	progetto definitivo	Sport	150.000,00	
76	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni lotto 2 - realizzazione marciapiede	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	27.800,00	
77	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
78	Messa in sicurezza via Firenze Lotto 3: tratto da Ponte Petrino a La Querce	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
79	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 1, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	717.559,22	
80	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 2, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	908.886,25	
81	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 3, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	191.918,77	
82	Completamento e miglioramento ciclabile connessione stazione Borgonuovo- Ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00	
83	Interventi di riqualificazione e limitazione incidentalità ai fini degli spostamenti sistematici (velostazione)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	100.000,00	
84	Ciclovia del Sole Verona- Firenze	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	1.476.984,00	sì
85	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 1 (PH419-1)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	61.663,96	
86	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 2 (PH419-2)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	118.181,00	
87	Nuova pista ciclabile via Dossetti	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	738.119,60	
88	Mobilità casa scuola Galcianese- S.Paolo lotto 2 stralcio 2, lotti 1 e 2 stralcio 3,4,5	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	1.056.675,50	
89	Interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti: Ponte Petrino	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	395.539,00	sì
90	Trasformazione dell'immobile adibito alla scuola secondaria di primo grado Don Bosco nella nuova sede del Centro per l'impiego di Prato	progetto esecutivo	Altri immobili	545.000,00	
91	Riqualificazione parco giochi Giocagìo 1 via Marradi "Andiamo al mare"	progetto esecutivo	Ambiente	200.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
92	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 1	progetto esecutivo	Ambiente	518.951,63	sì
93	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 2	progetto esecutivo	Ambiente	544.512,54	sì
94	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 3	progetto esecutivo	Ambiente	461.134,44	sì
95	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 4	progetto esecutivo	Ambiente	578.758,07	sì
96	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 5	progetto esecutivo	Ambiente	934.923,68	sì
97	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 6	progetto esecutivo	Ambiente	792.733,74	sì
98	Riqualificazione del giardino via Naldi/ via Guerra	progetto esecutivo	Ambiente	45.000,00	
99	Scuola Cironi	progetto esecutivo	Istruzione	16.066.000,00	sì
100	Riqualificazione energetica scuola Borgonuovo	progetto esecutivo	Istruzione	94.000,00	
101	Riqualificazione energetica scuola Manzi	progetto esecutivo	Istruzione	15.500,00	
102	Riqualificazione energetica scuola Rodari	progetto esecutivo	Istruzione	50.000,00	
103	Riqualificazione energetica scuola Fermi succursale	progetto esecutivo	Istruzione	83.700,00	
104	Riqualificazione energetica impianti termici Manzi- Rodari- Fermi	progetto esecutivo	Istruzione	81.500,00	
105	Schermature solari scuole Don Bosco e Ciliani	progetto esecutivo	Istruzione	120.000,00	
106	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	progetto esecutivo	Sport	300.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
107	Pista atletica pavimentazione	progetto esecutivo	Sport	300.000,00	
108	Piscina Galilei: riqualificazione impianti	progetto esecutivo	Sport	400.000,00	sì
109	PH370 Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	274.844,37	
110	Illuminazione pubblica: PH399 interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	190.000,00	
111	Ciclabile di collegamento fra via Coppola e ciclabile Giulio Bresci	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	170.000,00	
112	Collegamento ciclabile Paperino-S.Giorgio, via del Ferro	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	700.000,00	
113	Completamento e attrezzature ciclabile connessione stazione- piazza Carceri	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	330.000,00	
114	Realizzazione nuovo tratto e miglioramento della connessione ciclabile via Ferraris- via Roma- Parco della Liberazione e pace	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	470.000,00	
115	Ristrutturazione e miglioramento rete piste ciclabili	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	523.516,16	
116	Ciclabile stazione centrale/ riconnessione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	660.000,00	sì
117	Ciclabile Borgonuovo-Filzi-Pistoiese/ Riconnessione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	313.000,00	sì
118	Ciclabile Liliana Rossi-Coiano-Chiesanuova/ Riconnessione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	674.000,00	sì
119	Ciclabile Via Roma- via Carlo Marx/ Riconnessione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	313.000,00	sì
120	Ciclabile Narnali-Maliseti/ Riconnessione rigenerazione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	410.000,00	sì
121	Ciclabile Catani/riconnessione-rigenerazione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	817.000,00	sì
122	Ciclabile Galciana-Vergaio-Ospedale/ Ricucitura-rigenerazione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	313.000,00	sì
123	Nuova pista ciclabile viale Montegrappa lotto 5	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	650.000,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
124	Nuova Palazzina Vigile area Serraglio	Studio fattibilità	Altri immobili	2.000.000,00	
125	Museo Palazzo Pretorio. Interventi urgenti in facciata	Studio fattibilità	Altri immobili	180.000,00	
126	Riqualficazione Pattinodromo Palarogai 1° lotto	Studio fattibilità	Sport	450.000,00	
127	Officina giovani: recupero ex stalle	Studio fattibilità	Altri immobili	250.000,00	sì
128	Realizzazione centro diurno e alloggio sociale via Zarini	Studio fattibilità	Altri immobili	660.000,00	sì
129	S.Caterina: edificio diroccato nella corte	Studio fattibilità	Altri immobili	1.500.000,00	sì
130	Museo Pecci ex Radio Toscana: residenze per artisti	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00	sì
131	Museo Pecci manutenzione straordinaria corte teatro	Studio fattibilità	Altri immobili	400.000,00	sì
132	Museo Pecci manutenzione straordinaria gradone	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00	sì
133	Museo Pecci. riapertura CID e sistemazione archivi	Studio fattibilità	Altri immobili	250.000,00	sì
134	Officina giovani: completamento recupero ex celle frigo-foyer di ingresso	Studio fattibilità	Altri immobili	120.000,00	sì
135	Officina giovani: piazzale e reti fognarie e di servizio	Studio fattibilità	Altri immobili	1.000.000,00	sì
136	Officina giovani: recupero del blocco Consiag	Studio fattibilità	Altri immobili	1.550.000,00	sì
137	Officina giovani: recupero piccolo capannone artigianale fronte piazza Macelli	Studio fattibilità	Altri immobili	200.000,00	sì
138	Officina giovani: recupero sotto ex celle frigo edificio Consiag	Studio fattibilità	Altri immobili	150.000,00	sì
139	Officina giovani: recupero facciate e infissi palazzina uffici	Studio fattibilità	Altri immobili	300.000,00	sì
140	Palazzina edificio via Roma- riqualificazione	Studio fattibilità	Altri immobili	2.000.000,00	sì
141	Cassa di espansione Vella	Studio fattibilità	Ambiente	1.164.940,00	
142	Parco giochi delle Civette via Curtatone	Studio fattibilità	Ambiente	32.000,00	
143	Parco Santo Stefano (Ospedale)	Studio fattibilità	Ambiente	256.620,00	

n	Descrizione	Stato	Area Tematica	Importo progetto	PNRR
144	Scuola secondaria di primo grado e palestra in via San Martino di Galceti del Comprensivo Nord	Studio fattibilità	Istruzione	9.800.000,00	
145	Riqualificazione energetica scuola Cecchi Paperino	Studio fattibilità	Istruzione	1.800.000,00	
146	Riqualificazione scuola Abatoni per realizzazione centro bambini e famiglie	Studio fattibilità	Istruzione	676.000,00	sì
147	Complesso ex Campolmi- Museo del Tessuto e Biblioteca Lazzerini- Riqualificazione della Piazza delle Mura: un nuovo spazio urbano tra storia natura e cultura	Studio fattibilità	Riqualificazione	198.250,00	
148	Riqualificazione campo di rugby Montano	Studio fattibilità	Sport	841.922,00	sì
149	Riqualificazione campo calcio Maliseti	Studio fattibilità	Sport	354.361,20	sì
150	Riqualificazione campo calcio Ribelli- Viaccia	Studio fattibilità	Sport	560.835,00	sì
151	Riqualificazione campo di calcio Fantaccini	Studio fattibilità	Sport	248.806,80	sì
152	Campo di calcio Paperino lotto 2	Studio fattibilità	Sport	800.000,00	sì
153	Adeguamento antincendio palestra via Roma	Studio fattibilità	Sport	400.000,00	sì
154	Riqualificazione immobile via della Fonderia	Studio fattibilità	Sport	6.000.000,00	
155	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale (PH376)	Studio fattibilità	Viabilità e trasporti	200.000,00	

Oltre alle opere sopra riportate, la cui realizzazione è seguita direttamente dagli uffici tecnici dell'amministrazione comunale, ci sono altri interventi la cui progettazione e realizzazione è seguita da soggetti terzi, fra cui il Sottopasso del Soccorso, la cui realizzazione spetta ad ANAS

Parte 4 – Qualità servizi

L'amministrazione ha introdotto progressivamente un sistema strutturato di monitoraggio della qualità che consenta di verificare il grado di gradimento degli utenti dei servizi gestiti dal comune di Prato e di monitorare le procedure interne per migliorare i processi di lavoro. Questo sistema prevede la stretta collaborazione tra l'ufficio Statistica e i vari uffici i cui servizi sono oggetto d'indagine. L'ufficio Statistica fornisce il supporto nella definizione degli strumenti e delle metodologie da impiegare, nell'elaborazione dei dati raccolti, nella predisposizione dei report relativi e nella loro diffusione. Gli uffici coinvolti, sulla base degli esiti dell'indagine, individueranno le azioni di miglioramento.

La ripetizione di queste indagini nel tempo, consente di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti della qualità di un certo servizio. Inoltre, il confronto fra i livelli di qualità dei vari servizi dell'ente, permette di individuare quali necessitano di interventi di miglioramento.

La progettazione e realizzazione delle indagini di customer satisfaction è definita in alcuni step fondamentali, cronologicamente correlati, come riportati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE FASE	RESPONSABILE FASE
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell'indagine - formulazione piano d'indagine	Ufficio statistica, Servizio committente
Redazione questionario – implementazione su piattaforma lime survey	Ufficio statistica, Servizio committente
Somministrazione questionari (accesso web protetto, link attraverso mail/cartacei)	Ufficio statistica, Servizio committente
Inserimento questionari su piattaforma lime survey (solo se l'indagine è stata realizzata attraverso la somministrazione di questionari cartacei)	Servizio committente
Elaborazione risultati indagine	Ufficio statistica
Stesura report e pubblicazione web risultati dell'indagine	Ufficio statistica
Analisi risultati. Individuazione ambiti di miglioramento: Predisposizione report	Servizio committente

Qui di seguito sono elencate le analisi di customer previste nel Dup 2022/2024 e quelle effettuate nell'anno 2022.

AMBITO DI ATTIVITA'/FUNZIONE	PRINCIPALI INDAGINI	COMPETENZA INDAGINE	PERIODICITA' RILEVAZIONE	STATO	LIVELLO DI SODDISFAZIONE
Musei	Soddisfazione delle attività ordinarie e degli eventi speciali dei Musei cittadini	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,38
Cultura	Soddisfazione delle attività della Scuola di Musica G. Verdi	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	4,91
Politiche giovanili	Soddisfazione dei laboratori di Officina Giovani	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,38
Anagrafe	Servizi demografici on-line	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Non effettuata	
Pubblica Istruzione	Soddisfazione del servizio Centri Gioco	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	4,63
	Soddisfazione del servizio Nido	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,45
	Soddisfazione delle Scuole infanzia comunali	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,08
	Monitoraggio mense	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	4,48
Immigrazione	Soddisfazione sportello immigrazione	Immigrazione	Monitoraggio annuale	Effettuata	4,88
Polizia Municipale	Soddisfazione sportello PM	Polizia municipale	Monitoraggio annuale	Effettuata	97,9
Igiene Urbana	Soddisfazione servizio igiene urbana	Alia Spa	Monitoraggio annuale	Effettuata	94,4

Nelle pagine successive viene riportata una scheda sintetica per ogni servizio monitorato, indicando le caratteristiche della rilevazione, gli utenti coinvolti e il livello di soddisfazione medio ottenuto.

Customer Asili Nido - Pubblici e privati accreditati' a.s 2021/2022

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che non hanno fornito la casella di posta elettronica per l'invio dei questionari o hanno incontrato difficoltà nella compilazione on line.

Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.

La rilevazione è stata effettuata su tutta l'area pratese: Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio


Periodo di rilevazione: 24/06-08/08/2022

Iscritti: 1.643

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 1.550

Questionari compilati: 812 (di cui 15 questionari cartacei)

Percentuale di compilazione: 49,42%

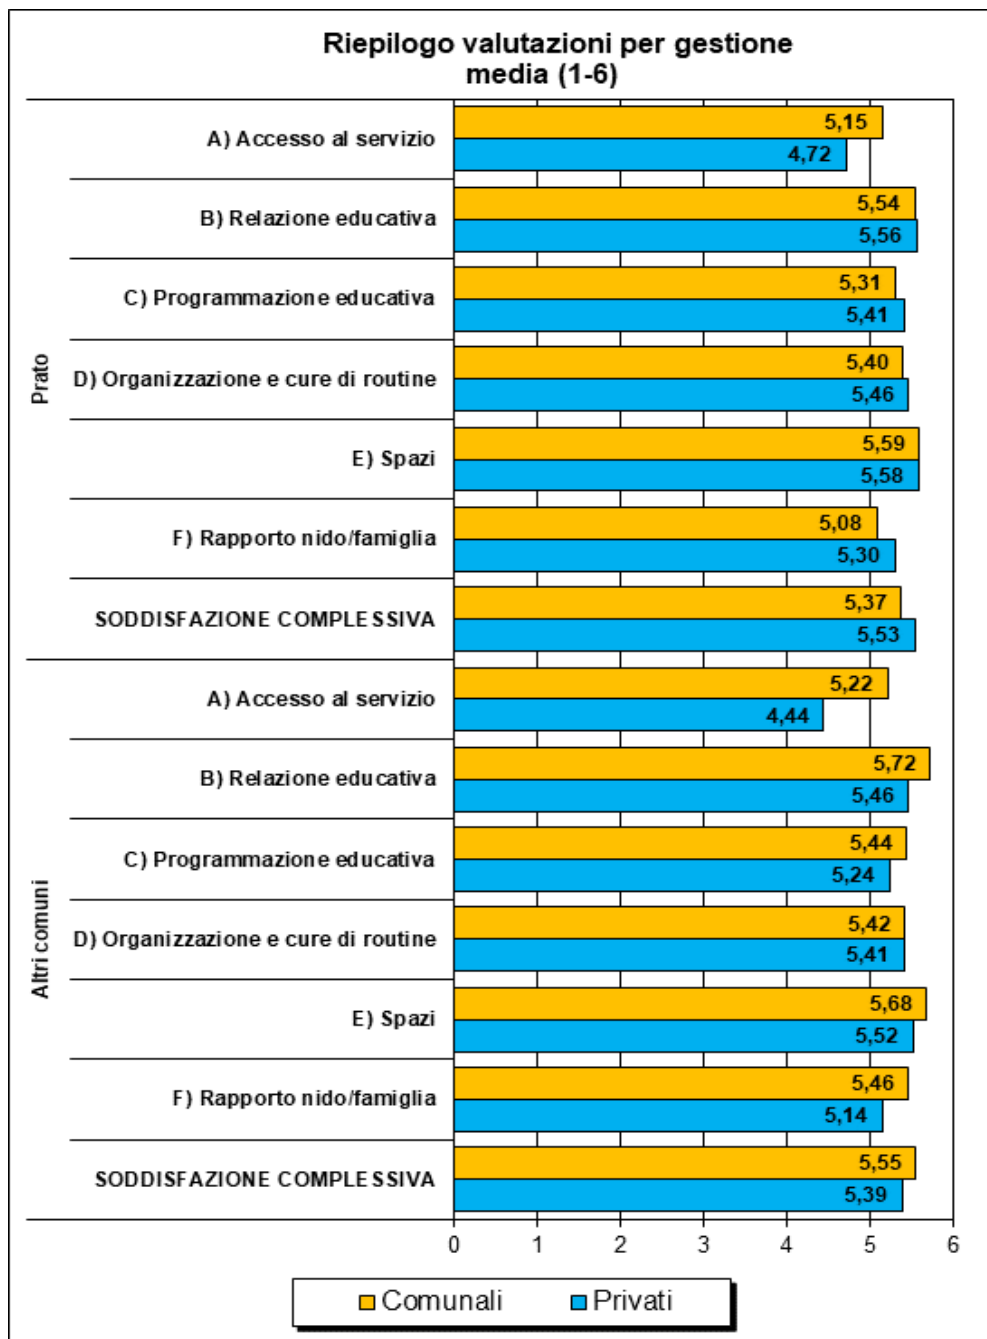

Customer scuole d'infanzia comunali – a.s 2021/2022

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.

Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.


Periodo di rilevazione: 10.06 -13.07.2022

Iscritti: 456

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 456

Questionari compilati: 300 (298 on line, 2 cartacei)

Percentuale di compilazione: 65,79%

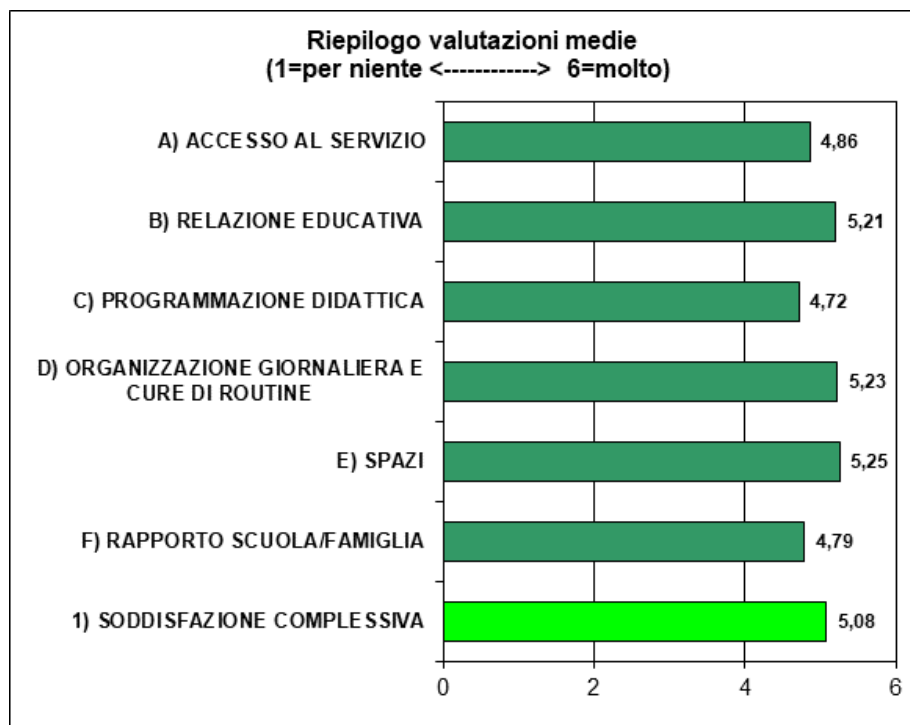

Customer servizio 'GiocaCipi' spazi gioco a.s 2021/2022- GiocaCipi Verde– 18/36 mesi

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 10-28 giugno 2022

Iscritti: 53

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 53

Questionari compilati: 48 (48 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 90,57%

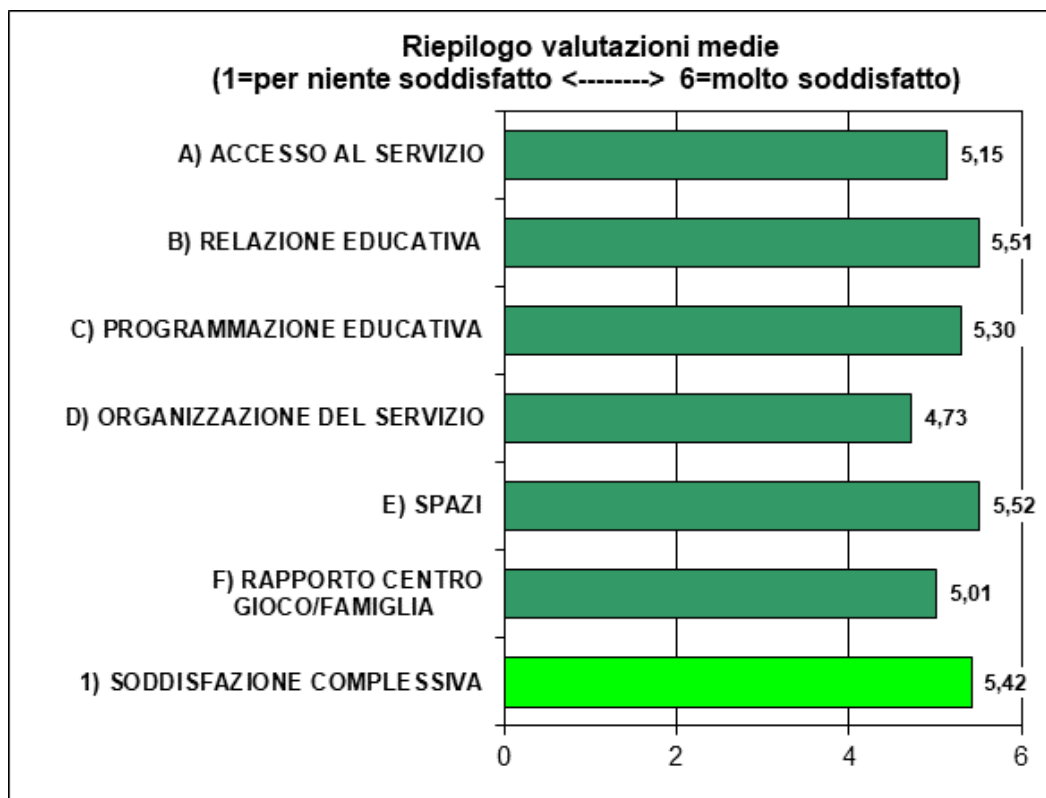

Customer servizi 'GiocaCipì' spazi gioco a.s 2021/2022- GiocaCipì Arancio 3/12 mesi (centro bambini e famiglie)

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 10-28 giugno 2022

Iscritti: 11

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 11

Questionari compilati: 10 (10 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 90,91%

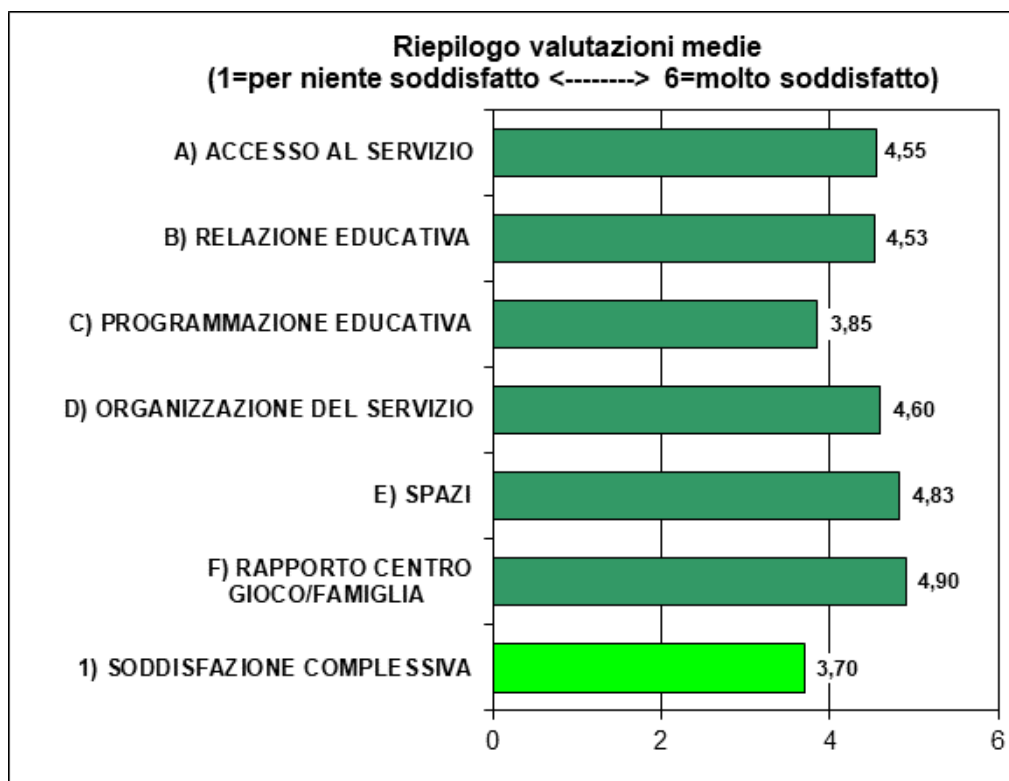

Customer servizio 'GiocaCipi' spazi gioco a.s 2021/2022- GiocaCipi Azzurro– 12/36 mesi (centro bambini e famiglie)

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 10-28 giugno 2022

Iscritti: 30

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 30

Questionari compilati: 24 (24 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 80,00%

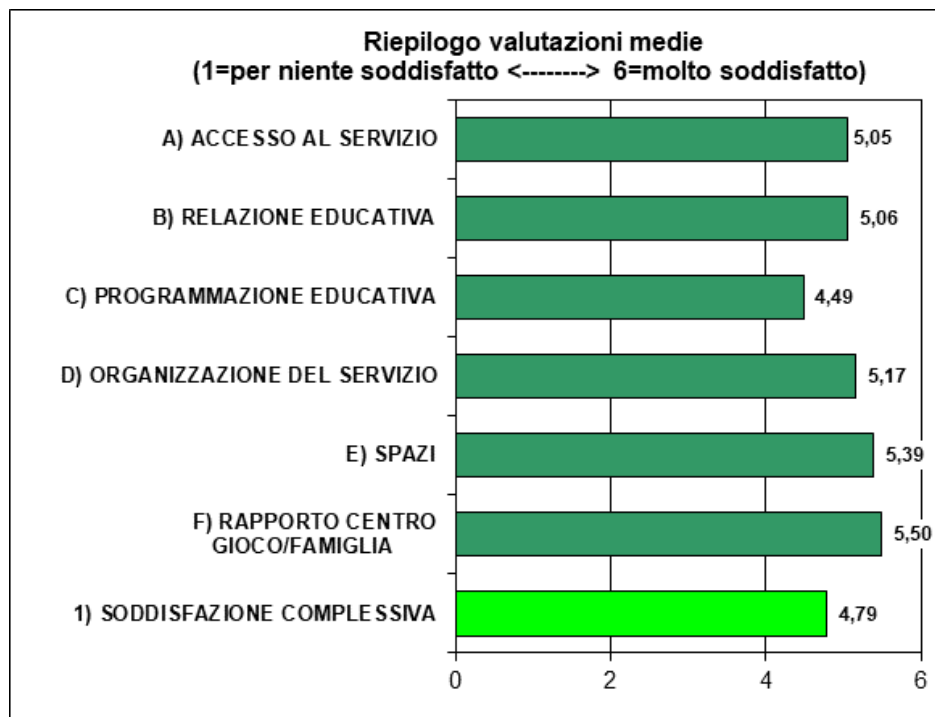


Customer servizio Mensa- personale educativo nidi e materne

Questionario cartaceo compilato dal personale educativo referente per ogni plesso scolastico. I questionari, somministrati ai nidi comunali, sono stati poi trasmessi all'ufficio Pubblica Istruzione per l'inserimento dei dati.

Periodo di rilevazione: 28.02 – 20.05.2022

Questionari compilati: 72

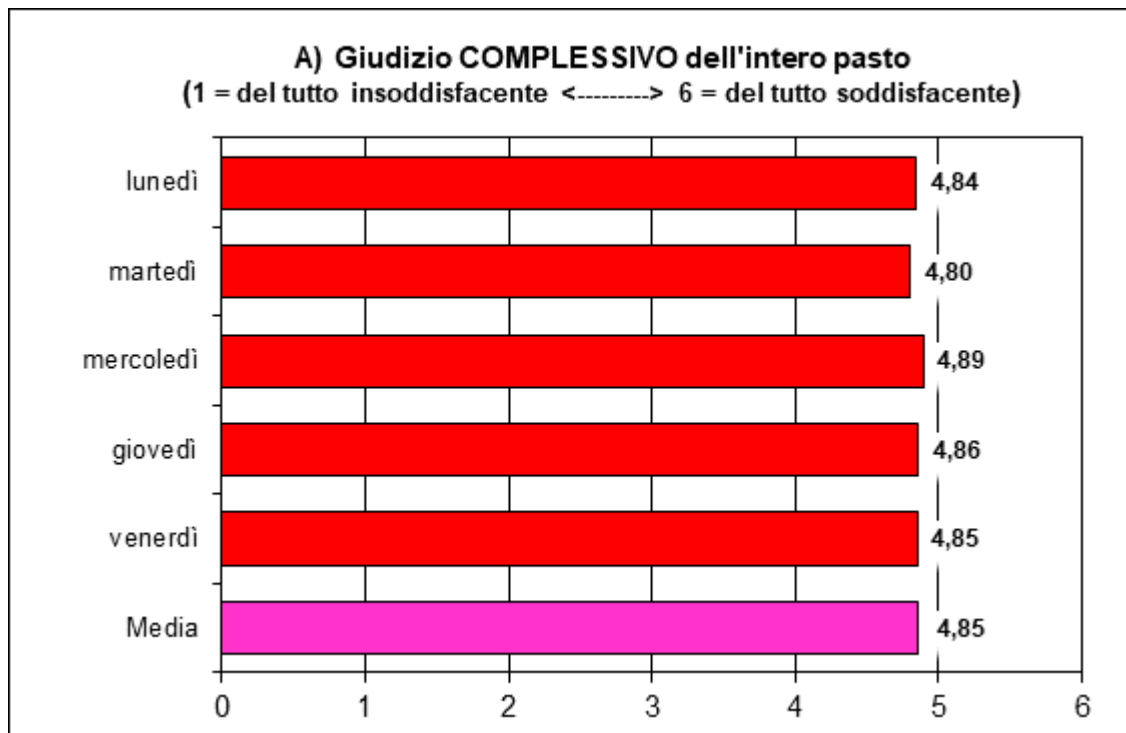


Customer servizio Mensa- personale insegnante

Questionario cartaceo compilato dal personale insegnante referente per ogni plesso scolastico.

I questionari, somministrati alle scuole d'Infanzia e Primarie con servizio di ristorazione in appalto, sono stati poi trasmessi all'ufficio Pubblica Istruzione per l'inserimento dei dati.

Periodo di rilevazione: 28.02 – 20.05.2022

Questionari compilati: 377

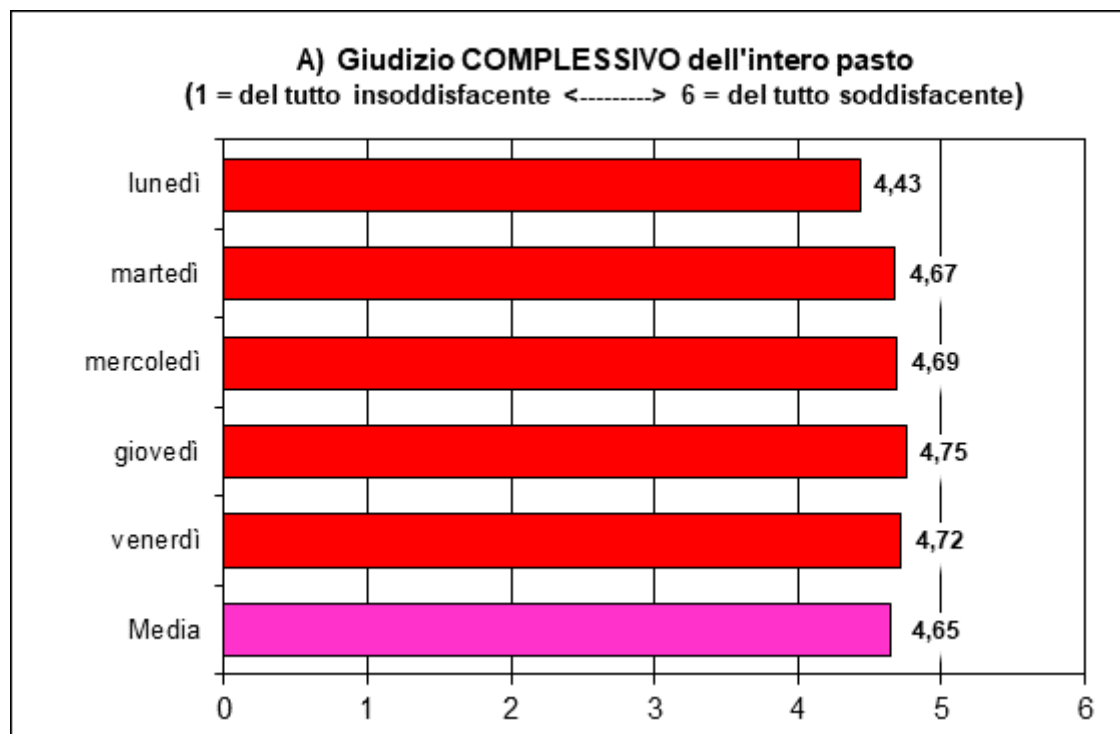


Customer servizio Mensa- dietiste

Monitoraggio effettuato dalle Dietiste mediante questionario compilato direttamente su tablet durante l'anno scolastico. Elaborazione dei questionari somministrati alle scuole d'Infanzia e Primarie servite dai centri cottura esterni.

Periodo di rilevazione: 22.09.2021 – 20.06.2022

Questionari compilati: 233

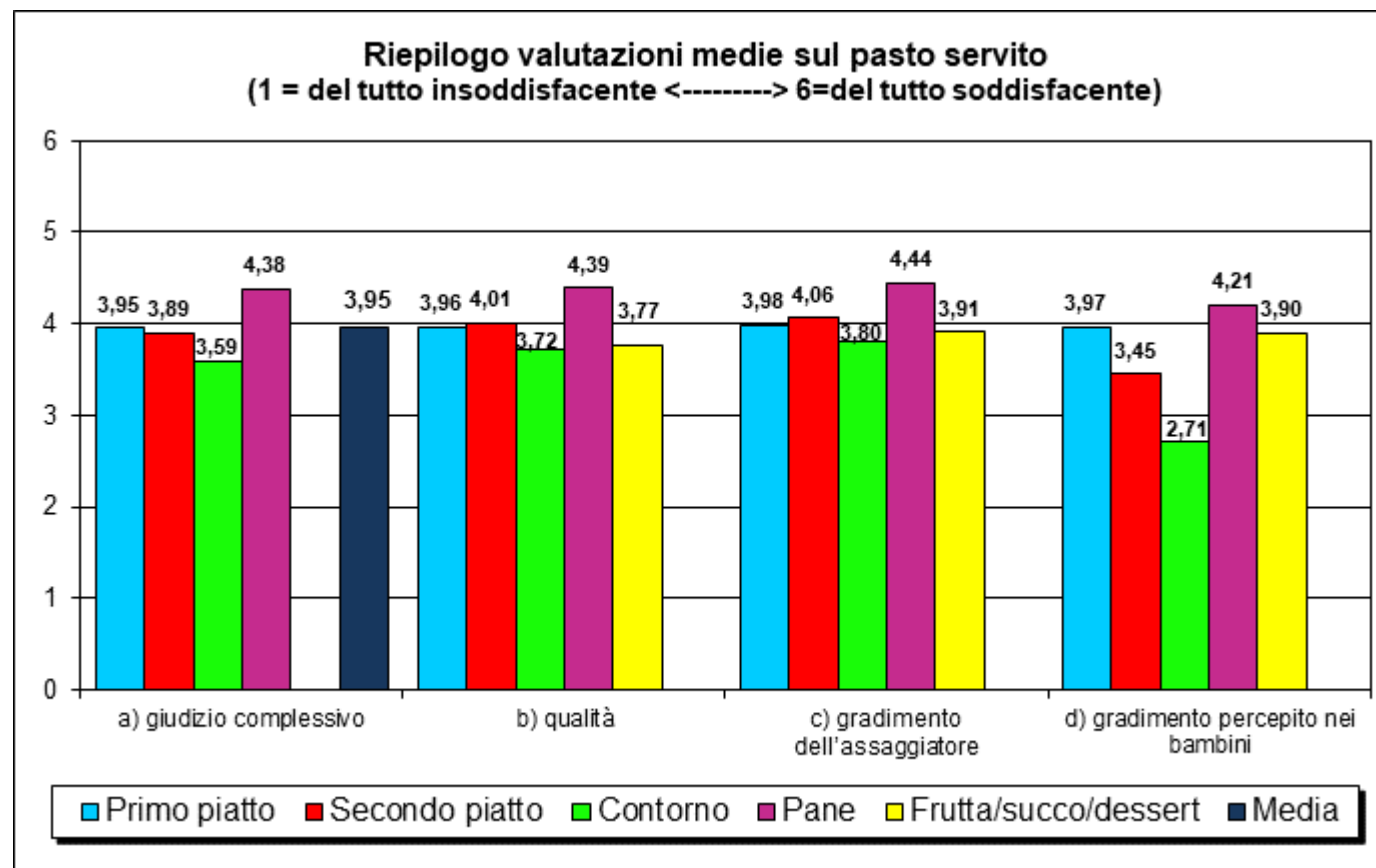


Customer Museo Civico: visitatori

Il monitoraggio viene effettuato continuamente durante tutto l’anno sottoponendo il questionario ai visitatori del Museo

Metodologia adottata: al termine della visita viene richiesta la compilazione di un questionario ai visitatori che possono così esprimere la loro opinione sul servizio offerto.

Questionari compilati: 1.093

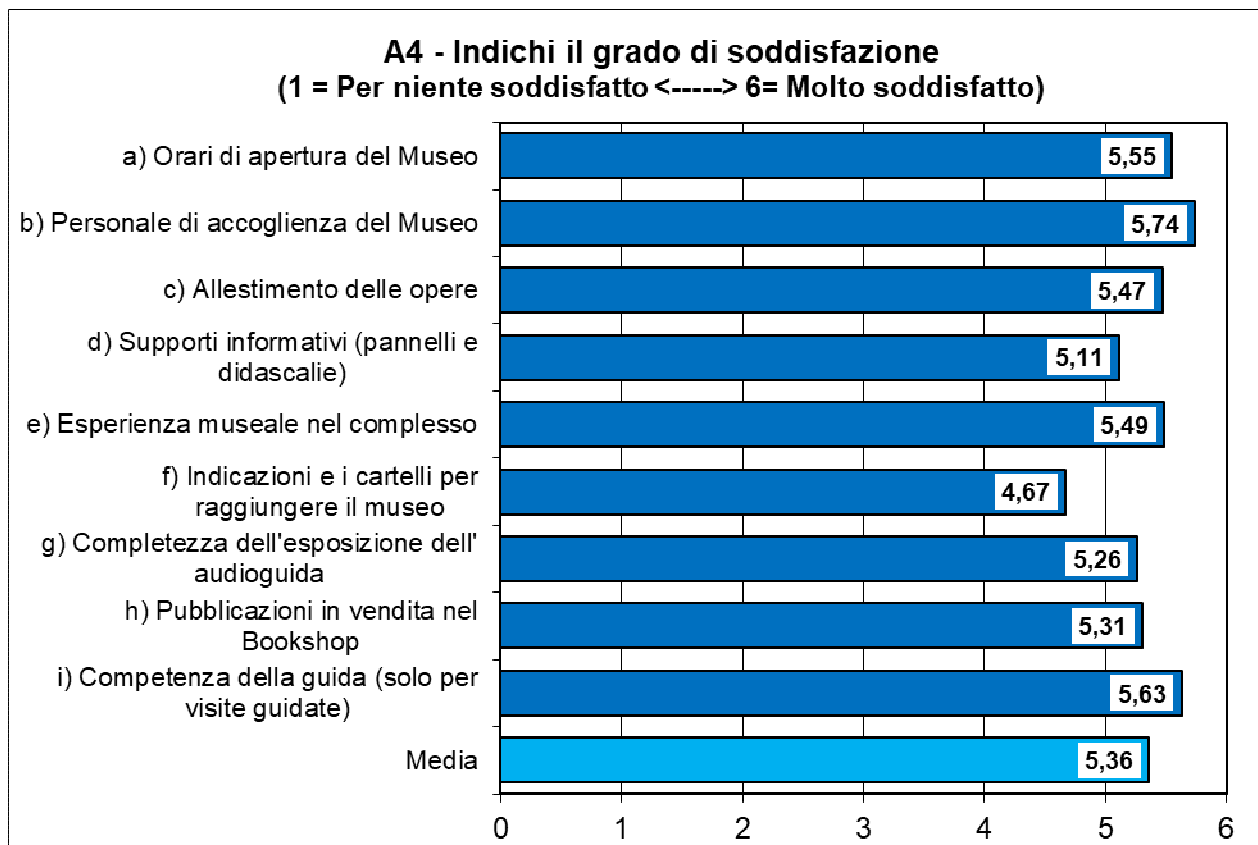


Customer Museo Civico: eventi

Il monitoraggio viene effettuato continuativamente durante tutto l'anno sottoponendo il questionario ai partecipanti agli Eventi al Museo

Metodologia adottata: alla fine di ogni evento organizzato sottoponendo il questionario ai partecipanti.

Questionari compilati: 106

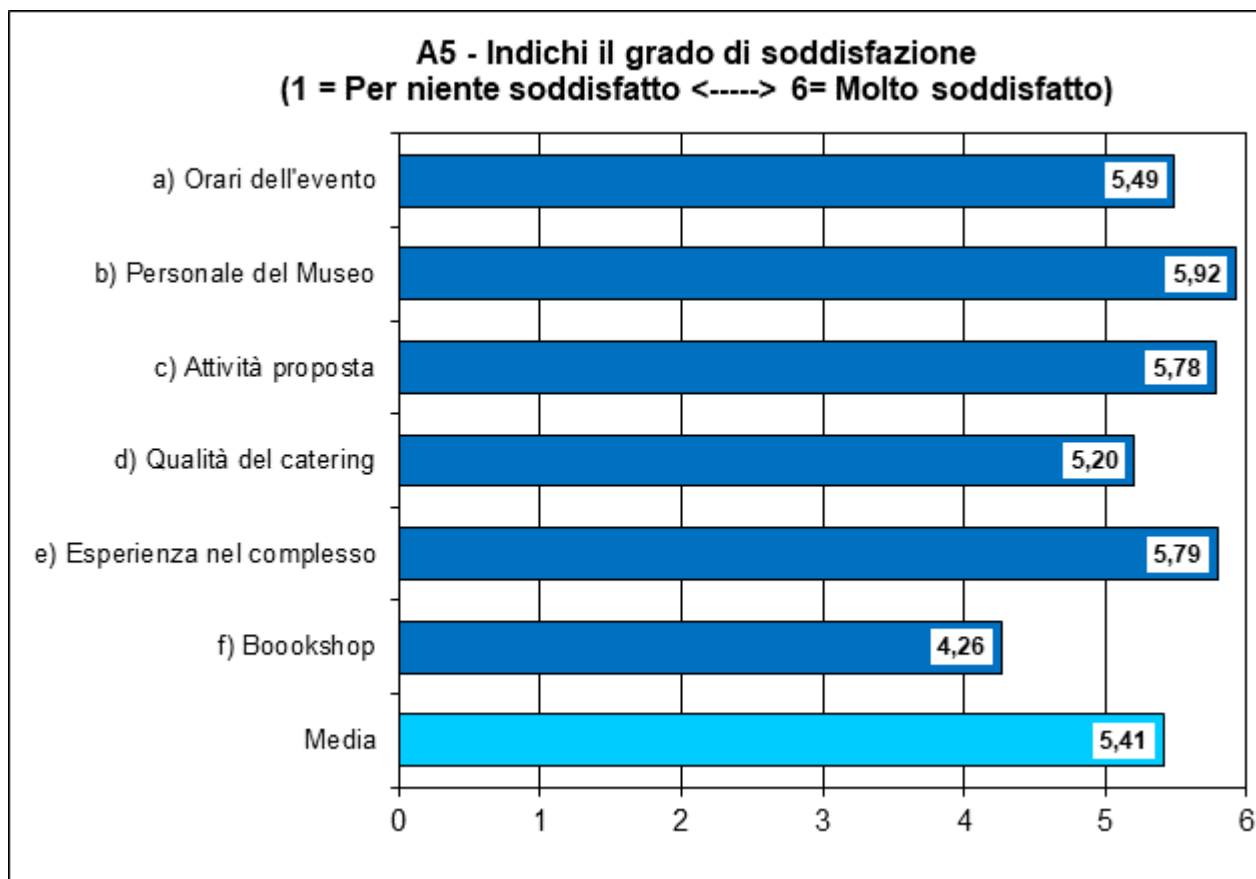

Customer Scuola di Musica G. Verdi


E' stato inviato per mail agli iscritti della scuola di musica (o ai genitori/tutori degli iscritti) l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà (non ricezione della mail/problemi nella compilazione on line).

Periodo di rilevazione: 6 - 31 maggio 2022

Iscritti: 640

Questionari compilati: 316 (295 web, 21 cartacei)

Percentuale di compilazione: 49,38%



Customer Officina Giovani – Officina Teen

Questionario rivolto ai partecipanti ai laboratori.


Periodo di rilevazione: 28/03-20/06/2022

Iscritti: 46

Questionari compilati: 29

Percentuale di compilazione: 63,04%

Modalità di compilazione: questionario web con link al questionario inviato agli studenti tramite WhatsApp.

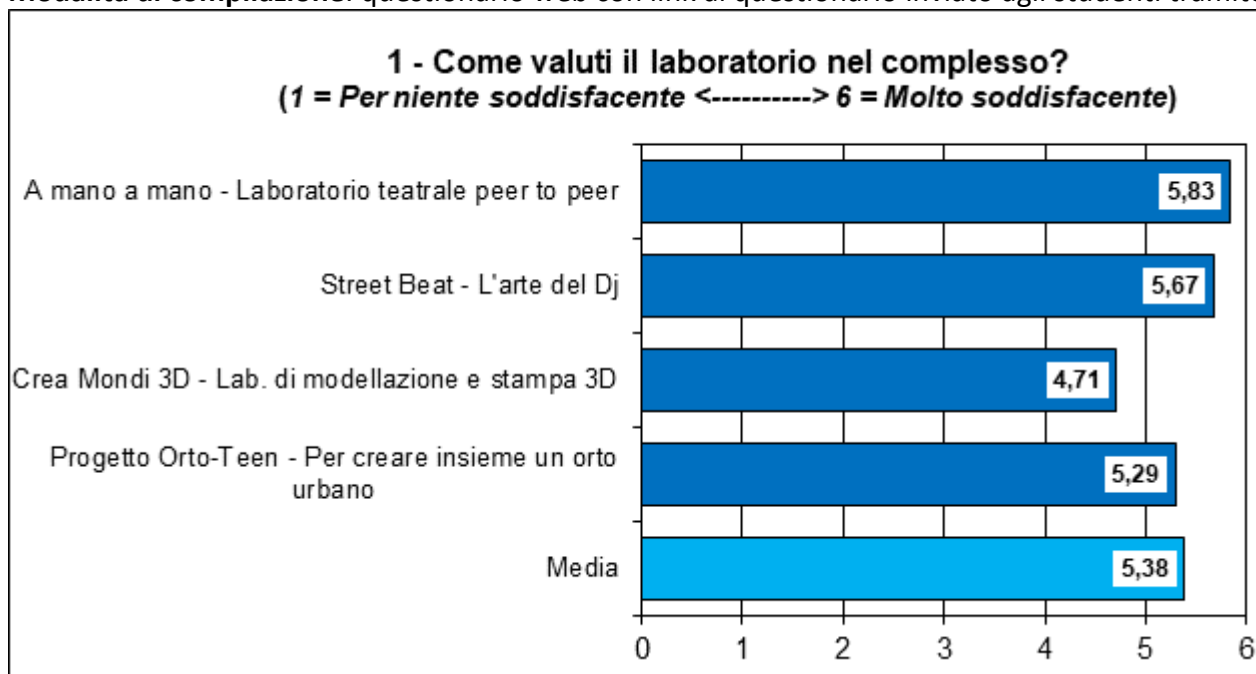

Customer Sportello immigrazione

L'indagine è curata direttamente dall'ufficio immigrazione, con l'ausilio della cooperativa che gestisce lo sportello immigrazione. Il questionario è somministrato agli utenti dello sportello.

N. questionari somministrati: 588

Scala di giudizio: da 1 a 5

Domanda	Media valutazione
Ambiente e modalità di accesso ai locali e ai servizi	4,87
Capacità degli operatori di fornire il servizio con cura e precisione e idonea competenza linguistica	4,87
Attenzione e capacità di ascolto dei bisogni	4,89
Prontezza e rapidità del servizio	4,87
Servizio operatori front office	4,89
Servizio operatori addetti compilazione pratiche	4,91
Servizio e informazioni ricevute in modalità telefonica	4,88
Soddisfazione generale del servizio	4,88

Customer Urp Polizia municipale

L'indagine è curata direttamente dallo sportello Urp della Polizia Municipale. I questionari vengono somministrati in forma cartacea agli utenti dello sportello.

Periodo di rilevazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2022

N. Questionari compilati: 333

% di gradimento: 97,9%

Customer servizio Igiene Urbana

L'indagine è curata direttamente da Alia Spa attraverso interviste a campioni rappresentativi di utenti.

Periodo di rilevazione: 1 gennaio - 28 febbraio 2023

N. interviste sul territorio pratese: 187

% di soddisfatti: 94,4%

Parte 4 – Considerazioni sull’andamento del 2° semestre 2022

Considerando i target triennali previsti nel Dup 2022/2024 e il grafico che riepiloga il livello di raggiungimento complessivo degli obiettivi strategici, possiamo vedere che alcuni obiettivi strategici hanno livelli di raggiungimento molto alti, oltre il 90%: *l’amministrazione al servizio della città, spazi pubblici sicuri e inclusivi, politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità*. Alcuni obiettivi operativi ad essi collegati risultano già raggiunti al 100%, ad esempio: *“verso un nuovo modello di gestione dei servizi socio sanitari”, “riqualificazione spazi pubblici”, “tutela del territorio”* e probabilmente non verranno riportati nella programmazione strategica degli anni successivi. Altri obiettivi operativi, sebbene siano pienamente raggiunti, come *“semplificazione e trasparenza”* e *“tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle diversità”*, possono prevedere per il futuro azioni ulteriori per raggiungere nuovi risultati.

Fra gli obiettivi strategici che risultano ancora lontani dal raggiungimento dei risultati finali troviamo: *una casa per tutti, l’amministrazione che dialoga, sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale, Prato città amica dei bambini*.

Per quanto riguarda la casa, le criticità riguardano principalmente l’edilizia residenziale pubblica, poiché la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel 2022 e la maggior parte delle assegnazioni verrà fatta nel 2023 e nel 2024.

Relativamente allo sport, molti interventi di riqualificazione degli impianti sportivi sono incorso o inizieranno a breve pertanto il raggiungimento del risultato finale è non è immediato. La stessa considerazione può essere fatta per tutti gli altri obiettivi che hanno come risultato la realizzazione di opere pubbliche, il cui avanzamento risulta più lento.

Per quanto riguarda Prato amica dei bambini il percorso di accreditamento riguarderà azioni previste principalmente nel 2023.

Parte 5 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura del Servizio Risorse, Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Tabella 4 – Realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consiag Servizi Comuni srl								
Città Impresa Innovazione e Lavoro IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione	Parcheggi: ottimizzazione della rotazione della sosta in centro storico.	Proseguimento dell'obiettivo per il mantenimento dell'attività di controllo della sosta, in relazione al numero degli stalli	Rapporto Nr.controlli/nr. stalli	Report finale dal quale si rilevi il mantenimento dell'attività di controllo, con un valore dell'indicatore non inferiore a quello dell'annualità precedente	fatto	100%	Considerata la tipologia di attività, come riferimento verrà utilizzato il numero delle sanzioni erogate, derivato dei controlli effettuati. Nel corso del 2021 sono state erogate n. 31016 sanzioni. Nel corso del 2022 sono state elevate n. 32213 sanzioni, a dimostrazione di un aumento dei controlli effettuati.
Città del futuro LA CITTA' CURATA	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze,...)	Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Verifica dello stato sanitario e sicurezza delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici e scolastici nei giardini pubblici, con diametro superiore a 30 cm,	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	E' stata completata la verifica delle alberature con diametro superiore a 30 cm

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			all'interno dell'intero territorio comunale					
			Approfondimento diagnostico strumentale, mirato a verificare la stabilità delle alberature d'alto fusto, emerso dalla precedente analisi visiva	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	E' stato effettuato un approfondimento diagnostico sulle alberature che presentavano difetti tali da richiedere un approfondimento.
		Verde pubblico: Miglioramento del decoro urbano	Mantenimento delle fioriere presenti nel centro storico di Prato	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	Le fioriere sono state tutte mantenute ed sono state piantati all'inizio dell'estate i fiori.
		Verde pubblico: Miglioramento dell'informazione e sull'utilizzo di aree a verde pubblico	Installazione di appositi pannelli segnaletici informativi sul corretto utilizzo delle aree a verde pubblico, nello specifico per le aree di sgambatura cani presenti nel territorio comunale	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	I pannelli sul corretto uso delle aree a sgambatura cani forniti dall'Amministrazione comunale sono stati correttamente installati in ciascuna sgambatura. I pannelli informativi di tutte le aree a verde sono in corso di elaborazione, essendo ancora in fase di decisione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale, la grafica da utilizzare.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Formazione di personale di Consiag Servizi Comuni srl e di personale del Comune di Prato all'utilizzo e gestione di programma specifico per la verifica di ponti e passerelle, ed effettuazione delle verifiche per almeno il 50% di tali tipi di infrastrutture censite	Espletamento corso di formazione ed effettuazione da parte di Consiag Servizi Comuni srl, tramite apposito programma informatico, delle verifiche di ponti e passerelle censite	attestazione di avvenuto completamento del corso di formazione e predisposizione di schede relative ad ogni infrastruttura (ponte/passerella) verificata (almeno il 50% di quelle censite)	Report finale	In corso di realizzazione	90%	Il corso di formazione, relativo sia al censimento delle opere d'arte sia per la parte del monitoraggio, è stato completato con successo da parte di tutti i dipendenti individuati. Il software è già stato installato ed attivato. Alla data attuale, d'accordo con gli uffici comunali, sono stati censiti n. 89 ponti ed è stata effettuata una verifica visiva di tutte le opere censite, al fine di segnalare le principali criticità.
Città del futuro PRATO CITTA' GREEN	Sviluppare il verde urbano per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Realizzazione di aree verdi ad alta densità all'interno del tessuto urbano, con la finalità di contrastare isole di calore, inquinamento e creare spazi socialmente utili	Supporto alla elaborazione del progetto di realizzazione di nuove aree verdi attrezzate e nuovo progetto di forestazione urbana	definizione di elaborato progettuale	definizione di elaborato progettuale	Fatto	100%	Abbiamo dato supporto al nuovo ufficio Forestazione del Comune di Prato nel definire le varie fasi del progetto e nell'individuare i luoghi dove poter effettuare la piantumazione di nuove piante, tenendo conto in particolare la presenza di impianti di irrigazione. Il progetto è al vaglio dei competenti uffici comunali.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città del futuro MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare le infrastrutture stradali a servizio della città	Predisposizione di sistema di gestione della sosta a pagamento rispetto all'intero territorio comunale, con individuazione degli indici di rotazione della sosta	Rilievo dell'intero sistema degli stalli di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale, sua articolazione per vie con corrispondente numero di stalli di sosta e tipologia di tariffa, creazione di relativo database, definizione dell'indice di rotazione per vie o zone omogenee	presentazione di report sulle attività svolte, individuazione di indice di rotazione per vie o zone omogenee	Report finale	fatto	100%	Si è proceduto ad effettuare il rilievo di dettaglio di tutti gli stalli di sosta all'interno della ZTC. Tali dati sono stati inseriti all'interno di un database, sia con dati testuali, sia con georeferenziazione, completo dei dati relativi al tasso medio di occupazione degli stalli.
		Predisposizione di piano della sosta in corrispondenza del comparto di Via Pistoiese oggetto di intervento di riqualificazione, quale piano stralcio e progetto pilota rispetto al più complessivo Piano Urbano della Sosta	Censimento degli stalli di sosta, definizione di piano stralcio della sosta per il comparto di via Pistoiese, completo di relativa politica tariffaria	presentazione progetto	Report finale	fatto	100%	All'interno del comparto di Via Pistoiese si è proceduto come prima attività di rilievo al censimento di tutti gli stalli, comprese anche le aree dove la sosta è libera. Dopodichè si è proceduto a proporre gli interventi ritenuti necessari per riorganizzare il sistema della sosta nel comparto. Il progetto è al vaglio dei competenti uffici comunali.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE</p>	<p>Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci</p>	<p>Presentazione di progetto per la ridefinizione delle varie zone/aree per la sosta e relative categorie di permessi</p>	<p>Completamento della predisposizione e della stesura del progetto</p>	<p>presentazione progetto</p>	<p>Report finale</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>A seguito della ricognizione effettuata, è stato presentato il progetto all'Amministrazione comunale, con le modifiche ritenute necessarie per poter migliorare il sistema di gestione dei permessi.</p>
<p>Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'</p>	<p>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</p>	<p>Realizzazione di sistema gestionale per la presa in carico delle segnalazioni relative alle problematiche dello stato manutentivo stradale e correlata fornitura di risposta finale al cittadino/segnalante</p>	<p>Predisposizione ed aggiornamento di sistema gestionale informatizzato, definizione modalità di trasmissione/ricevimento segnalazioni, comunicazione di avvenuta presa in carico segnalazione al cittadino/segnalante, comunicazione al cittadino/segnalante e dell'esito finale attività espletata a seguito della segnalazione</p>	<p>Nr. segnalazioni ricevute, Nr. risposte presa in carico, Nr. Risposte esito finale</p>	<p>Report finale</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>E' stato realizzato il portale del cittadino, tramite cui possono essere inviate segnalazioni. Il link è stato comunicato ai competenti uffici comunali, i quali stanno pianificando con il competente assessore il rilascio alla cittadinanza.</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Edilizia Pubblica Pratese spa								
Città Diritti e Opportunità UNA CASA PER TUTTI	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Aumentare il patrimonio di alloggi ERP incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e recupero dell'esistente. Migliorare la qualità degli alloggi assegnati con interventi di verifica e di manutenzione straordinaria. Intervenire con azioni di	Partecipare a bandi, anche in collaborazione con i competenti uffici comunali, per reperire risorse finalizzate a nuove costruzioni o ristrutturazioni. Intervenire sugli alloggi di risulta e renderli disponibili per gli assegnatari, con particolare attenzione alle risorse del PNRR. Risistemazione degli alloggi in seguito a fenomeni di degrado e povertà (es. ripristino caldaie e impianti interni, anche su proposta servizio sociale professionale). Verifica e studio di fattibilità, con eventuale	a) nr. alloggi risistemati - b) nr interventi di ripristino straordinari effettuati c) studio di fattibilità predisposto in condivisione con Comune di Prato e eventuale attivazione di procedure per il passaggio alloggi emergenza ad ERP.	a) 10 b) 10 c) 1 report	a) fatto - 12 b) fatto - 16 c) in corso	a) 120% b) 160% c) 50%	a) Nr. 10 alloggi di risulta con fondi propri del comune di Prato, Nr. 2 alloggi con fondi propri del comune di Vernio. b) DG RT 648/2020 ripristino parapetti pericolanti in ca via carso. C) Durante i numerosi incontri tenuti con il comune di Prato in merito al passaggio in gestione EPP relati vanete agli alloggi baitor, sono emerse e risolte alcune criticità. Costituzione condominio per proprietà mista, nomina amministratore esterno, approvazione bilanci di esercizio.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		<p>controllo e verifica delle situazioni reddituali e patrimoniali degli assegnatari per agevolare il turn over in funzione dello stato di bisogno. Verificare e attivare fonti di finanziamento del PNRR. Aprire una fase di confronto con l'AC per verificare la possibilità di gestire tutto o parte del patrimonio edilizio di emergenza alloggiativa come alloggi ERP, previa attivazione del LODE e della Regione Toscana.</p>	<p>attivazione, del passaggio in gestione EPP come alloggi ERP di parte o del totale degli alloggi di emergenza alloggiativa per assicurare la gestione condominiale e la manutenzione.</p>					

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
So.ri spa								
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci	Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP, CIMP, Canone unico patrimoniale	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2022 >= importo previsto nel bilancio di previsione	fatto	100%	eseguita attività ricerca evasione ed elusione
		Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	importo incassi 2022 >= 2021	fatto	100%	ripresa completa delle attività di riscossione
		Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività effettuate	Implementazione portale web di comunicazione con gli utenti attraverso lo sviluppo dei servizi di informazione e dialogo con l'utenza e dei nuovi canali di pagamento	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	numero utenti serviti >= 2021 ; apertura nuovi strumenti di comunicazione con gli utenti	fatto	100%	aumento del volume di accessi a causa delle maggiori attività
Fondazione Parsec								

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città del futuro LA CITTA' CURATA</p>	<p>Tutelare il territorio e gli animali</p>	<p>Interventi di riqualificazione del Parco del CSN e del Parco di Galceti Villa-Fiorelli. Collegamento tra Parco CSN e Villa Fiorelli con apertura della nuova biglietteria, dello shop e di altri servizi di accoglienza ai visitatori. Progettazione definitiva della nuova sede del Museo di Scienze Planetarie presso Villa Fiorelli nell'ambito della nascita del Parco delle Scienze e della Cultura.</p>	<p>Chiusura della fase autorizzatoria per i lavori all'interno del Parco del CSN e avvio dei lavori di separazione dell'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici. Stesura dei progetti di riqualificazione del Parco di Galceti. Avvio dell'iter autorizzatorio per la realizzazione del collegamento tra Villa Fiorelli e il Parco CSN. Attribuzione incarico per la progettazione definitiva della nuova sede del Museo di Scienze Planetarie presso Villa Fiorelli nell'ambito della nascita del Parco delle Scienze e della Cultura</p>	<p>Implementazione delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali. Avvio dei lavori di separazione delle aree a diversa destinazione presenti nel parco. Avvio delle fasi di progettazione definitiva.</p>	<p>Incremento della ricettività per la cura dei selvatici. Separazione delle aree a diversa destinazione. Report relativo allo stato dell'arte per la progettazione definitiva degli interventi.</p>	<p>In corso di realizzazione</p>	<p>0%</p>	<p>E' stata conclusa la fase autorizzatoria con un diniego da parte della Soprintendenza. Si procede a verificare eventuali altre soluzioni possibili per gli interventi di ammodernamento del Parco e per il rilancio dell'ex CSN.</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Associazione Camerata Strumentale Città di Prato								
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	svolte 35 attività su 25 programmate	140%	le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentazione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	svolte 30 attività su 31 programmate	97%	le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		comunicazione						
Fondazione per Arti Contemporanee in Toscana								
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIE RO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché l'Urban Center diventi centro di elaborazione e di diffusione delle pratiche di forestazione, di economia circolare di riqualificazione urbana, costituendo strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative	Programmazione e gestione attività Urban Center	calendario degli eventi	report attività svolta	fatto	100%	SEEDS - International Symposium of Landscape Urbanism 16 - 17/12/2022, due giorni di confronto sul tema del Landscape Urbanism, con il Simposio internazionale Seeds.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto	100%	Second Life - Tutto torna - 30 opere di giovani artisti per raccontare la sostenibilità - 2/12/2022 - 9/1/2023, mostra itinerante nata dal concorso promosso da Alia Servizi Ambientali SpA.
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto	100%	La Rete del Contemporaneo connette 8 realtà museali d'arte contemporanea Toscane:, Firenze, Prato, Pistoia, Carrara, Livorno, Colle di Val d'Elsa (SI), San Gimignano (SI), San Giovanni Valdarno (AR).

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Fondazione Museo del Tessuto								
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché l'innovazione e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: collaborare al progetto di crescita della reputazione del distretto attraverso il progetto TIPO. Turismo industriale Prato.	Progettazione e gestione attività TIPO	Programma delle attività	report attività svolta	in corso	50%	A partire da ottobre 2022 è in corso la seconda edizione del progetto che terminerà ad aprile 2023 con il festival di tre giorni. Le attività per l'ultimo trimestre del 2022 sono quindi state portate a compimento ma nella sua interezza il progetto (a cavallo di due anni) è a metà del suo percorso. Per quanto riguarda il 2022 la Fondazione ha partecipato alle riunioni di progetto e svolto le attività assegnateli dai protocolli di collaborazione.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>report attività svolta</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>Concluse nel mese di dicembre le attività progettate dal sistema museale Pratomusei nell'ambito dei progetti " Cantiere digitale", rivolto alle scuole, e "Collecionando esperienze", rivolto alle famiglie. Le attività sono state gestite e finanziate nell'ambito del bando 2022 Regione Toscana-sistemi museali. A partire da settembre sono state portate avanti le azioni di promozione e comunicazione delle attività scolastiche programmate per il nuovo anno scolastico 2022/2023 che hanno visto l'allargamento delle rete museale con l'ingresso di Castello e Cassero. Erogare le attività alle scuole e alle famiglie nel periodo ottobre/dicembre. Sul fronte dell'accessibilità e dell'inclusione, sono state portate a compimento le attività per i pubblici speciali inerenti i vari progetti che vedono una partnership con il Centro Pecci, Museo di Scienze Planetarie e alcune associazioni del terzo settore del territorio. Sul fronte del fundraising si segnala la gestione della campagna di adesione al Supporter Club (club di aziende del territorio sostenitrici del Museo) e la</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								partecipazione a bandi, sia di respiro nazionale che europeo. Avviate le attività del progetto “imPatti creAttivi” a cui la Fondazione partecipa in qualità di partner sul bando Fondazione Cassa di Risparmio di Prato (presentato dal capofila Cooperativa Pane e Rose) per la promozione di patti educativi di comunità nella città di Prato (insieme a Metastasio, Camerata, Centro Pecci) – e quelle del progetto “PRATO phygital – Sinergia creativa per la competitività” sul bando del MISE relativo all’impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi (insieme a Manifatture Digitali).

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto	100%	La programmazione espositiva si è caratterizzata dall'apertura al pubblico della mostra "Mr & Mrs Clark", organizzata in collaborazione con la Fondazione Sozzani di Milano (16 settembre 2022-8 gennaio 2023). La mostra, dedicata a due designer di moda degli anni Sessanta e Settanta, ha aperto il museo ad un pubblico di cultori della moda appassionati, anche grazie alla rete di contatti e sinergie che si sono create dalla collaborazione con la Fondazione Sozzani. Questa collaborazione, unita alla qualità del progetto espositivo, ha dato ampia visibilità al Museo sulla stampa nazionale e internazionale. La mostra è stata accompagnata anche da una campagna di promozione sui social e da un'efficace campagna di advertising che ha fatto conoscere la mostra anche ad un target di pubblico giovanile. E' proseguita inoltre la gestione della mostra "Due secoli di Textile e Fashion Design".

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>report attività svolta</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>"Io non muoio più", incontri, letture, performance organizzato in sinergia tra Teatro Metastasio, Arci Prato, Centro anti violenza La Nara, Biblioteca Lazzerini, Centro Salute Donna e CGIL Prato, per stimolare riflessioni sulla violenza di genere, c/o circoli ARCI. Luglio "School of Met", n. 6 incontri ispirati all'attività del regista Milo Rau fautore di una radicale relazione fra arte e attivismo politico, per studenti di scuole secondarie di secondo grado di Prato. "I principi fondamentali", ciclo di laboratori gratuiti da ottobre a dicembre 2022 condotti dallo scrittore e giornalista Graziano Graziani, incentrati attorno ai temi della costituzione e dell'utopia e destinati a diversi gruppi di cittadini che spesso si trovano ai margini del dibattito politico e pubblico (Università tempo libero, La Nara, Pane e Rose, creativi e artisti di Prato); l'intento è di riscoprire e sperimentare la bellezza e la poesia della Costituzione della Repubblica Italiana. Hanno portato alla definizione di una Costituzione ideale di Prato presentata al Metastasio il</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								14.12.2022.
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	report attività svolta	fatto	100%	Al Teatro Magnolfi: "Laboratorio teatrale" in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale della ASL e Teatro di Piazza o d'Occasione, da ottobre a dicembre; "Laboratorio delle arti e della scena", formazione propedeutica teatrale per le nuove generazioni, da novembre a dicembre. INCONTRI CON LE COMPAGNIE E PRESENTAZIONI IN CLASSE per studenti 14/20 anni allo scopo di creare spettatori consapevoli grazie alla visione critica della programmazione dei diversi teatri coinvolti Incontri dal vivo prima della visione dello spettacolo, visione, commenti e condivisioni post spettacolo. "Massimiliano Civica presenta la nuova stagione del MET", ottobre/novembre, 3 incontri presso circoli ARCI.

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>report attività svolta</p>	<p>fatto/in corso di realizzazione</p>	<p>85%</p>	<p>A. Organizzazione della LIV Settimana di studi (maggio 2023, presso il ridotto del teatro Politeama Pratese. B. Organizzazione del Seminario Datini/ESTER (maggio 2023) C. Gestione della biblioteca specializzata e degli archivi D. Realizzazione e presentazione, insieme al Museo del Tessuto, del volume "Un panno medievale dell'azienda pratese di Francesco Datini" E. Implementazione dei contenuti della piattaforma Internet Archive. La LIV Settimana di studi si terrà sia in presenza che su piattaforma online, per favorire gli studiosi che per motivi diversi avranno difficoltà a venire a Prato. Il seminario Datini/ESTER si terrà esclusivamente in presenza</p>
	<p>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</p>	<p>Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>report attività svolta</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>A. Organizzazione di laboratori per scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con la Casa Pia dei Ceppi B. Presentazione alla cittadinanza, presso il castello dell'imperatore del DVD "Francesco Datini da Prato"</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		un sistema coordinato di comunicazione						
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIE RO, IMPRESA, LAVORO</p>	<p>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</p>	<p>Operare affinché le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale</p>	<p>Progettare e gestire le attività di Prato Circular city</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>report attività svolta</p>	<p>Completato</p>	<p>100%</p>	<p>– Completato il percorso all'interno del Progetto URGE - Fase II con elaborazione Roadmap e Integrated Action Plan. Attività conclusa ad Aprile 2022. - Completata l'attività per l'elaborazione della Guida per una Strategia Circolare per le città (modello INNOMED-UP), conclusa al 31/12/2022. - Supporto allo sviluppo del progetto Prato Smart City-Attività 2022 completate al 31/12/2022. - Partecipazione e supporto all'organizzazione dei tavoli di lavoro di PCC, in particolare: . Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Prato, nell'ambito del Tavolo "Distretto Tessile"; . Sviluppo dei progetti Prato Smart City e Casa delle Tecnologie Emergenti – PRISMA, nell'ambito del Tavolo "Transizione Digitale" . Supporto alla predisposizione del documento Next Generation Prato e adesione al protocollo di Governance.</p>

Ambito e obiettivo strategico dup 2022/2024	Obiettivi Operativi	Obiettivi Gestionali 2022/2024	Azioni 2022	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								. Supporto a GIDA per le attività relative al Tavolo "Acque Reflue Urbane"
