



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 1° semestre 2023
dati al 30/06/2023

INDICE

<p>PREMESSA Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo Struttura del Report Il contesto di riferimento</p>	<p>Pag. 3</p>
<p>PARTE 1 1.1 Il processo di misurazione adottato 1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi operativi 1.3 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici</p>	<p>Pag. 8 Pag. 9 Pag. 61</p>
<p>PARTE 2 Il grado di realizzazione finanziaria</p>	<p>Pag. 63</p>
<p>PARTE 3 Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche</p>	<p>Pag. 72</p>
<p>PARTE 4 Considerazioni sul 1° semestre 2023</p>	<p>Pag. 87</p>
<p>PARTE 5 Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate</p>	<p>Pag. 88</p>

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.

In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto:

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo

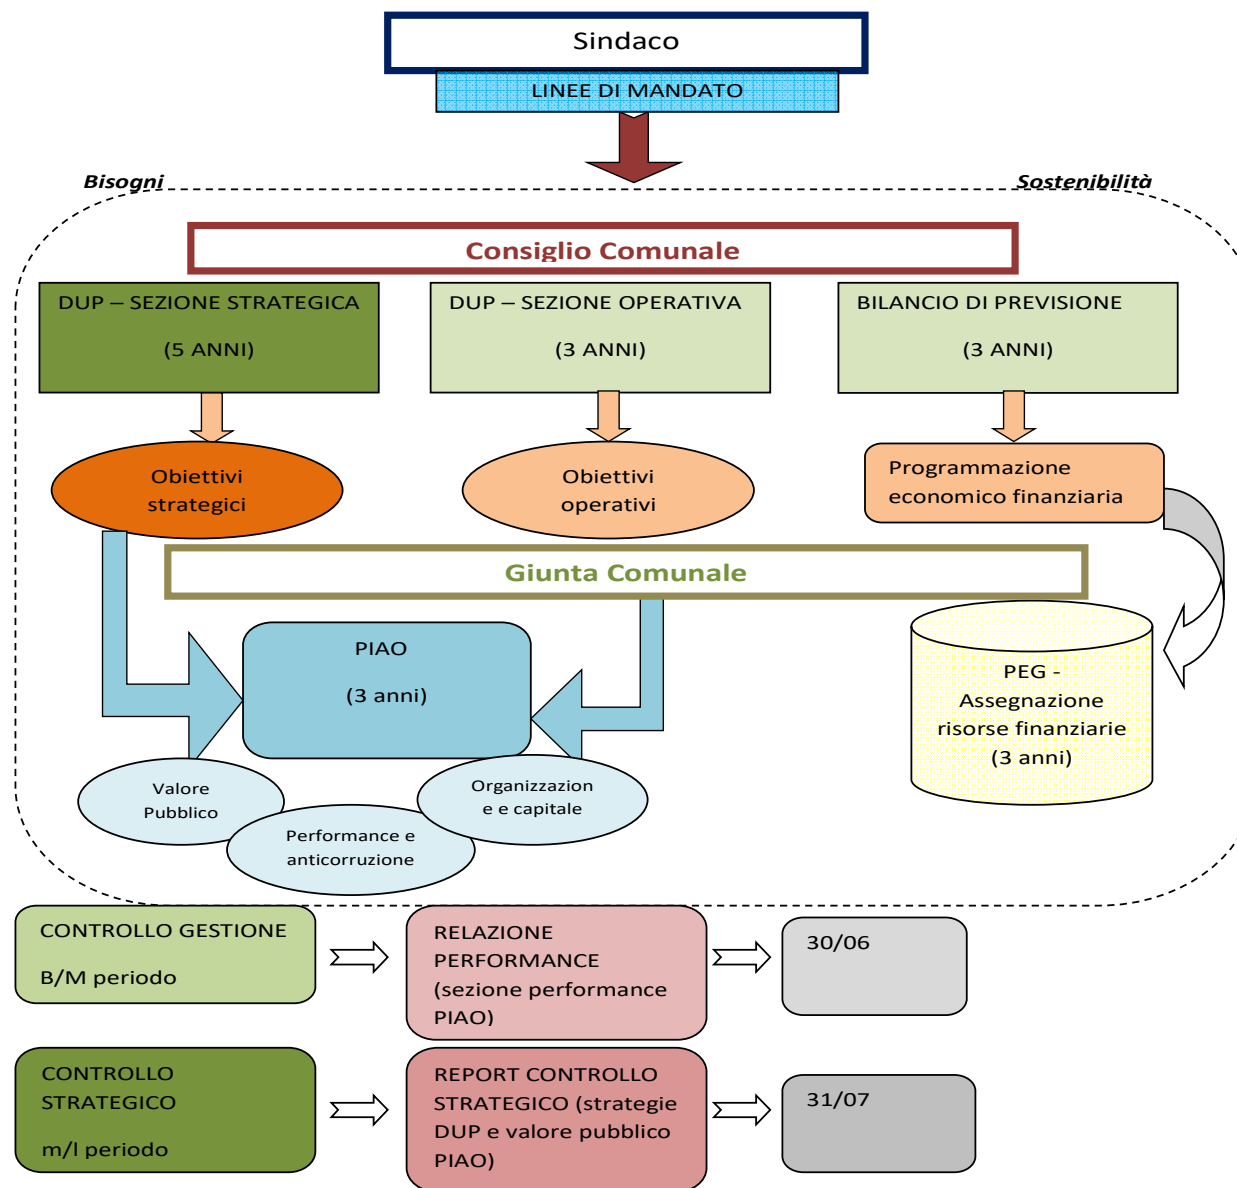


Figura 1 – Processo di pianificazione e controllo



Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2023-2025	Delibera di Consiglio n. 55 del 29/09/2022
DUP 2023/2025 – Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 26 del 20/04/2023
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025
Bilancio di Previsione 2023/2025	Delibera di Consiglio n. 27 del 20/04/2023
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025	Delibera di Giunta n. 160 del 16/05/2023
Piano esecutivo di gestione 2023-2025 - approvazione assegnazione risorse	Delibera di Giunta n. 160 del 16/05/2023
Piao 2023-2025 e Peg 2023-2025- stato d'avanzamento al 30/06/2023	Delibera di Giunta n 251 del 25/07/2023

STRUTTURA REPORT

Il presente REPORT è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione Comunale all'interno del quinquennio di mandato, pertanto vengono verificati gli obiettivi e i relativi risultati previsti al 2024.

Per ogni obiettivo operativo vengono riportati i principali risultati raggiunti dal 2021 al 30/06/2023. Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi viene valutato l'avanzamento degli indicatori di impatto. Tuttavia alcuni indicatori non sono misurabili alla data del 30/06 (es. indicatori provenienti da banche dati nazionali oppure indicatori il cui valore è disponibile al 31/12), pertanto si è proceduto ad aggiornare la percentuale di avanzamento solo per quegli obiettivi operativi che hanno indicatori misurabili al 30/06/2023.

Il report si compone di 4 parti:

La prima sezione riporta i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo dal 2020 al 30/06/2023. Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi è calcolato con riferimento agli indicatori di impatto approvati nel Dup 2022/2024 integrato dai nuovi obiettivi operativi approvati nel Dup 2023/2025.

La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite) aggregati per obiettivi strategici.

La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare fino alla sua conclusione e permette, se correttamente alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori.

La quarta sezione riporta le considerazioni sull'andamento delle strategie nel 1° semestre 2023.

La quinta sezione riguarda il grado di realizzazione al 30/06/2023 degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipate.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Anche nell'anno 2023 si perpetuano gli effetti della guerra in Ucraina, con prezzi dell'energia e delle materie prime ancora alti, con conseguenti incrementi anche dei prezzi al consumo. Per contrastare l'elevato livello di inflazione la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, aumentando il costo dell'indebitamento e rendendo particolarmente onerosi i mutui, con ripercussioni sulle famiglie sulle imprese.

Anche per gli enti locali l'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime è stato notevole, incidendo pesantemente sui propri bilanci.

A seguito dei finanziamenti PNRR ottenuti nel 2022, nel corso del 2023 è iniziata la fase operativa, attraverso la progettazione e l'indizione delle gare. Inoltre, le incertezze a livello governativo sulla possibilità di cambiare la linea di finanziamento di alcuni interventi già finanziati con il PNRR, non aiutano l'amministrazione nel portare avanti i lavori con celerità.

Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

1.1 Il processo di misurazione adottato

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto **un quarto ambito strategico** (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** declinati, a loro volta, in **48 obiettivi operativi**. Gli obiettivi operativi sono declinati a loro volta in obiettivi di performance, così come risulta nella figura seguente.

Ciò significa che gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli

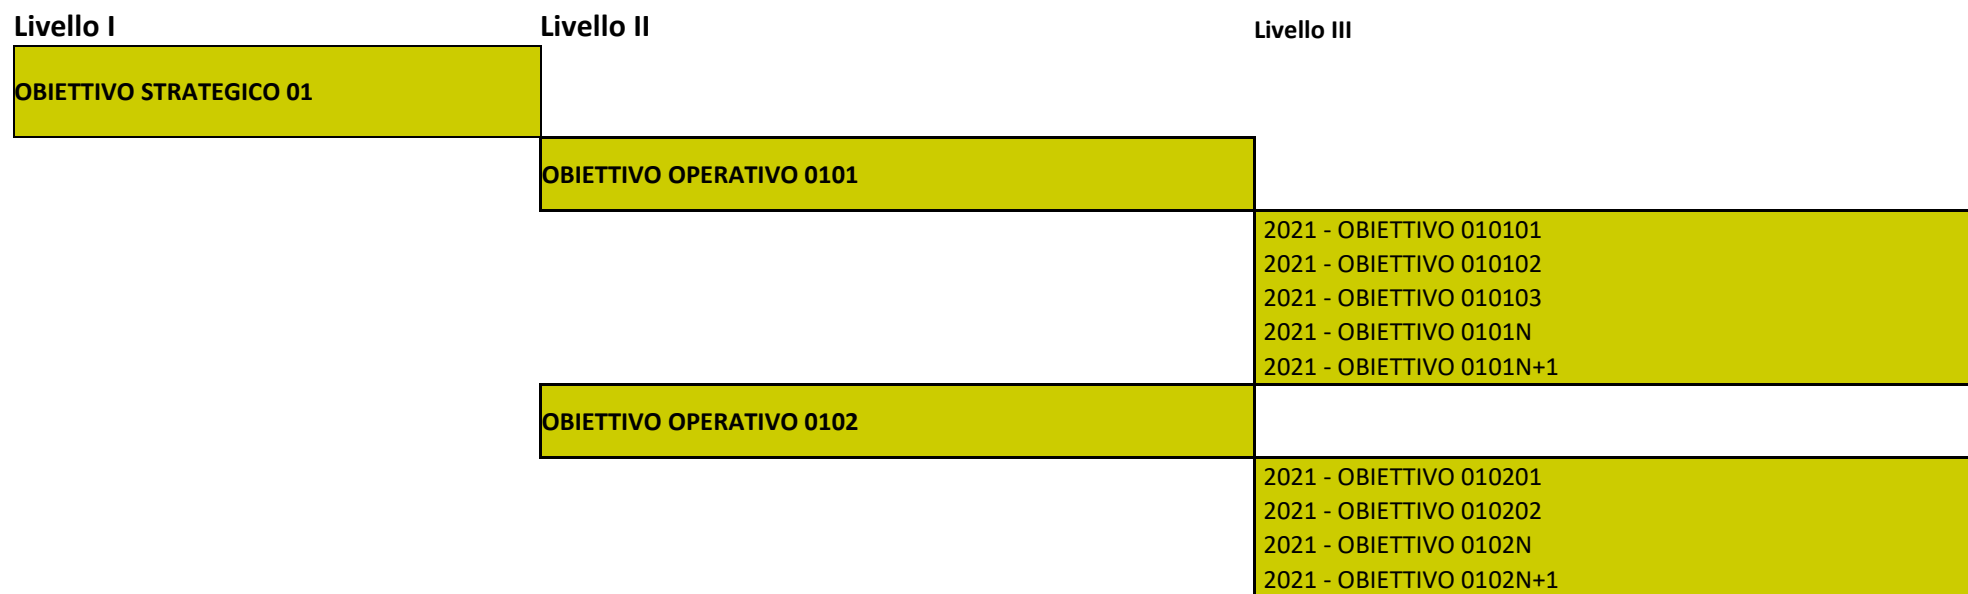


Figura 2 – Struttura albero di programmazione

Il presente report esamina l'avanzamento delle strategie previste al 2024, anno di fine dell'attuale mandato, prendendo quindi come base gli obiettivi operativi del Dup 2022/2024, integrati con i nuovi obiettivi operativi inseriti nel Dup 2023/2025 ma che prevedono risultati già nel 2024.

Ad ogni obiettivo operativo sono stati associati degli indicatori di impatto con dei target attesi alla fine del mandato.

Nel paragrafo seguente, per ogni obiettivo strategico, vengono riportati i risultati raggiunti a livello di obiettivo operativo dal 2020 al 30/06/2023 e la percentuale di realizzazione degli obiettivi operativi con riferimento al grado di raggiungimento degli indicatori di impatto.

Per alcuni obiettivi operativi non è stato possibile avere il valore di alcuni indicatori al 30/06/2023, pertanto la percentuale di avanzamento sarà la stessa del 31/12/2022. Si tratta di tutti gli obiettivi operativi rientranti nell'obiettivo strategico 1- Distretto manifatturiero, impresa e lavoro; 3- Cultura e turismo come opportunità di crescita del territorio; 5-Rigenerazione urbana; 7-Città Curata;

1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi operativi

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	-iniziato progetto Smarty Smes per la diffusione nelle p/m imprese di nuove tecnologie e modelli di business innovativi; -adesione al progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda -presentato progetto PRISMA Casa tecnologie emergenti	-individuate le sedi del progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) presso il Pin , l'ex CREAM e la Medialibrary -bando per progetti di R&S nelle imprese del settore tessile e moda -bando per start up con alto potenziale di innovazione tecnologica che parteciperanno al	-Inaugurata sede PRISMA in via Galcianese -bando start up con alto potenziale di innovazione da inserire nel programma di accelerazione -elaborato il Piano di azione del progetto Smarty Smes per la diffusione nelle PMI di	-E' stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione in coworking degli spazi di Prisma

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
			programma di accelerazione -conclusione progetto Native	nuove tecnologie e modelli di business alternativi -iniziato progetto Creative per promuovere i rapporti fra PMI del Mediterraneo nei settori manifatturieri -portato avanti il progetto EYE nelle scuole superiori per la promozione della cultura imprenditoriale e la nascita di start up.	
1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	-Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione - selezionati due progetti di valorizzazione di start up	-Ristori alle imprese e agli operatori commerciali ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza Covid	-sottoscritto protocollo d'intesa on le associazioni per la valorizzazione delle imprese della filiera corta agro-alimentare -sottoscritta la convenzione con la Camera di Commercio per l'erogazione dei contributi alle imprese del distretto tessile	-E' stato pubblicato il primo bando per l'erogazione di aiuti alle imprese del distretto relativo all'efficientamento energetico;
1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	-Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Partecipazione al protocollo Sismico con Alia e Sori per il contrasto all'evasione tributaria	-Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Rinnovato il Procollo Sismico per il contrasto all'evasione tributaria fino al 2024	-Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese -attivazione controlli sull'imposta di soggiorno -controlli sulla sicurezza e il rispetto della normativa dei prodotti messi in vendita in particolare cosmetici e abbigliamento	-controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese: progetto Black Friday, progetto Cerbero, controlli sui condomini.

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	<p>-Gestione progetto Innomed-up per lo sviluppo di imprese creative nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile</p> <p>-Organizzazione Recò Festival Economia circolare in modalità a distanza</p> <p>-Adesione ai progetti Urge per lo smaltimento e il riutilizzo materiali di risulta provenienti dalle demolizioni</p> <p>-Inizio progetto Prato Circular City per creare un modello di governo cittadino dell'economia circolare</p>	<p>-Progetto Innomed- up: individuati soggetti idonei per sviluppare percorsi di innovazione orientati alla sostenibilità</p> <p>-progetto URGE: elaborato un piano di azione integrato per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sul nostro territorio</p> <p>-Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City attraverso l'approvazione del documento Next Generation Prato, che riporta gli interventi da realizzare per lo sviluppo locale sostenibile</p>	<p>-Progetto Innomed-up: realizzata una guida per applicare i principi dell'economia circolare alle PMI delle industrie culturali e creative</p> <p>-progetto URGE: presentato l'Integrated Action Plan per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sulla circolarità nei grandi interventi infrastrutturali</p> <p>-sottoscritto protocollo d'intesa per la realizzazione dell'Hub del riciclo tessile, finanziato da risorse PNRR</p>	I risultati sono previsti nella seconda parte dell'anno
1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	<p>-Osservatorio sul lavoro e sulle esigenze formative: individuati ambiti di formazione professionale sui quali intervenire</p>	<p>-Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze: monitoraggio costante del mercato del lavoro e fabbisogni formativi delle imprese</p> <p>-Istituzione "Premi di laurea città di Prato" in collaborazione con il PIN</p>	<p>-Accordo con il Pin per l'attivazione dell'osservatorio permanente sulla domanda e l'offerta di lavoro e di formazione</p> <p>-Accordo con il Pin per l'attivazione di un percorso di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana</p>	-Elaborati due report relativi a: congiuntura e lavoro nella Provincia di Prato; fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio	n. start up o pmi innovative nel Comune di Prato:	27	27	40	71%
	n. imprese Progetto Prisma:	10	10	15	
	Progetto E.y.e.- n. idee progettuali sviluppate:	12	12	15	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività	tasso di imprenditorialità	11,78%	11,78%	11,7%	71%
	tasso di occupazione	68,3%	68,3%	69%	
	tasso di occupazione giovanile	43,3%	43,3%	52%	
	sostegni alle imprese - importo erogato alle imprese	0	0	€ 10.000.000	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori	imprese irregolari	57,40%	57,40%	46%	89%
	recupero tributi comunali imprese	820.676	307.883,00 (semestrale)	300.000	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.4 Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	imprese coinvolte nei processi di economia circolare	9	9	11	82%


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	tasso neet	14,00	n.d.	12,5	95%
	Osservatorio mercato del lavoro	1	1	1	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare</p>	

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento occupazione suolo pubblico per favorire la ripartenza delle attività commerciali -Processo partecipativo centro storico -Premiati cinque progetti presentati da associazioni e consorzi per la rigenerazione del centro storico 	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività -Processo partecipativo centro storico -Progetto di riqualificazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio 	<ul style="list-style-type: none"> -Modifica regolamento dei dehor e approvazione abaco degli elementi di arredo ammessi -Processo partecipativo e di co-progettazione in centro storico -Organizzazione di eventi culturali e commerciali di animazione del centro -Riqualificazione edifici pubblici del centro storico 	<ul style="list-style-type: none"> -Organizzazione eventi Prato estate in centro storico
2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Inizio lavori per la realizzazione di uno spazio polivalente e di una biblioteca nel quartiere di Casale, presso la scuola 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizzato immobile in via Giordano da adibire a mercato -Adeguamento immobili e riorganizzazione centri civici 	<ul style="list-style-type: none"> -Riapertura 4 centri civici -Conclusione lavori biblioteca di Casale 	<ul style="list-style-type: none"> -Pubblicato bando per la coprogrammazione con gli enti del terzo settore, delle attività dei centri civici. -Elaborato piano per l'apertura e l'allestimento della biblioteca di Casale

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
2.1 Valorizzare il cuore antico della città promuovendone la riqualificazione	Attività produttive in centro storico	8	n.d.	15 (valore annuale)	61%
	Esercizi di somministrazione in centro storico	4	n.d.	13 (valore annuale)	
	Residenze in centro storico	8.055	8.013	40.824 (è stato considerato il n. dei residenti nella circoscrizione centro anzichè nel centro storico)	
	Eventi in centro storico	69	n.d.	60 (valore annuale)	
	Interventi di riqualificazione centro storico	1	3	3	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali	Attività produttive nei paesi	38	n.d.	38 (valore annuale)	79%
	Servizi/funzioni attivati o integrati	4	4	7	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio</p>	

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
3.1	<p><i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i></p>	<p>-Garantiti corsi a distanza della scuola di musica in seguito al covid -approvata nuova convenzione del sistema museale Prato Musei e Regolamento sistema museale</p>	<p>-Convenzione con il Museo del Tessuto per comunicazione e promozione congiunta Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto -Supporto Politeama Spa nella trasformazione da associazione a fondazione</p>	<p>-Rete Prato Musei: organizzazione iniziative e laboratori didattici per le scuole -Concessione spazi Manifatture digitali del cinema -Collaborazione con Fondazione Museo Pecci per organizzazione “Centro Pecci Summer live”</p>	<p>-Organizzata Mostra Novecento diffusa su territorio in collaborazione con istituzioni culturali della provincia</p>
3.2	<p><i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i></p>	<p>-Prorogata mostra "Dopo Caravaggio" al Palazzo Pretorio -organizzazione iniziative musicali e teatrali all'aperto nel periodo di riapertura estiva</p>	<p>-Prato estate -Officina Jungle -Settembre Prato è spettacolo -Prato Festival -Organizzazione mostra Hi Woman Palazzo Pretorio, mostra Soresen e mostra Bartolini -Iniziativa 700 anni morte di Dante</p>	<p>-Mostre Palazzo Pretorio: Hi woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, gli amici pittori Cesare Guasti -Visite Palazzo Pretorio per pubblici speciali (es. autistici) -Visite guidate “Tesori della Campolmi” per la valorizzazione del Polo Culturale Campolmi -Rassegne culturali Prato estate, Settembre Prato e</p>	<p>-Mostre Palazzo Pretorio: gli amici pittori Cesare Guasti, l'albero degli Zecchini -Rassegna culturale Prato Estate -Offerta culturale rivolta ai giovani: rassegna teatrale Officina 4School, rassegna teatro comico, rassegna Macelli Freschi</p>

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
				Prato Festival -Offerta culturale rivolta i giovani: Officina OG, Officina On stage, Officina Teen	
3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	-Conclusi lavori ex teatro S.Caterina -digitalizzazione patrimonio AFT	-Conclusi lavori corte interna S.Caterina e mura urbane via S.Caterina -Riapertura al pubblico del Cassero con tre mostre	-Valorizzazione Cassero e Castello con iniziative, mostre e visite guidate -Valorizzazione percorso espositivo Galleria Comunale -Restauro e allestimento delle opere presenti nei depositi del Palazzo Pretorio -Accordo con Coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali per valorizzare la raccolta di armi presenti nel Palazzo Pretorio -Nuovo sito AFT -Conclusione lavori facciata scuola di musica e accessibilità laboratorio d'arte Leonetto Tintori	-Conclusione lavori Museo Pecci edificio Gamberini, conclusione restauro fontana Piazza duomo -Esperate gare progetti PNRR di restauro officina giovani, S. Caterina e Museo Pecci -Affidati i lavori del progetto PNRR per il superamento delle barriere fisiche e sensoriali del Palazzo Pretorio
3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	-Sviluppo e promozione Cammini: convenzione attuativa Via della lana e delle seta; convenzione via Medicea; convenzione cammino di San Jacopo -Organizzazione Eat Prato con nuovi itinerari -Presentato progetti "Dal fascino della fabbrica al museo di famiglia" per visitare le	-Promozione cammini, ampliando l'offerta con laboratori, eventi, gastronomia -Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili -Organizzati eventi legati al progetto "Dal fascino della fabbrica al Museo di famiglia" -Organizzazione Eat Prato Walking	-Inaugurato cammino "La via delle Rocche" -Organizzazione Eat Prato e iniziative di trekking urbano -Turismo industriale: creata la rete "Amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali	- Realizzato il cammino "via Medicea", attraverso il posizionamento della cartellonistica informativa e l'organizzazione di attività di promozione e comunicazione; - Comunicazione, promozione e valorizzazione del cammino Via Delle Rocche; - turismo industriale: realizzata l'APP TIPO che

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
		fabbriche storiche			permette di esplorare tramite tour virtuali spazi non sempre accessibili; realizzato un festival dedicato a TIPO;



Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Soddisfazione utenza scuola di musica	8,17	n.d.	8	67%
	Soddisfazione utenza Palazzo Pretorio	5,38	n.d.	5,5	
	Iniziative scolastiche Prato Musei: incremento % classi partecipanti	n.d.	n.d.	5%	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Partecipazione spettacoli	232.476 (dato 2021)	n.d.	88.690	76%
	Spesa media pro capite in spettacoli	€ 8,36 (dato 2021)	n.d.	€ 26,20	
	Eventi culturali per 1000 abitanti	38,66 (dato 2021)	n.d.	2,08	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
		2021)			

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura	Strutture culturali riqualificate	3	3	6	50%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva	Presenze turistiche	352.050	n.d.	464.548	89%
	Presenze strutture ricettive (gg medi)	2	n.d.	2	
	Gettito tassa di soggiorno	469.187,57 (annuale)	€ 209,115 (al 11/05/2023)	€ 505.301,5 (annuale)	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città</p>	 

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
4.1	<p><i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale -Strumenti di comunicazione per l'attività politica on-line 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo software centrale operativa Polizia Municipale -Rinnovo postazioni di lavoro -Dismissione server obsoleti e passaggio verso nuove piattaforme -Ampliata rete wifi comunale -Rivista infrastruttura informatica scuole e dotazione telefoni voip 	<ul style="list-style-type: none"> -Migrazione dei software applicativi verso componenti tecnologici più moderni -Installati telefoni VOIP nelle scuole -Completamento diffusione banda large nelle scuole -Installazione nuovi punti wi-fi in città 	<ul style="list-style-type: none"> - adeguamento di procedure interne alle nuove specifiche del portale PerlaPA. - migrazioni dei software verso componenti tecnologici più moderni; - modifica della cartografia relativa al piano neve - nuova procedura di gestione dei concorsi pubblici on-line; -nuova procedura di gestione dei contratti.
4.2	<p><i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estensione firma digitale - Innalzato il livello di sicurezza dei sistemi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> -Sottoscritto nuovo contratto in house per hotline e manutenzione postazioni informatiche 	<ul style="list-style-type: none"> -Rinnovo piattaforme -Formazione ai dipendenti in ambito di sicurezza informatica e phishing 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione ai dipendenti in materia di sicurezza informatica e phishing;

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021	Risultati 2022	Risultati giugno 2023
4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	-Sviluppo nuovi servizi on line per i cittadini -Ampliati servizi presenti su PagoPa	-Sviluppo nuovi servizi on line ai cittadini -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023	-Sviluppo di nuovi servizi on line -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione Agenda Digitale 2022-2024 -Attivata Control Room	-Attivato sportello on line polizia municipale -Nuova piattaforma per presentazione domande occupazione suolo pubblico e concessioni e nuovi dehors -nuova piattaforma per autorizzazione soprintendenza utilizzo aree pubbliche - 3 nuovi servizi su Pago Pa -attivazioni nuovi servizi su PagoPa e AppIO finanziati da PNRR

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi	Diffusione tecnologica nelle scuole: n. plessi scolastici con banda larga	66	n.d.	70	93%
	Diffusione banda larga	86%	n.d.	95%	
	Punti wifi in città	81	n.d.	85	


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA	Formazione personale in materia di sicurezza informatica	33,59%	48%	80%	60%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini	Pago PA: servizi e tariffe pagabili tramite PagoPA	67%	n.d.	70%	88%
	Servizi digitali inseriti nell'App IO	12	12	10	
	Servizi on line	134	134	100	
	Alfabetizzazione digitale: n. persone formate	1.745	n.d.	3.000	
	Cittadini supportati per le nuove tecnologie spid	1.745	n.d.	2000	



Grafico 1 – Realizzazione ambito Città impresa innovazione e lavoro

AMBITO STRATEGICO - Città del futuro



Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>5. Rigenerazione urbana</p>	

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
<p>5.1</p>	<p><i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavori in corso progetto Priuss per riqualificazione area lungo il Bisenzio -conclusi i lavori del Mercato Metropolitano e del Playground del progetto PIU -presentato un piano attuativo relativo alla fabbrica a confine con Campolmi -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 -approvazione "Agenda urbana 2050: indirizzi e strategie per il nuovo piano strutturale" 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto PRIUSS: conclusi lavori area lungo il Bisenzio e apertura piazzole attrezzate -adozione variante al Piano operativo -avviato procedimento del nuovo piano strutturale -presentati 3 piani attuativi per riqualificazione aree attraverso perequazione -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 	<ul style="list-style-type: none"> -Piano strutturale: predisposizione materiale per la conferenza di copianificazione indetta dalla Regione 	<ul style="list-style-type: none"> -approvate due varianti al Piano operativo -adottati 5 piani attuativi di iniziativa privata -adottato il nuovo Piano strutturale

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
5.2	<i>Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni</i>	-approvazione progetti di riqualificazione degli spazi di San Paolo e via Wangen (PIU2)	-aggiudicazione lavori di riqualificazione spazi San Paolo -inizio lavori mobilità sostenibile via Giordano e via Pistoiese -conclusi lavori P.za Milton Nesi a Coiano -regolamento street art	-Conclusi i lavori di riqualificazione degli spazi di S. Paolo e Chiesanuova (progetto Piu urban places) -conclusi i lavori via Giordano e via Pistoiese	Azioni concluse nel 2022

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti	Consumo di suolo (% superf urbanizzata)	33,2 (dato 2021)	n.d.	33,2	80%
	Premessi a costruire (valore annuale)	222	n.d.	300	
	Cambi destinazione d'uso (valore annuale)	168	n.d.	200	
	Perequazioni immobiliari	3	3	5	


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.2 Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni	Spazi pubblici riqualificati	3	3	3	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi	 

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	-maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -progetto di prossimità nel Macrolotto 0 insieme ad Alia per contrastare l'abbandono di rifiuti e sensibilizzare la popolazione	-maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -controlli sul decoro urbano -Regolamento videosorveglianza	-maggiore presenza PM nelle frazioni e nel centro storico -estensione sistema di videosorveglianza cittadino con 8 nuovi punti -attivazione controlli specifici sui comportamenti cause di incidenti stradali	- maggiore presenza PM nelle frazioni con i punti mobili di ascolto; - controlli congiunti con operatori di Alia; - verifiche su demolizioni di immobili abusivi; -controlli monopattini;

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	sicurezza del territorio: (n. agenti di Pm/ numero abitanti)*1000	0,92	1	1	98%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	indice di criminalità: numero denunce/100.000 abitanti	4.517,23	n.d.	5.000	
	telecamere di videosorveglianza comunali connesse con le forze dell'ordine (ogni 1000 abitanti)	0,90	n.d.	1	
	n. servizi appiedati polizia municipale	1.045	n.d	1.100 (valore annuale)	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
7. Dal decoro della città alla tutela del territorio	

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
	7.1 Tutelare il territorio		iniziati i lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio	-conclusi i lavori di risagomatura dei 4 fossi	Azioni concluse nel 2022
	7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori riqualificazione giardini via Torelli e giardini scuola infanzia lolo -pompa idrovora Cascine di Tavola -lavori in corso recupero Villa Fiorelli 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori di riqualificazione giardini via Visiana e campo basket giardini scuole Rodari -inaugurato nuovo chiosco presso Giocagìo -conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola -bonificata la pineta Marittima di Galceti -affidamento gestione manutentiva dei 4 playground cittadini -realizzati interventi di riqualificazione stradale per € 2.300.000 -ampliati 3 cimiteri comunali 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi i lavori di riqualificazione dei giardini di via Marx, via Valori, via Capponi, via Hermada, via Tirso-riqualificati i giardini scolastici del nido via Paisiello e scuola infanzia Da Quarata -approvato progetto esecutivo riqualificazione Giocagìo 1 -approvato progetto definitivo Giocagìo 2 via Turchia -conclusi interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche presso vari cimiteri 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi i lavori di riqualificazione del Parco Giocagìo, lotto 1 “Andiamo al mare” -approvato progetto esecutivo Giocagìo 2 via turchia -Definito un piano coordinato di manutenzione straordinaria strade fra comune e aziende di servizi pubblici per migliorare l’organizzazione dei lavori -conclusi 2 lavori di riqualificazione stradale ed eliminazione barriere architettoniche -approvato progetto esecutivo sottopasso via Ciulli -aggiudicati lavori in località Viaccia di riqualificazione e sicurezza stradale

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	-analisi consistenza rete tombata	-estensione rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino		Le azioni sono previste nella seconda parte dell'anno
7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	-Concesse riduzioni tariffarie e prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -approvato studio di fattibilità per nuovo centro di raccolta comunale in via Paronese -affidati servizi di derattizzazione, disinfestazione e rimozione rifiuti su aree private	-prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -attività di sensibilizzazione su raccolta differenziata nel Macrolotto 0 -approvato progetto definitivo centro di raccolta via Paronese e individuazione area per un ulteriore centro	-approvato progetto di fattibilità e variante urbanistica per centro di raccolta via Marconi -inizio lavori centro raccolta via Paronese	Le azioni sono previste nella seconda parte dell'anno
7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria	-Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria -formazione personale volontario associazioni di protezione civile	-Cessazione stato di emergenza dal 01/04/2023 - formazione personale volontario associazioni di protezione civile	-aggiornati gran parte degli allegati del nuovo Piano operativo di protezione civile
7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	-Durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani -lavori per la realizzazione di aree sgambatura cani	-accettata eredità di una cittadina vincolata alla realizzazione di un nuovo canile -conclusi lavori 3 aree sgambatura (Visiana, Wangen, Bensa)	-nuovo affidamento del canile, del servizio S.O.S animali e dell'oasi fenile la Bogaia -conclusi lavori area sgambatura via Curtatone	-conclusa la gara per l'affidamento dei servizi connessi al randagismo animale

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	Risagomatura canali, n.	4	4	4	100%


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)	manutenzione strade: mq intervento manutenzione ordinaria strade	122.906	n.d.	136.000	97%
	illuminazione stradale: punti luce/km strade	32,89	n.d.	33	
	n. giardini riqualificati	9	11	12	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.3 Garantire l'efficienza dei servizi a rete	Tasso di depurazione delle acque reflue prodotte	97	n.d.	97	n.d

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	% raccolta differenziata	72,88%	n.d.	72,50%	67%
	produzione pro capite rifiuti urbani	605,50	n.d.	630	
	nuovi centri di raccolta	0	0	2	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	n. volontari a disposizione per la protezione civile	200	n.d.	300	67%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Realizzazione nuovo canile	0	0	1	50%
	Aree sgambatura cani: n aree sgambatura/ n.parchi e giardini	8,26%	n.d.	7,80%	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	-partecipazione al progetto CREIAMO PA per calcolare l'impronta di carbonio -attività propedeutiche di ricerca alla definizione del nuovo Paesc	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: rilevazione emissioni CO2 e vulnerabilità climatica sul tema acqua -Progetto Creiamo PA: è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: indagini di vulnerabilità climatica del territorio e valutazione degli assorbimenti di carbonio -conclusione bonifica piazzale Palasaccio -realizzato nuovo fontanello a Mezzana	- conclusa la conferenza dei servizi per le barriere acustiche lungo via Aldo Moro; - in fase di ultimazione la redazione del piano di neutralità climatica
8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	-riqualificazione energetica asilo nido il Borgo e Astrolabio, scuola Manzi	-riqualificazione energetica scuole Rodari, Fermi succ, le Girandole e Corridoni	-conclusi i lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Benassai	-approvato progetto esecutivo sostituzione infissi scuole Crocini -gara servizio energia
8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	-sottoscritte due convenzioni con università per definire strategie di forestazione urbana -progettazione interventi Urban Jungle su Mercato Metropolitano ed alloggi ERP via Turchia	-consegnati dall'università i documenti della prima fase dello studio; -finanziamento da parte della Regione del progetto Verde Urbano Carbon Neutral, per la forestazione di aree prospicienti la Declassata. E' stato approvato il progetto del primo lotto -iniziati interventi Urban Jungle sul Mercato Metropolitano	-conclusi i tre lotti di lavori del Progetto verde Carbon Neutral che hanno interessato aree prospicienti declassata -in corso lavori Urban Jungle Macrolotto Zero e alloggi popolari via Turchia -installate 28 centraline CNR per misurare gli effetti della forestazione sull'aria -Piattaforma Prato Forest city	-approvate aree da destinare alla forestazione diffusa da inserire nel portale Forest city -conclusi lavori Urban Jungle Mercato coperto

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
				per acquistare un albero	


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	inquinamento aria (PM10): superamento qualità dell'aria	14	n.d.	<22,5	61%
	inquinamento aria (NO2): superamento qualità dell'aria	0	n.d.	0	
	emissione procapite CO2	3,99 (dato 2020)	n.d.	<0,77	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.2 Interventi di efficientamento energetico	consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/ tot. Consumi interni	n.d.	n.d.	>6,9	74%
	n. edifici riqualificati da un punto di vista energetico	4	7	14	
	punti luce illuminazione				

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	pubblica a LED/ totale punti luce	38,93%	n.d.	40%	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Forestazione urbana: alberi/100 abitanti in aree pubbliche	18,20	n.d.	20	87%
	Verde pubblico fruibile: mq verde pubblico urbano fruibile/ tot. abitanti	25,46	n.d.	30,6*	

*valore atteso modificato nel Dup 2023/2025

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
9. Mobilità sostenibile	

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	-corsi di educazione stradale nelle scuole -riorganizzate le modalità di comunicazione informazioni sulla viabilità ai cittadini -realizzazione rotonde via	-corsi di educazione stradale nelle scuole sul tema alcool e responsabilità -realizzati interventi per la moderazione della velocità e la riduzione dell'incidentalità	-corsi di educazione stradale nelle scuole -controlli specifici sull'autotrasporto -realizzati interventi per la sicurezza stradale e la	-corsi di educazione stradale nelle scuole

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
		Roma e altri interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo anche sulla segnaletica	-realizzati lavori attraversamenti semaforizzati per non vedenti	riduzione dell'incidentalità	
9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	-realizzato collegamento viario Maliseti- via L.Rossi -realizzazione seconda complanare declassata al Soccorso -conclusi lavori rotatoria via Castruccio- via Manzoni	-conclusi lavori rotatoria di Capezzana -in corso lavori collegamento via Manzoni, via bigoli, via Verzoni	-Nuovo accordo di programma Il tangenziale -Realizzato collegamento stradale via Manzoni-via Garduna -rilevamento degli stalli di sosta parcheggi a pagamento e definizione indice di rotazione	-aggiudicati lavori PNRR risanamento ponte Petrino -conclusi lavori risanamento strade PNRR lotti 2 A, 2B, 3 A, 3B
9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	-riorganizzazione trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio	-predisposizione Biciplan, Piano della mobilità elettrica e Piano della logistica -redatti piani di spostamento Casa Scuola -iniziati interventi per migliorare la mobilità del polo scolastico di via Galcianese -concluso 1° lotto lavori ciclabile Prato-Firenze, che collega il macrolotto 2 con Campi Bisenzio -conclusi lavori ciclabile via Montalese -progettato nuovo collegamento TPL Casale-ospedale	-iniziati lavori lotto 2 Ciclovia Firenze-Prato -approvati 9 progetti definitivi/ esecutivi ciclabili bando Credito Sportivo -approvati progetti esecutivi piste ciclabili finanziate PNRR -conclusi lavori lotto 1 mobilità polo scolastico Galcianese -approvato Biciplan -gara per campagna di rilevazione della qualità del servizio TPL e ferroviario	-aggiudicati i lavori piste ciclabili PNRR -approvato progetto definitivo Ciclovia del Sole -approvato il Piano della mobilità elettrica -iniziata l'attività di rilevazione della qualità del servizio TPL e ferroviario

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti	n. incidenti con danni alle persone	791	n.d.	<900	85%
	indice di lesività stradale: n. feriti/ incidenti	1,22	n.d.	<0,85	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione	n. nuove infrastrutture stradali realizzate	1	4	9	44%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa	Km piste ciclabili	118	120	118	91%
	numero auto/100 abitanti	60,88	n.d.	56	
	% utilizzo del trasporto pubblico	9,57	n.d.	11%	
	Km rete tpl / popolazione	0,11	0,11	0,11	
	n. colonnine di ricarica elettrica	40	n.d.	60	
	n. percorsi pedibus attivati	19	19	19	

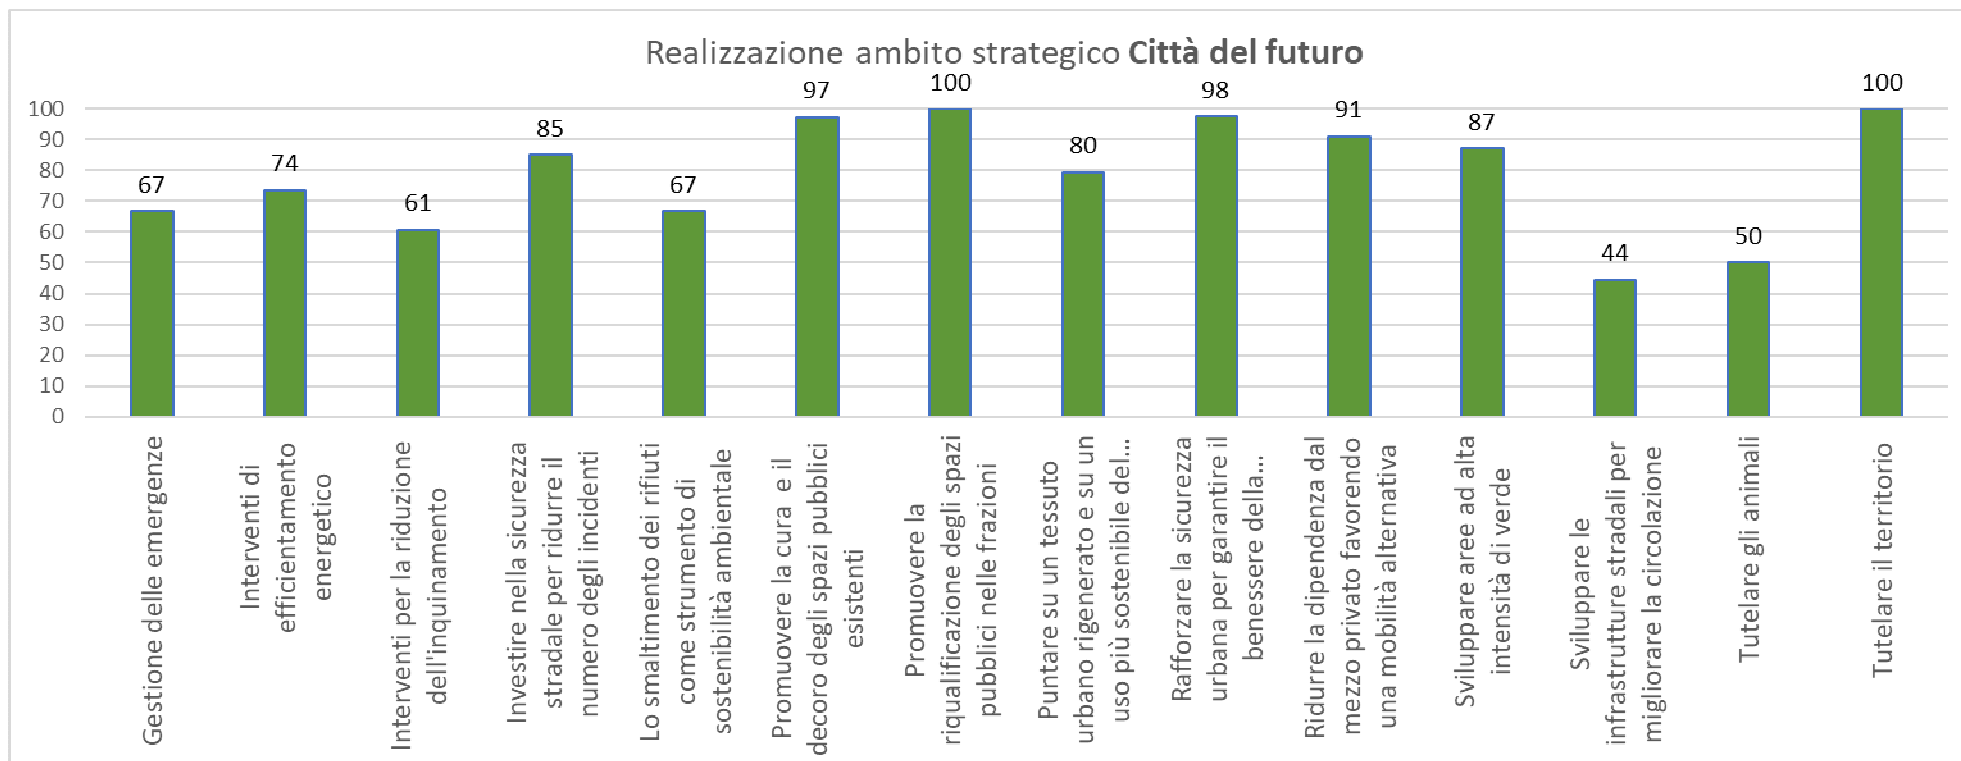




Grafico 2 – Realizzazione ambito Città del futuro

AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>10. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità</p>	 



	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
<p>10.1</p>	<p><i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i></p>	<p>-riorganizzazione procedure e uffici in vista del passaggio alla gestione diretta della Sds</p>	<p>-distacco presso la società della salute del personale con qualifica di assistente sociale -entrata in vigore nuovo regolamento Società della Salute per l'accesso ai servizi sociali</p>	<p>-passaggio alla gestione diretta della Società della salute</p>	<p>Azioni concluse nel 2022</p>
<p>10.2</p>	<p><i>Sostenere le fragilità diffuse</i></p>	<p>Attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria: -buoni spesa -spesa a casa e farmaci -bando contributi affitto Covid -riorganizzazione servizio assistenza domiciliare</p>	<p>-riorganizzazione servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale -riorganizzazione servizi minori e famiglie -presentato nuovo progetto Social Board -ultimati appartamenti per emergenza alloggiativa a Reggiana -pubblicato elenco strutture socio assistenziali accreditate</p>	<p>-attivato nuovo Social Board -attività progetti utili alla collettività per il reddito di cittadinanza -avviato centro diurno e centro servizi leggeri per persone senza fissa dimora -approvato regolamento per l'emergenza alloggiativa -nuova convenzione servizio trasporto sociale -inserimento di anziani autosufficienti nei gruppi di appartamento -attivati progetti di supporto alla genitorialità per mantenere i minori in famiglia</p>	<p>-analisi di customer sul servizio di assistenza domiciliare -formazione e accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa di persone inserite in progetti socio-terapeutici -sostegno alle famiglie in condizioni di povertà e soggetti a rischio di emarginazione -nuova procedura per ottenimento contributi di integrazione al reddito -sottoscritta convenzione fra Comune e Sds per</p>

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
				-incremento dell'affido al posto delle strutture per minori -finanziati dal PNRR progetti sulla genitorialità, supporto alla disabilità e realizzazione di un centro servizi per la marginalità	ristrutturazione immobile via Zarini finanziato dal PNRR per la realizzazione di un centro servizi per il supporto alla marginalità
10.4	<i>Tutelare i minori e supportare una genitorialità responsabile (nuovo obiettivo operativo 2023-2025)</i>				-attivato progetto PIPPI per il sostegno alla genitorialità -aumentati i minori in affido a discapito di quelli in struttura -aumentate le dimissioni dalle strutture dei minori stranieri che sono entrati nel mondo del lavoro -attivato protocollo con le scuole per l'individuazione di alunni in situazione di rischio

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari	Attivazione gestione diretta SdS	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	100%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.2 Sostenere le fragilità diffuse	n. anziani in carico al 31/12/ tot popolazione anziana*1000 abitanti	47	n.d.	53	94%


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.3 Tutelare i minori e supportare una genitorialità responsabile (nuovo obiettivo operativo 2023-2025)	Minori in affido	72%	63,81%	72%	48%
	Progetto P.I.P.P.I. – numero famiglie coinvolte		10	40 (previsione al 2025)	
	Protocollo con istituzioni scolastiche per individuare disagio familiare: n. insegnanti formati		18	60 (previsione al 2025)	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
11. Una casa per tutti	 

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	In corso lavori per la realizzazione di 72 alloggi da destinare a canone calmierato (Gello living)	Ultimati 72 alloggi del progetto Gello living, da destinare a canone calmierato		Azioni previste nella seconda parte dell'anno
11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	-acquistati 7 alloggi in via Compagnetto da destinare all'edilizia residenziale pubblica -pubblicato bando per l'assegnazione delle case popolari -conclusi i lavori della Casa di accoglienza la Ginestra per accogliere donne e bambini in emergenza abitativa	-in corso istruttoria domande case popolari -apertura struttura Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli	-approvata graduatoria definitiva per l'assegnazione case popolari -assegnati 10 alloggi ERP -controlli sugli assegnatari di case popolari, recuperando 3 alloggi da riassegnare per decadenza requisiti	-aumentati il numero degli alloggi destinati ad emergenza alloggiativa -attivati percorsi di supporto e accompagnamento all'autonomia abitativa a favore di 30 nuclei familiari inseriti in emergenza alloggiativa.

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.1 Housing sociale	alloggi in social housing	72	72	140	51%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	n. alloggi assegnati/ tot cittadini in graduatoria	1,025%	3,13%	9,55%	33%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
12. Accogliere, includere, integrare le diversità	



	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzato sportello migranti con modalità a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -realizzazione specifiche campagne di comunicazione, con riferimento anche al Covid -accoglienza titolari di protezione internazionale -progetto antitratta 	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione sportello immigrazione sia in presenza, sia a distanza -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -organizzazione corsi di lingua e di formazione specifici -realizzazione specifiche campagne di comunicazione -accoglienza titolari di protezione internazionale -rinnovo adesione al progetto antitratta -Nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta da parte di rom e sinti 	<ul style="list-style-type: none"> -progetti di integrazione stranieri -progetti di accoglienza dei richiedenti asilo -partecipazione al progetto antitratta per lo sfruttamento lavorativo -approvato il Regolamento per la permanenza delle famiglie Rom e Sinti nelle aree attrezzate -approvato piano per il superamento delle aree 	<ul style="list-style-type: none"> -progetti di integrazione stranieri -progetti di accoglienza dei richiedenti asilo -partecipazione al progetto antitratta per lo sfruttamento lavorativo - sottoscritti 5 patti di inclusione da parte delle famiglie Rom e Sinti intenzionate ad uscire dalle aree attrezzate.

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	-censimento barriere architettoniche su strade e marciapiedi e presentazione al finanziamento progetto per l'eliminazione	-adesione alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) -protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazione, con conseguente apertura dello sportello -approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi -iniziati lavori per eliminazione barriere architettoniche su strade e marciapiedi	-eliminate barriere architettoniche cimiteri -partecipazione al progetto Sport inclusivo per l'acquisto di attrezzatura sportiva specifica per disabili	-realizzati laboratori per persone disoccupate finalizzati all'inserimento lavorativo - E' stata acquistata attrezzatura sportiva e ausili ginnici da concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che promuoveranno lo sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità - è stato conferito l'incarico di Disability manager, che si occuperà dei rapporti con il centro per l'impiego per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.	livello gradimento sportello immigrazione (scala 1-5)	4,88	n.d.	4,8	67%
	rom e sinti: famiglie coinvolte dall'accompagnamento alloggiativo	8	8	8	
	campi sgomberati				

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
		0	0	1	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.2 Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	Accessibilità edifici comunali: edifici senza barriere architettoniche/ tot edifici comunali attivazione servizio taxi per disabili	69,70% 31/12/2022	69,70% 31/12/2022	70% 31/12/2022	99%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	 

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria -didattica di vicinanza attraverso apposito sito internet -riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per il rispetto delle nuove norme igieniche -sostegno economico ai nidi privati -sostegno economico alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito a quarantene 	<ul style="list-style-type: none"> -sviluppo sito internet per la didattica di vicinanza, come strumento di sostegno alla genitorialità -attivazione servizi integrativi estivi -piena operatività centri 0-6 	<ul style="list-style-type: none"> -apertura nuovo Nido Fontanelle -approvata nuova convenzione triennale con i nidi privati convenzionati -nuova gestione servizi integrativi per l'infanzia a.e 2022/2023 -nuova gestione trasporto scolastico -gara per riorganizzazione Pre-post scuola -modificato regolamento servizi educativi per l'infanzia 	<ul style="list-style-type: none"> -bandita la gara per riorganizzazione Pre-post scuola; - Organizzate iniziative per i 40 anni di apertura asili nido comunali e i 50 anni di apertura scuole infanzia; - avviata la nuova procedura informatica di gestione dei servizi scolastici;
13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	<ul style="list-style-type: none"> -realizzati interventi di adeguamento degli spazi per la riapertura in sicurezza delle scuole -conclusi i lavori alla scuola Santa Gonda e di adeguamento sismico scuola Zipoli 	<ul style="list-style-type: none"> -manutenzione straordinaria nidi Fontanelle e Girandole -conclusa scuola infanzia Pacciana -indagini sismiche sui solai di 43 scuole 	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori scuola primaria Casale -concluso ampliamento scuola di Cafaggio -concluso spazio polivalente scuola S.Gonda -conclusi i lavori di adeguamento sismico di 15 scuole 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiudicati i lavori per la riqualificazione di 37 giardini scolastici finanziati dal PNRR; - è in corso la gara di appalto per la Scuola Pier Cironi; - approvato il progetto definitivo del centro bambini e famiglie e spazio gioco Abatoni;

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
				-finanziati progetti PNRR scuola Cironi e riqualificazione giardini scolastici	- conclusi i lavori per l'ampliamento della scuola Santa Gonda, il parcheggio delle scuola di casale, manutenzione scuola Don Bosco e scuola Crocini; - sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento sismico della scuola Villa Caritas;
13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	-riorganizzate in modalità a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -sportello di mediazione linguistico culturale -formazione docenti -contributi straordinari per centri estivi -attivazione controlli sull'evasione scolastica nella scuola dell'obbligo	-riattivazione in presenza delle attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -contributi centri estivi 2021	-progetti di integrazione scolastica e linguistica degli alunni non italofoeni -attivazione servizio di supporto ai genitori stranieri per le iscrizioni scolastiche -laboratori di facilitazione linguistica in classe -sportelli di mediazione linguistico culturale -corsi estivi di lingua italiana per alunni primaria	- progetti di integrazione scolastica e linguistica degli alunni non italofoeni; - corsi estivi di lingua italiana per alunni primaria - attivati i campi estivi interculturali; - sportelli di mediazione linguistica-culturale;
13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	-potenziati servizi digitali aumentando offerta film ed e-book - potenziamento canali social - riorganizzazione prestito, gestione utenza e accesso sale studio -riorganizzazione sale e raccolte	-promuovere la lettura on line attraverso potenziamento MLOL -riorganizzazione sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi -approvato regolamento biblioteche comunali -organizzazione attività didattiche e di promozione della lettura	-ricominciate aperture domenicali Lazzerini -promozione spazi e servizi biblioteca Lazzerini -progetto lettura delle biblioteche decentrate con le scuole del territorio -adesione alla rete Nati per leggere per fascia 0-6 anni -promozione lettura adolescenti	- apertura serale della Biblioteca Lazzerini il venerdì fino alle 23; - realizzati 94 incontri con le classi scolastiche nella sezione ragazzi e bambini - adesione al progetto regionale PNRR della Digital Library che prevede la messa a disposizione delle digitalizzazioni dei periodici



	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
				-adozione Patto intercomunale per la lettura -ottenuta qualifica “Città che legge” 2022/2023	storici locali al pubblico; - ampliata l’offerta delle iniziative in biblioteca attraverso la coprogettazione e la coorganizzazione con le associazioni e gli enti del terzo settore delle iniziative - progetto nati per leggere;

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Indicatore di Lisbona; bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia/ popolazione in età 3-36 mesi	40,6	40,6	40,6	93%
	soddisfazione del servizio asili nido (scala 1-6)	5,48	5,48	5,55	
	soddisfazione servizi integrativi (scala 1-6)	4,24	4,24	5,36	
	soddisfazione servizi scuola infanzia (scala 1-6)	5,08	5,08	5	
	soddisfazione servizio refezione scolastica (scala 1-6)	4,48	4,48	5	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure	spesa media manutenzione ordinaria scuole	€ 7.651	€ 7.651	€ 7.000	47%
	n. ampliamenti e nuove costruzioni scuole	4	5	12	
	n. plessi con giardini riqualificati		0	37	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.3 Per una scuola inclusiva	Integrazione linguistica alunni stranieri: % alunni (scuola dell'obbligo) che a fine a.s hanno competenze linguistiche minime	68	68	70	99%
	Assistenza scolastica disabili: numero alunni disabili assistiti/ tot alunni disabili		100%	100%	
	Mediazione linguistico culturale nelle scuole: ist. Comprensivi con sportello di mediazione / tot ist. comprensivi		100%	100%	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale	utilizzo servizio biblioteca: iscritti attivi al servizio bibliotecario/ popolazione	14,31%	n.d.	23,26%	81%
	Realizzazione Nuova Biblioteca Casale	1	1	1	


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	 

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori Campo di calcio S.Giusto e Galleni -conclusi lavori di manutenzione straordinaria piscina di Mezzana -adeguate le convenzioni di gestione degli impianti per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo la fine del lock down 	<ul style="list-style-type: none"> -Rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce -Realizzati due campi in sintetico Campo sportivo Rossi a Coiano -riattivato stadio per campionato dilettantistico -manutenzione straordinaria piscina Galilei 	<ul style="list-style-type: none"> -finanziati dal PNRR e approvati progetti di fattibilità: riqualificazione impianti piscina Galilei, campo calcio Paperino Il lotto, riqualificazione vari campi calcio e rugby, antincendio palestra via Roma, nuova piscina olimpionica 	<ul style="list-style-type: none"> - in fase di collaudo i lavori del Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo - conclusi i lavori di riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma; - conclusi i lavori di risanamento tribuna d'onore Stadio Lungobisenzio; - Progetti PNRR: approvati i progetti esecutivi per il Campo di calcio Paperino lotto II, adeguamento antincendio Palestra Via Roma, riqualificazione campi di calcio e Rugby (Montano, Viaccia, Maliseti e Fantaccini); - è stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione e realizzazione della nuova piscina Olimpionica di Iolo

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Attività promozionale ridotta e quasi sospesa in seguito all'emergenza sanitaria.	Sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria	-siglato nuovo protocollo d'intesa con Trofeo città di Prato -organizzazione attività motoria anziani -sostegno e patrocinio alle associazioni del territorio per organizzazione eventi sportivi	-organizzazione attività motoria anziani -sostegno e patrocinio alle associazioni del territorio per organizzazione eventi sportivi; - Pubblicato, l'avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere l'attività sportiva per l'anno 2023;

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi	impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione/ tot impianti sportivi	17	18	30,95	58%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.2 Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Promozione sportiva nelle scuole: n. bambini partecipanti all'attività del Trofeo città di Prato / popolazione scolastica	37%	37%	32%	84%
	Offerta eventi sportivi: n. eventi sportivi/ 1000 abitanti	0,042	0,34	0,5	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>15. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti</p>	



Il presente obiettivo operativo dal 2023 è confluito nell'obiettivo operativo 2023 18.2 diritto di essere ascoltati

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>		attivazione Consiglio Comunale dei ragazzi e approvazione Regolamento	-3 sedute consiglio comunale dei ragazzi	Obiettivo operativo spostato su 18.2
15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>		-mappatura dei servizi rivolti all'infanzia erogati dall'amministrazione	-Istituzione garante dei diritti dell'infanzia	Obiettivo operativo spostato su 18.2



Grafico 3 – Realizzazione ambito Città dei diritti e delle opportunità

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>16. L'amministrazione efficace e efficiente</p>	 

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
<p>16.1</p>	<p><i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -attivazione smart working -approvato regolamento per la disciplina dello Smart working -fornitura DPI ai dipendenti -approvato documento di valutazione del rischio in emergenza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> -modifica Regolamento aziendale sugli orari di lavoro -modifica disciplina modalità di assunzione all'impiego -approvazione Pola -rinnovo CUG -sottoscritto nuovo contratto decentrato dirigenti -modificata la struttura organizzativa -modificato sistema di misurazione e valutazione -adeguato documento di valutazione del rischio 	<ul style="list-style-type: none"> -Modificato regolamento del lavoro agile -Modificato sistema di misurazione e valutazione della performance -approvato Piano della formazione -attivati corsi di formazione sulle competenze digitali, mobbing e discriminazione -è stato predisposto il progetto per l'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico 	<ul style="list-style-type: none"> -attivati due nuovi iter di liquidazione degli incentivi funzionali tecniche: - Approvato regolamento patrocinio legale per Amministratori Pubblici
<p>16.2</p>	<p><i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -revisione contratti di servizio (pulizie, assicurazioni) -riorganizzazione procedure e processi di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> -gestione fondo Covid per sostenere le maggiori spese e le minori entrate dovute all'emergenza sanitaria -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -attivazione monitoraggio puntuale sui residui delle opere 	<ul style="list-style-type: none"> -attivazione coordinamento e monitoraggio progetti PNRR -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -modifica regolamento contributi e patrocini 	<ul style="list-style-type: none"> - Approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025; - invio alla stazione appaltante di Pistoia della documentazione per l'indizione della gara del nuovo servizio di tesoreria comunale;

	Obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
			pubbliche -riorganizzazione e informatizzazione procedure		
16.3	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	-adeguamento Piano anticorruzione e trasparenza alle nuove disposizioni dell'ANAC -verifiche sulle attività extraistituzionali dei dipendenti	-nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -Piano anticorruzione 2021-2023 con nuove indicazioni ANAC -Codice di comportamento	-Piano auditing 2022 -Piano anticorruzione 2022-2024 -attivazione piattaforma per whistleblowing -costituita rete dei referenti per la privacy -aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni	- approvato il Piano auditing 2023 -Approvato all'interno del PIAO le misure di anticorruzione 2023-2025 - Avviata l'attività del Nucleo ispettivo;
16.4	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Nessuna azione realizzata	-analisi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare -apertura bagno pubblico in centro in via dei Manassei	-Ricollocato archivio storico di S.Caterina -attivazione procedura per richieste di acquisizione, locazioni, concessioni di immobili da privati -attivazione procedura per richieste manutenzioni straordinaria agli impianti sportivi -gara per gestione e manutenzione impianti antincendio	- ricognizione beni d'epoca di proprietà comunale; - sopralluoghi e verifiche per ottenere la documentazione necessaria per la vendita degli immobili non più utili ai fini istituzionali: - predisposto un sistema di monitoraggio e controllo sulla gestione manutentiva degli alloggi ERP, sia ordinaria che straordinaria;


Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.1 Il personale dell'ente, una risorse da valorizzare	n. dipendenti assunti nel triennio	48	n.d.	67	72%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.2 Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	Tempestività pagamento fatture: gg effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-6,06	-6,30	-5	99%
	Capacità di riscossione dell'amministrazione comunale	75,56%	75,56%	78%	
	Controlli di regolarità amm.va: auditing interno % anomalie riscontrate	4,7%	4,7%	<7%	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.3 Garantire la correttezza amministrativa	% rispetto misure piano anticorruzione	84,59%	n.d.	100%	85%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
---------------------	------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	n. edifici riqualificati	5	5	6	83%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
17. L'amministrazione al servizio della città	


	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
17.01	Semplificazione e trasparenza	-digitalizzazione delibere del Consiglio precedenti al 1990 -revisionato portale procedimenti attività produttive	-campagna comunicativa sull'accesso ai servizi demografici digitali -nuove modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora alla Casa Comunale	-attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP -sportello rilascio SPID presso Urp e biblioteca Lazzerini -attivazione nuova procedura per richiesta informazioni servizi demografici -nuovo portale sui dati statistici Prato Conta	-analisi procedure per attivazione notifiche sanzione CDS su app IO
17.02	Servizi di qualità, equi e accessibili	-riorganizzazione servizi di sportello (anagrafe, Urp, Suap) in situazione emergenziale implementando i servizi on line -effettuate rilevazioni di customer -analisi statistiche sul contesto	-riorganizzata modalità di accesso ai servizi demografici -effettuate rilevazioni di customer su 13 servizi -analisi statistiche sul contesto socio economico (esercizi commerciali, demografia)	-Effettuate rilevazioni di customer su 11 servizi	- Revisione sezioni elettorali; - Avviato il Percorso di accreditamento Prato città dei bambini e degli adolescenti;

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
		socio economico (redditi, fecondità, demografia)			

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
17.1 Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici	% rispetto adempimenti in materia di trasparenza	100%	88% *	100%	88%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili	Media customer servizi al cittadino	5	5	5,3	94%

* a seguito della Delibera Anac 203/2023 sono cambiati i criteri di valutazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
18. L'amministrazione che dialoga: una nuova comunicazione pubblica	

	obiettivo operativo	2020	2021	2022	2023
18.01	<i>Comunicazione efficace</i>	-informazioni tempestive e multicanale per Covid -rimodulazione modalità di accesso ai servizi attraverso canali non fisici -sedute consiglio comunale on line	-rinnovato sito Lazzerini e Polo regionale di documentazione interculturale -ampliati servizi Urp attraverso convenzioni con altri enti -promozione accesso ai servizi in modalità web -campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione	- campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione -promozione sito "Citta di Prato" -promozione sui social -attivazione canali di comunicazione FB e on line con l'URP	- campagne comunicative sui progetti strategici: - adesione al progetto di adeguamento del sito istituzionale ai requisiti AGID;
18.02	<i>Diritto di essere ascoltati</i> <i>(nuovo obiettivo operativo inserito nel 2023)</i>		-revisione regolamento della partecipazione	- 3 sedute Consiglio dei Ragazzi -Istituzione garante dei diritti dell'infanzia	- processo partecipativo Piano Strutturale; -attivazione tavolo degli assessori progetto Unicef - costituzione dell'osservatorio permanente sulla sostenibilità socio-ambientale per l'infanzia

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
18.1 Comunicazione efficace	Diffusione canali social: follower/1000 abitanti	116	n.d	500	51%

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
	Accessi nuovo sito	8.617.850	n.d	11.000.000	
	Campagne comunicative e di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti		1	2	

Obiettivo operativo	Indicatori	Valore al 31/12/2022	Valore al 30/06/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
18.2 Diritto di essere ascoltati (nuovo obiettivo operativo inserito nel 2023)	Processi partecipativi attivati	3	3	5	65%
	n. processi partecipativi in cui sono coinvolti bambini e ragazzi		1	1	
	m. riunioni consiglio comunale dei Ragazzi		1	>=2	
	introduzione di sistemi di partecipazione nello Statuto comunale			30/06/2023	
	Costituzione Osservatorio sulla sostenibilità socio ambientale per l'infanzia			13/06/2023	

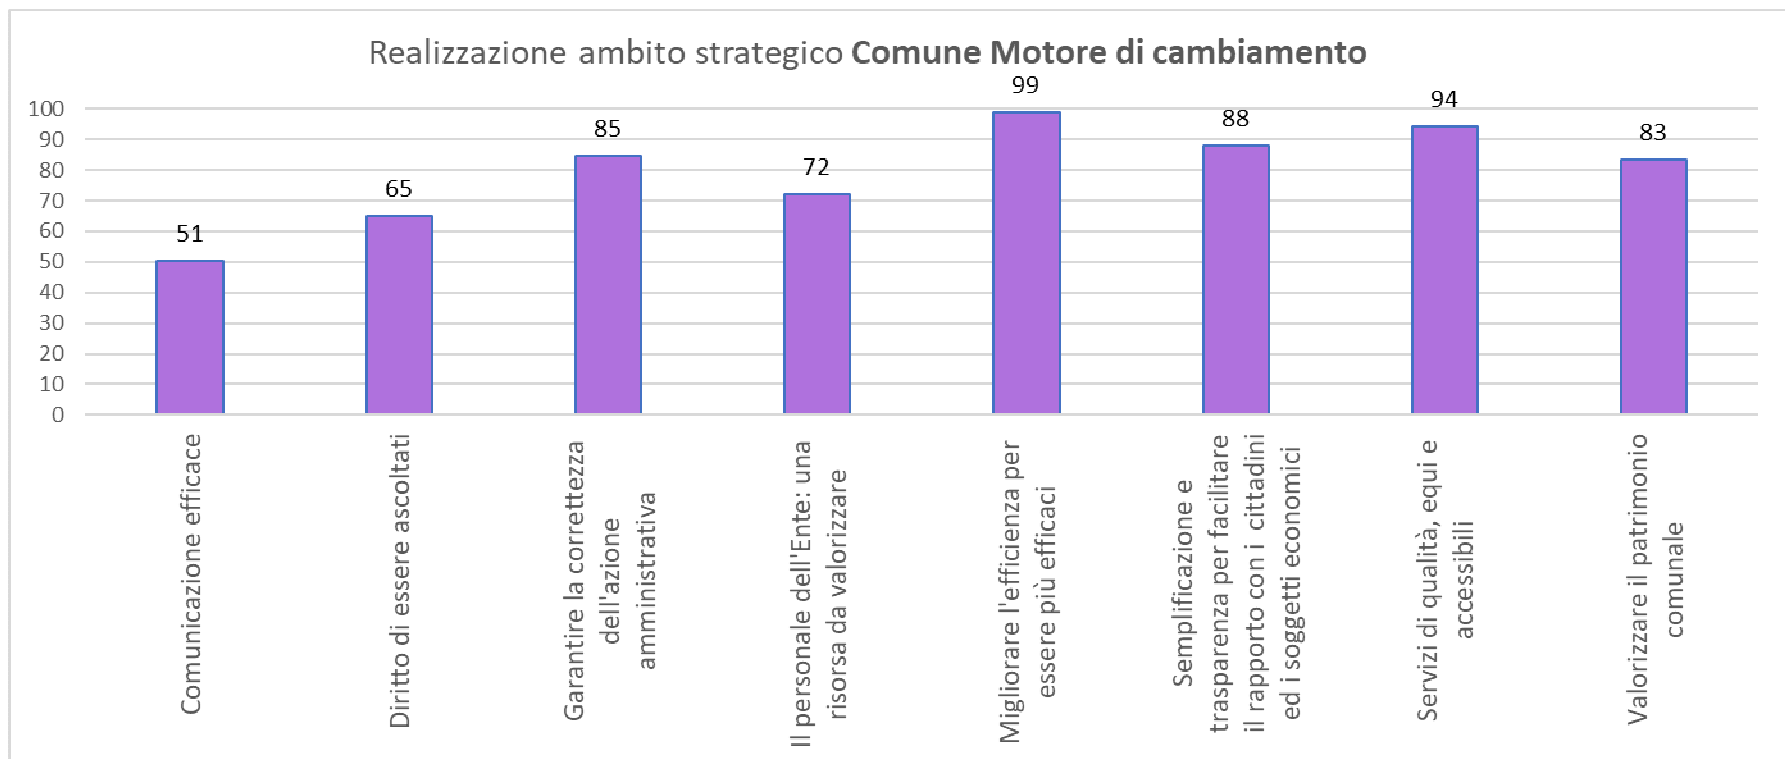


Grafico 4 – Realizzazione ambito Comune Motore di cambiamento

1.3 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici

Nel presente paragrafo vengono riportati in maniera sintetica i principali risultati raggiunti dall’inizio del mandato per ogni obiettivo strategico. La tabella e il grafico seguenti riepilogano la percentuale di realizzazione per ogni obiettivo strategico.

OBIETTIVO STRATEGICO	% realizzazione
DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	82
IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	70
CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	71
INNOVAZIONE DIGITALE COME LEVA DI PROGRESSO E CRESCITA DELLA CITTA'	80
RIGENERAZIONE URBANA	90
SPAZI PUBBLICI SICURI E INCLUSIVI	98
DAL DECORO DELLA CITTA' ALLA TUTELA DEL TERRITORIO	76
PRATO CITTA' GREEN	74
MOBILITA' SOSTENIBILE	73
POLITICHE PER LE FAMIGLIE E WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'	81
UNA CASA PER TUTTI	42
ACCOGLIERE, INCLUDERE, INTEGRARE LE DIVERSITA'	83
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PER INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO	80
SPORT COME STRUMENTO EDUCATIVO E FATTORE DI TRASFORMAZIONE SOCIALE	71
L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	85
L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'	97
L'AMMINISTRAZIONE CHE DIALOGA	58



Grafico 5 – Avanzamento strategie al 30/06/2023

Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria

L'analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell'impegnato e dell'accertato di competenza al 30.06.2023.

La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate e gli impegni e accertamenti in competenza. Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro.

Tabella 2: Risorse assestate, accertamenti e impegni per obiettivo strategico

Obiettivo strategico	Codice	Entrate	Accertato	Assegnato	Impegnato	FPV
Distretto manifatturiero, Impresa, Lavoro	2021-OBST-01	2.027.194,67	1.449.346,23	13.098.243,29	12.613.956,08	52.497,74
Il centro storico e i paesi di Prato	2021-OBST-02	5.200.000,00	215.640,40	30.000,00	-	-
Cultura e turismo	2021-OBST-03	17.012.698,34	5.875.828,15	27.292.229,91	14.884.715,21	-
Innovazione digitale	2021-OBST-04	3.547.175,50	3.184.263,47	7.381.462,01	3.906.703,42	-
Rigenerazione urbana	2021-OBST-05	7.526.835,54	2.970.609,73	3.548.018,76	2.243.324,69	8.616,35
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2021-OBST-06	23.480.359,43	10.425.143,78	16.059.323,24	8.969.415,76	36.493,85
Dal decoro della città alla tutela del territorio	2021-OBST-07	53.275.619,10	17.641.869,18	68.235.815,35	59.284.636,59	18.562,42
Prato città green	2021-OBST-08	9.177.328,09	4.957.004,21	12.577.639,21	6.868.818,19	-
Mobilità sostenibile	2021-OBST-09	29.690.715,97	22.935.345,05	43.935.680,71	36.606.568,56	-
Welfare a sostegno della comunità	2021-OBST-10	1.434.835,14	364.148,90	18.793.903,56	16.050.498,91	145.779,60
Una casa per tutti	2021-OBST-11	568.000,00	177.072,78	1.983.759,15	1.465.390,76	-
Accogliere includere integrare le diversità	2021-OBST-12	2.334.137,26	1.813.606,22	3.438.806,31	2.265.290,59	-
Scuola, educazione, formazione	2021-OBST-	21.671.367,14	9.641.249,99	50.227.385,03	31.746.015,31	131.696,30

Obiettivo strategico	Codice	Entrate	Accertato	Assegnato	Impegnato	FPV
	13					
Sport come fattore di trasformazione sociale	2021-OBST-14	8.251.452,08	6.969.829,15	19.899.008,90	17.134.948,84	5.701.155,50
Amministrazione efficace ed efficiente	2021-OBST-15	134.865.404,87*	15.030.725,99	83.159.530,97*	25.773.776,55	80.423,03
Amministrazione a servizio della città	2021-OBST-16	1.373.915,00	497.982,65	9.236.714,28	4.879.467,60	7.540,96
Amministrazione che dialoga con i cittadini	2021-OBST-17	4.761,00	5.792,93	1.002.081,04	556.635,94	-

*sono state escluse le anticipazioni di cassa

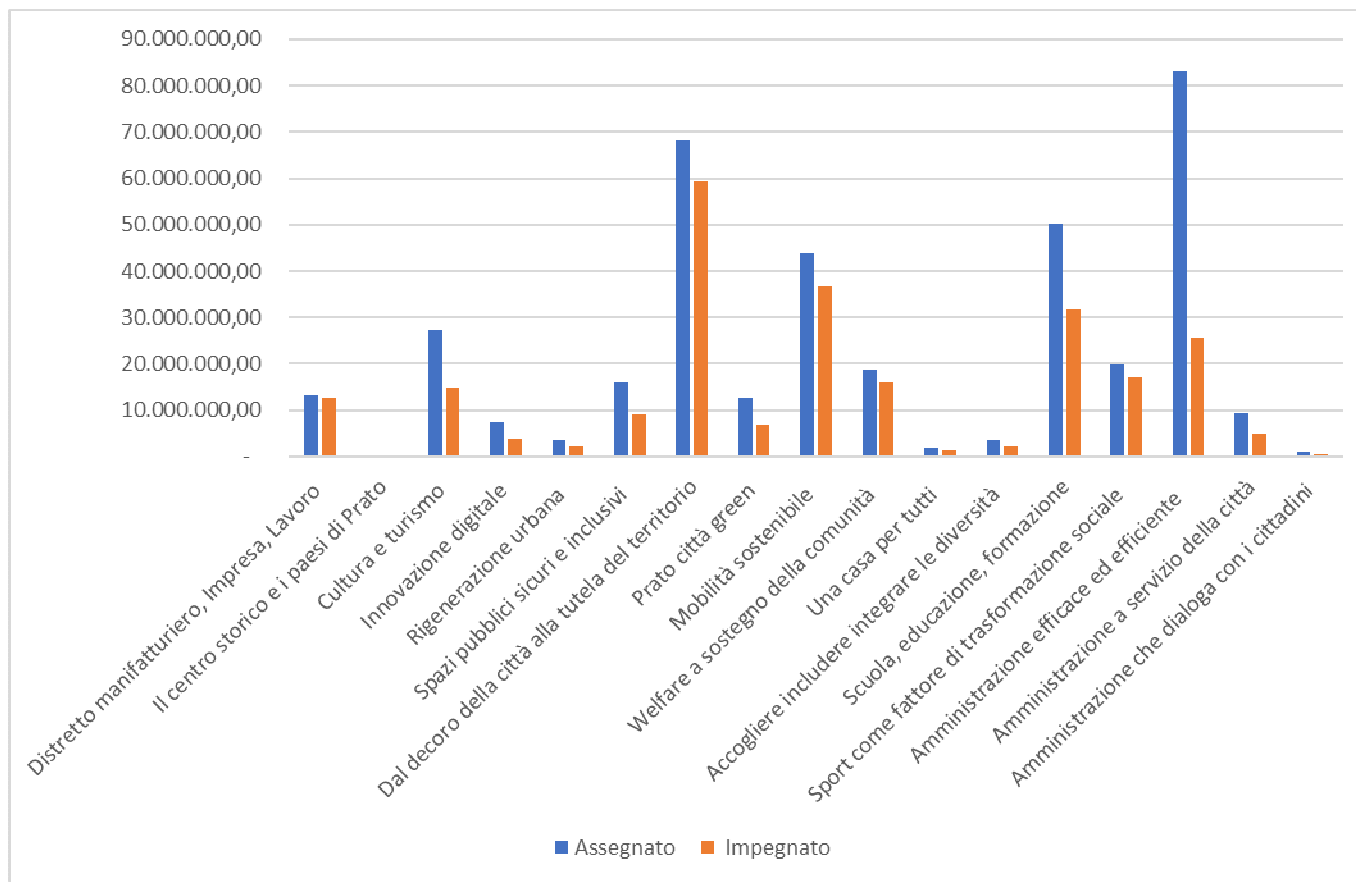


Grafico 6 – confronto risorse assegnate con risorse impegnate

Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici.

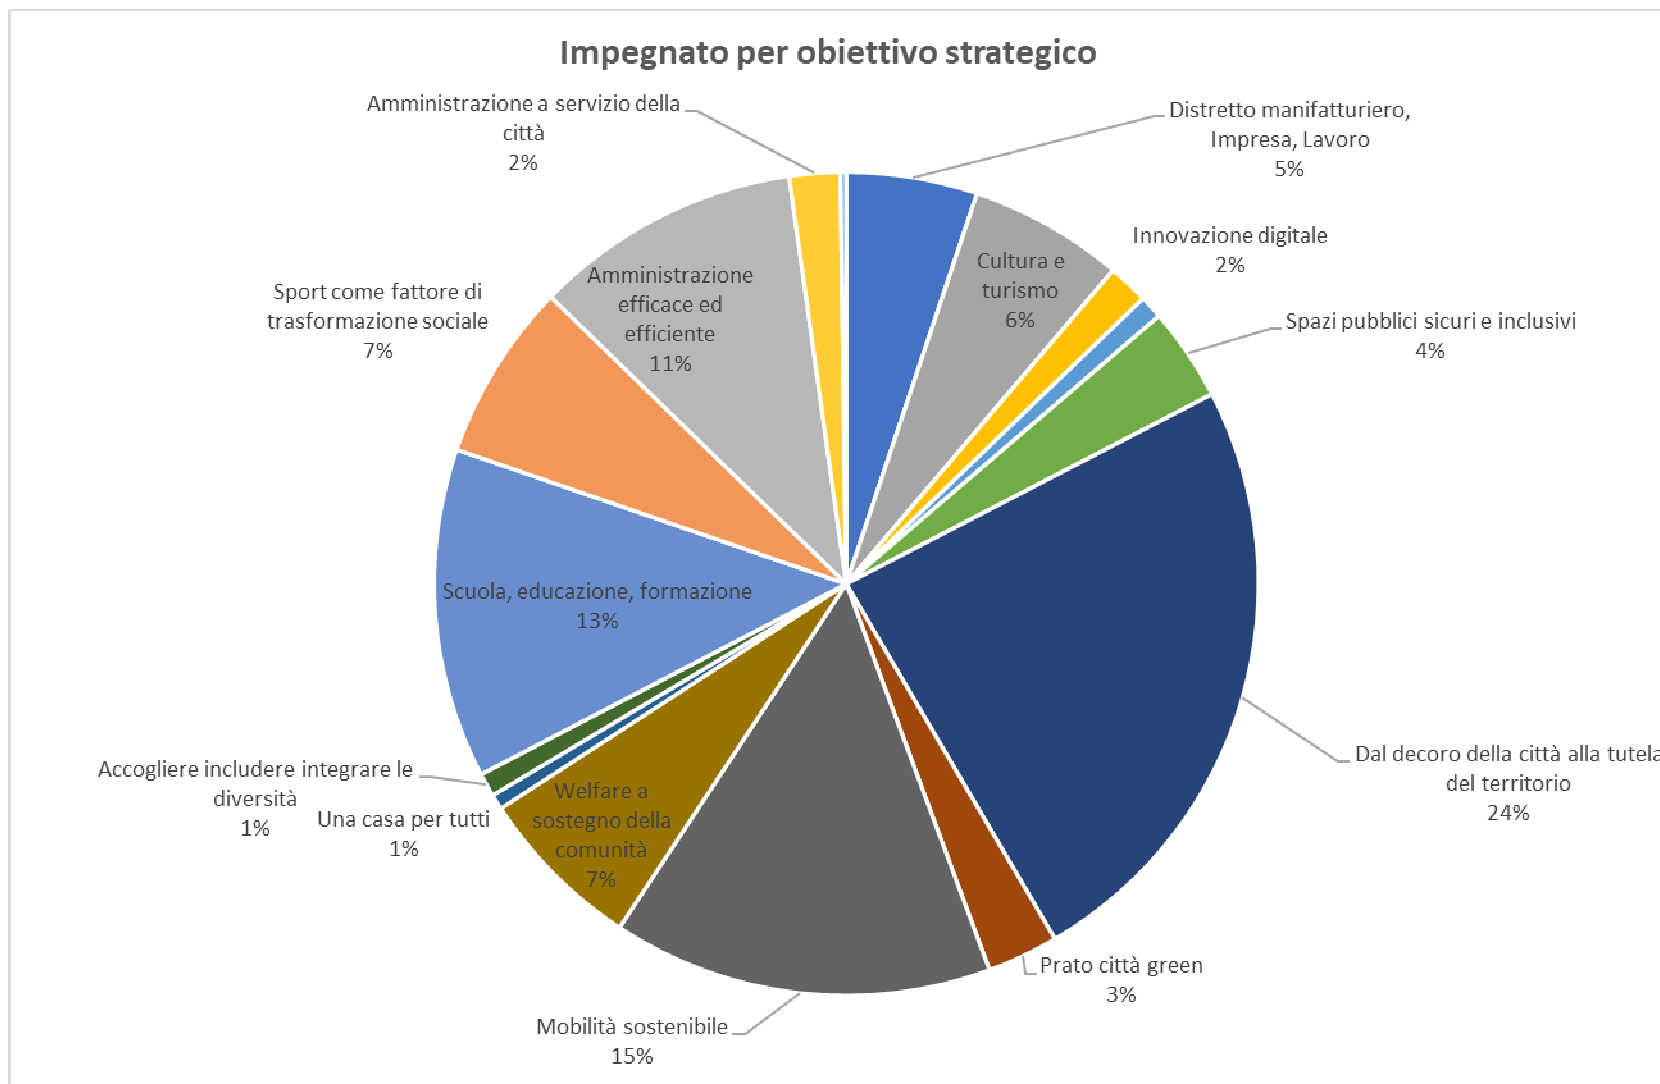


Grafico 7 – Impegnato per obiettivo strategico

Gli obiettivi strategici dove le spese dell'amministrazione sono state più rilevanti sono:

- *Dal decoro della città alla cura del territorio*, con il 24%: la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- *Mobilità sostenibile*, con il 15% dove rientrano le risorse per il trasporto pubblico urbano, per la realizzazione di piste ciclabili e per le infrastrutture stradali;
- *Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano*, con il 13%: in questo obiettivo rientrano i servizi rivolti ai bambini e giovani (mensa scolastica, asili nido, scuola dell'infanzia, centri gioco e biblioteche) e gli interventi di edilizia scolastica;
- *L'amministrazione efficace e efficiente*, con il 11% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti gli uffici interni dell'amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini;
- *Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità* con l'8%: qui troviamo tutta la spesa per i servizi sociali.

La tabella e i grafici seguenti riportano la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all'incremento delle attività finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 riferito alle partite di giro).

Obiettivo strategico	Impegnato parte corrente al 30/06/2023
Distretto manifatturiero, Impresa, Lavoro	2.301.167,13
Il centro storico e i paesi di Prato	-
Cultura e turismo	7.748.643,94
Innovazione digitale	3.617.783,42
Rigenerazione urbana	812.368,05
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	6.893.463,40
Dal decoro della città alla tutela del territorio	52.608.512,92
Prato città green	1.457.561,55
Mobilità sostenibile	1.722.928,46
Welfare a sostegno della comunità	15.893.458,35
Una casa per tutti	1.393.390,76
Accogliere includere integrare le diversità	2.265.290,59

Obiettivo strategico	Impegnato parte corrente al 30/06/2023
Scuola, educazione, formazione	25.336.808,04
Sport come fattore di trasformazione sociale	2.389.996,65
Amministrazione efficace ed efficiente	10.318.920,10
Amministrazione a servizio della città	4.878.278,10
Amministrazione che dialoga con i cittadini	556.635,94

Tabella 3: Spesa corrente per obiettivo strategico

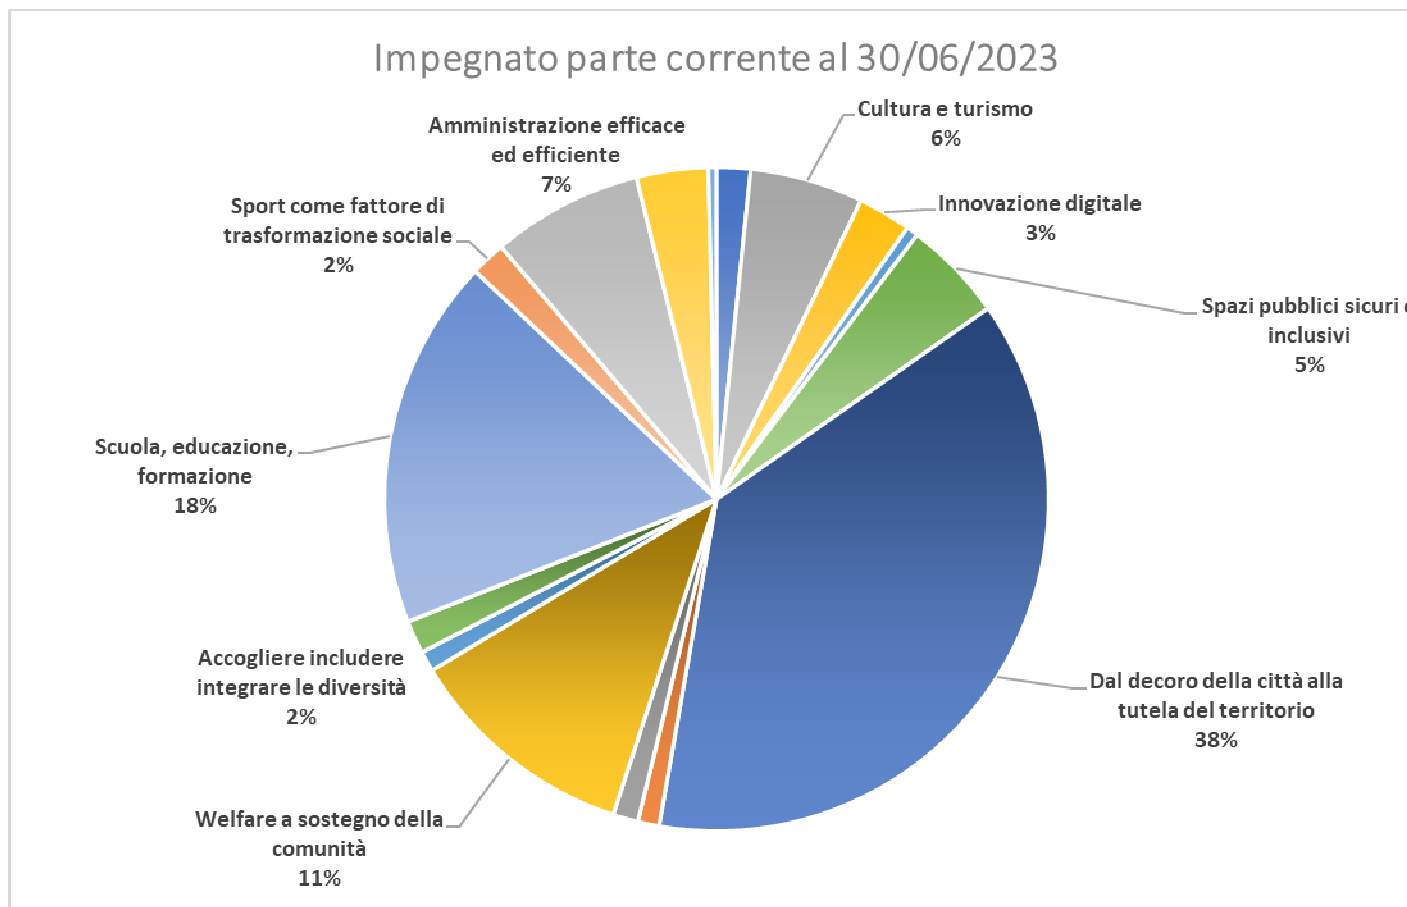


Grafico 8 – Impegnato al 30/06/2023 parte corrente

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa corrente sono: “Dal decoro della città alla cura del territorio”, “Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano”, “L’amministrazione efficace ed efficiente” e “Politiche per le famiglie e welfare a sostegno di comunità”.

Obiettivo strategico	Impegnato conto capitale al 30/06/2023
Distretto manifatturiero, Impresa, Lavoro	10.312.788,95
Il centro storico e i paesi di Prato	-
Cultura e turismo	7.136.071,27
Innovazione digitale	288.920,00
Rigenerazione urbana	1.430.956,64
Spazi pubblici sicuri e inclusivi	2.075.952,36
Dal decoro della città alla tutela del territorio	6.667.083,47
Prato città green	5.086.556,64
Mobilità sostenibile	34.484.640,10
Welfare a sostegno della comunità	156.487,28
Una casa per tutti	72.000,00
Accogliere includere integrare le diversità	-
Scuola, educazione, formazione	6.409.207,27
Sport come fattore di trasformazione sociale	14.744.952,19
Amministrazione efficace ed efficiente	12.997.036,37
Amministrazione a servizio della città	1.189,50
Amministrazione che dialoga con i cittadini	-

Tabella 4: Spesa in conto capitale per obiettivo strategico

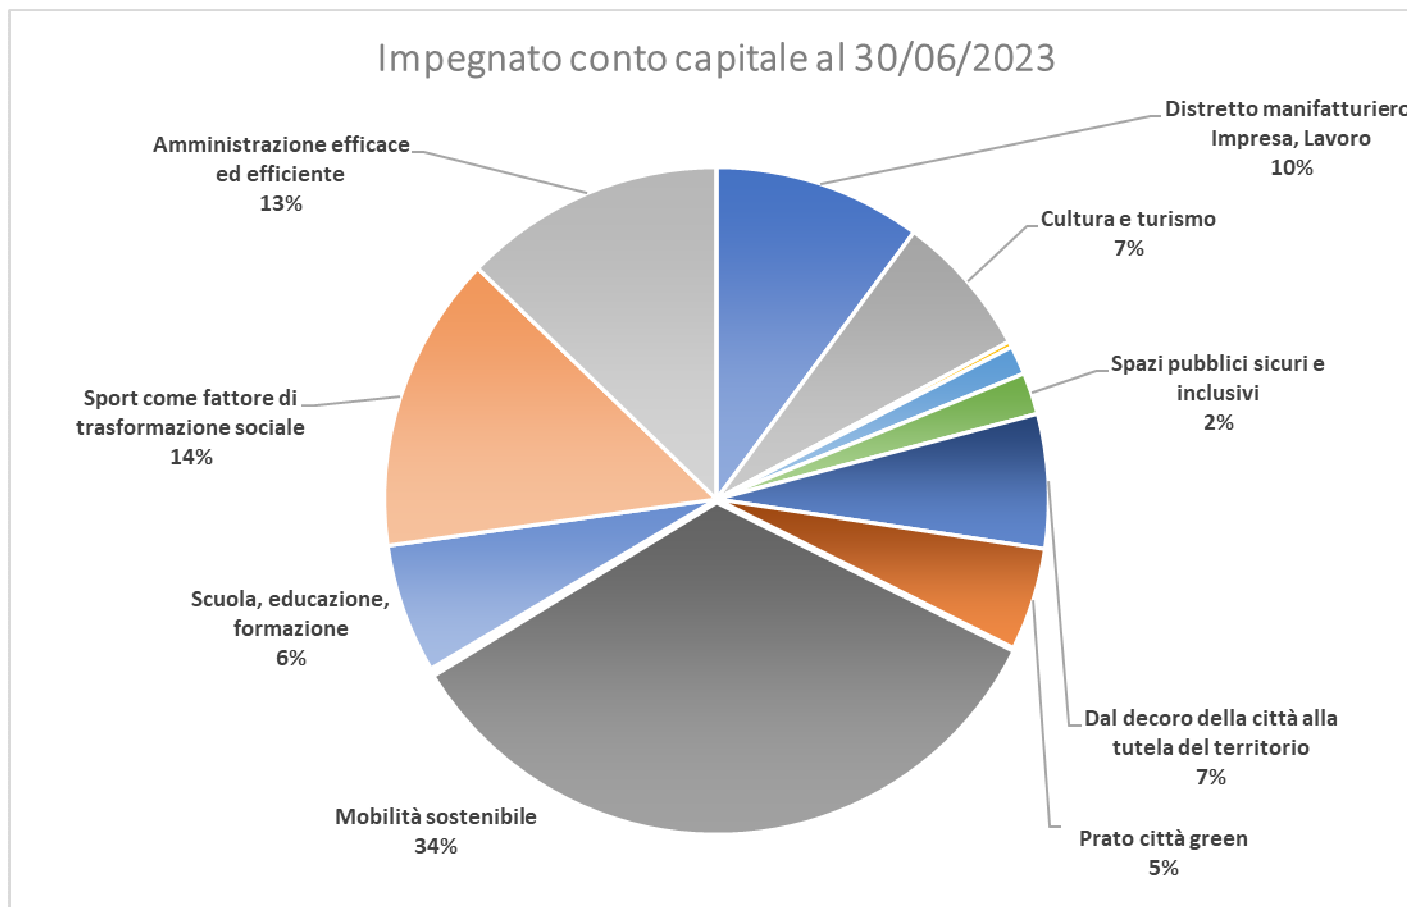


Grafico 9 – Impegnato al 30/06/2023 parte in conto capitale

Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in conto capitale sono: Mobilità sostenibile, Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale, Amministrazione efficace ed efficiente, Distretto manifatturiero, impresa e lavoro.

Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 30 giugno 2023

La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 30 giugno 2023, per un totale di 173 opere. Di cui:

- 10 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2023/2025;
- 60 riguardano progetti del Piano Opere 2022/2024,
- 58 il piano opere 2021/2023
- 45 sono opere riferite ad anni precedenti.

Stato	anni precedenti	2021-2023	2022-2024	2023-2025	Totale opere	Importo progetto
conclusi	12,00	13,00	3,00		28,00	6.548.644,30
lavori in corso	20,00	7,00	3,00	1,00	31,00	27.430.131,82
aggiudicazione	1,00	6,00	8,00	5,00	20,00	22.915.312,90
gara	1,00	5,00	35,00	4,00	45,00	39.659.189,87
progetto esecutivo	3,00	15,00	1,00		19,00	5.863.997,51
progetto definitivo	6,00	7,00	5,00		18,00	22.118.237,40
progetto definitivo/ esecutivo		1,00			1,00	1.056.675,50
Studio fattibilità	2,00	4,00	5,00		11,00	24.049.821,00
Totale complessivo	45,00	58,00	60,00	10,00	173,00	143.093.366,00

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i vari stati d'avanzamento. Le opere concluse sono il 16%, quelle con lavori in corso il 18%, quelle aggiudicate il 12%, quelle in fase di gara il 28% e quelle con progetto approvato il 17%.

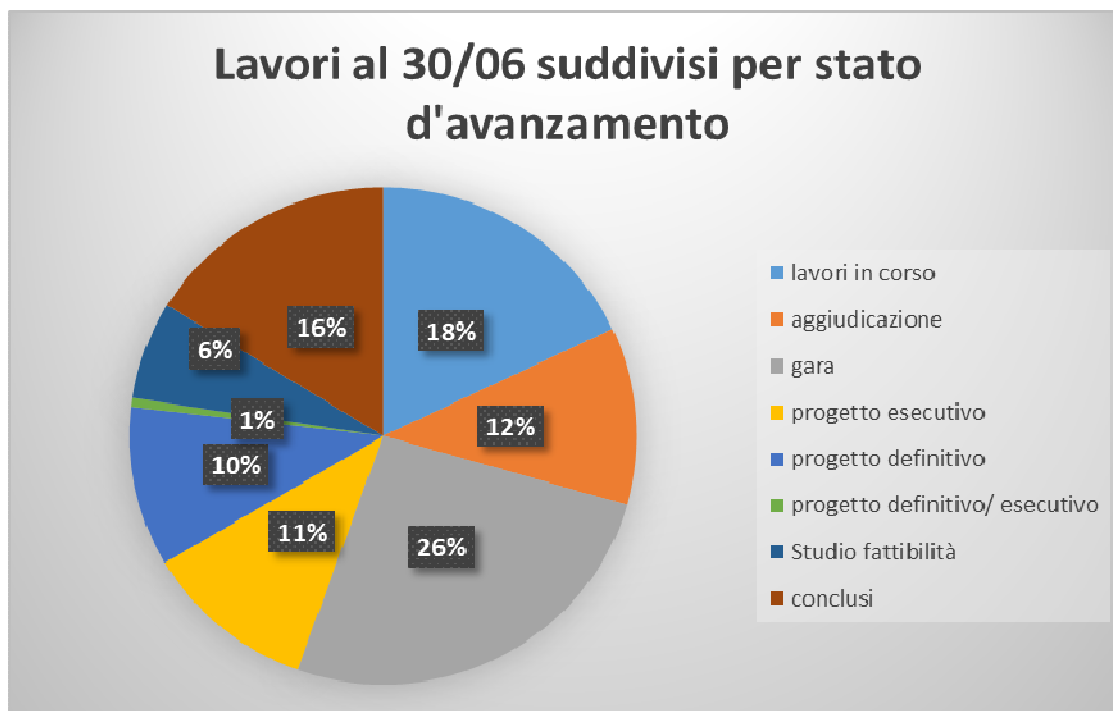


Grafico 10 – Classificazione lavori al 30/06/2023

Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento.

OPERE CONCLUSE:

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	Altri immobili	100.000,00
Museo Pecci. Interventi di completamento appalto principale: messa in sicurezza dei parapetti, dei controsoffitti e illuminazione esterna.	Altri immobili	130.000,00
Restauro fontana p.za Duomo	Altri immobili	90.000,00
Riqualificazione parco giochi Giocagìo 1 via Marradi "Andiamo al mare"	Ambiente	200.000,00
Orti all'interno della cassa ciondariale	Ambiente	50.000,00
Riqualificazione del giardino via Naldi/ via Guerra	Ambiente	45.000,00
Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 1° lotto Via Rimini	Ambiente	150.000,00
Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 2° lotto Area Pecci	Ambiente	150.000,00
Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitan	Ambiente	363.705,00
Manutenzione straordinaria scuola Crocini	Istruzione e servizi educativi	87.000,00
Copertura scuola Don Bosco	Istruzione e servizi educativi	100.000,00
Scuola primaria Bruni di Casale- realizzazione parcheggio lotto A	Istruzione e servizi educativi	261.563,89
Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	Istruzione e servizi educativi	915.000,00
sostituzione degli infissi della scuola d'infanzia Corridoni sita in Via Filippo Corridoni e della scuola primaria Antonio Bruni sita in Via di Brugnano n.20	Istruzione e servizi educativi	210.000,00

DESCRIZIONE	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO
Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgo San Paolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	Istruzione e servizi educativi	325.000,00
Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	Istruzione e servizi educativi	169.500,00
Messa a norma Stadio - tribuna d'onore	Sport	144.073,58
Riqualificazione via Roma vasche bimbi	Sport	447.712,84
Miglioramento funzionale di alcuni sottopassi nel Comune di Prato	Viabilità e trasporti	110.000,00
Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	Viabilità e trasporti	150.000,00
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 2	Viabilità e trasporti	565.000,00
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 4	Viabilità e trasporti	445.956,65
Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile via delle Fonti e via Fonda di Mezzana	Viabilità e trasporti	429.627,00
Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2	Viabilità e trasporti	317.369,00
Ampliamento rete ciclabili- realizzazione percorso ciclopedonale su via Marini	Viabilità e trasporti	193.392,00
A Collegamento viabilità Maliseti	Viabilità e trasporti	143.744,34
Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	Viabilità e trasporti	210.000,00

OPERE IN CORSO

Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti di investimento non ancora conclusi suddivisi per stato d'avanzamento e per area tematica

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
1	Parco giochi delle Civette via Curtatone	lavori in corso	Ambiente	32.000,00	
2	Digital Twin per il rischio meteo climatico	lavori in corso	Ambiente	80.000,00	
3	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 3° lotto Area Nenni	lavori in corso	Riqualificazione	550.000,00	
4	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	lavori in corso	Riqualificazione	824.851,65	
5	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Altri immobili	6.000.000,00	
6	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Altri immobili	3.231.903,16	
7	Officina giovani: manutenzione straordinaria copertura blocco ex celle frigo	lavori in corso	Altri immobili	250.000,00	
8	Rigenerazione del polo teatrale del Fabbricone- partecipazione	lavori in corso	Altri immobili	50.000,00	
9	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	1.000.000,00	
10	Ristrutturazione e risanamento strutturale Asilo Nido Arcobaleno	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	830.000,00	
11	Nuova mensa scuola Marcocci	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	350.000,00	
12	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	lavori in corso	Istruzione e servizi educativi	300.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
13	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la piscina di Via Roma	lavori in corso	Sport	1.420.000,00	
14	Nuovo Campo sportivo Paperino lotto 1 (erba)	lavori in corso	Sport	601.000,00	
15	Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	lavori in corso	Sport	5.100.000,00	
16	Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	lavori in corso	Viabilità e trasporti	1.091.602,01	
17	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	232.200,00	
18	Il tangenziale- Lotto 4-Opere di sistemazione idraulica dei prismi arginali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	260.000,00	
19	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio A	lavori in corso	Viabilità e trasporti	866.814,00	
20	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio B	lavori in corso	Viabilità e trasporti	483.480,00	
21	PH363 Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
22	PH362 Manutenzione piste ciclabili	lavori in corso	Viabilità e trasporti	100.000,00	
23	PH360 Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00	
24	PH380/2 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	565.000,00	
25	PH394 - Riqualificazione Via Visiana	lavori in corso	Riqualificazione	83.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
26	(PH395) Riqualificazione Via Luigi Spontini	lavori in corso	Riqualificazione	130.000,00	
27	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 2 suddiviso in ulteriori 2 lotti Lotto 2A e Lotto 2B	lavori in corso	Viabilità e trasporti	750.000,00	sì
28	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 3 suddiviso in ulteriori 2 lotti Lotto 3A e Lotto 3B	lavori in corso	Viabilità e trasporti	650.000,00	sì
29	Start Park- realizzazione nuove infrastrutture verdi e blu presso i giardini del Soccorso	lavori in corso	Viabilità e trasporti	198.250,00	
30	Urbanistica tattica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
31	Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione barriere architettoniche e ampliamenti funzionali	lavori in corso	Cimiteri	500.000,00	
32	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 1	aggiudicazione	Ambiente	3.700.000,00	sì
33	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 2	aggiudicazione	Ambiente		sì
34	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 3	aggiudicazione	Ambiente		sì
35	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 4	aggiudicazione	Ambiente		sì
36	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 5	aggiudicazione	Ambiente		sì
37	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 6	aggiudicazione	Ambiente		sì
38	Restauro fontana p.za S.Francesco	aggiudicazione	Altri immobili	30.000,00	
39	Restauro fontana p.za Mercatale	aggiudicazione	Altri immobili	10.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
40	Adeguamento sismico scuola Villa Charitas 1° lotto	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	300.000,00	
41	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia scolastica: Accordo Quadro - opere edili	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	262.200,00	
42	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia scolastica: Accordo Quadro - opere da fabbro	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	163.875,00	
43	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia scolastica: Accordo Quadro - opere da idraulico	aggiudicazione	Istruzione e servizi educativi	229.425,00	
44	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	aggiudicazione	Sport	300.000,00	
45	Pista atletica pavimentazione	aggiudicazione	Sport	300.000,00	
46	Adeguamento antincendio palestra via Roma	aggiudicazione	Sport	440.000,00	sì
47	Sport accordi quadro edili	aggiudicazione	Sport	280.250,00	
48	Sport accordi quadro impianti	aggiudicazione	Sport	280.250,00	
49	Impianto natatorio a lolo- piscina olimpionica	aggiudicazione	Sport	16.000.000,00	sì
50	Interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti: Ponte Petrino	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	429.292,90	sì
51	Illuminazione pubblica: PH399 interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	190.000,00	
52	Realizzazione di un parco attrezzato in via Turchia (giocagìo 2)	gara	Ambiente	866.146,87	
53	S.Caterina: tinteggiatura corte e teatro; restauro antiche mura nella corte	gara	Altri immobili	154.000,00	sì
54	S.Caterina: edificio diroccato nella corte	gara	Altri immobili	1.650.000,00	sì
55	S.Caterina: locali ex archivio storico anagrafe	gara	Altri immobili	264.000,00	sì

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
56	Palazzina edificio via Roma- riqualificazione	gara	Altri immobili	2.200.000,00	sì
57	Museo Pecci ex Radio Toscana: residenze per artisti	gara	Altri immobili	165.000,00	sì
58	Museo Pecci manutenzione straordinaria corte teatro	gara	Altri immobili	440.000,00	sì
59	Museo Pecci manutenzione straordinaria gradone	gara	Altri immobili	165.000,00	sì
60	Museo Pecci. riapertura CID e sistemazione archivi	gara	Altri immobili	275.000,00	sì
61	Officina giovani: recupero ex stalle	gara	Altri immobili	275.000,00	sì
62	Officina giovani: completamento recupero ex celle frigo- foyer di ingresso	gara	Altri immobili	120.000,00	sì
63	Officina giovani: piazzale e reti fognarie e di servizio	gara	Altri immobili	1.100.000,00	sì
64	Officina giovani: recupero del blocco Consiag	gara	Altri immobili	1.705.000,00	sì
65	Officina giovani: recupero piccolo capannone artigianale fronte piazza Macelli	gara	Altri immobili	220.000,00	sì
66	Officina giovani: recupero magazzino sotto ex celle frigo edificio Consiag	gara	Altri immobili	165.000,00	sì
67	Officina giovani: recupero facciate e infissi palazzina uffici	gara	Altri immobili	300.000,00	sì
68	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia monumentale e patrimoniale: Accordo Quadro - opere edili	gara	Altri immobili	211.200,00	
69	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia monumentale e patrimoniale: Accordo Quadro - opere da fabbro	gara	Altri immobili	132.000,00	
70	Lavori di manutenzione straordinaria su edilizia monumentale e patrimoniale: Accordo Quadro - opere da idraulico	gara	Altri immobili	184.800,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
71	Riqualificazione scuola Abatoni per realizzazione centro bambini e famiglie	gara	Istruzione e servizi educativi	676.000,00	sì
72	Mensa scuola Mascagni	gara	Istruzione e servizi educativi	595.000,00	sì
73	Scuola Cironi	gara	Istruzione e servizi educativi	16.066.000,00	sì
74	Complesso scolastico sportivo via Galcianese- cabina elettrica	gara	Sport	150.000,00	
75	Riqualificazione campo di rugby Montano	gara	Sport	2.420.000,00	sì
76	Riqualificazione campo calcio Maliseti	gara	Sport		sì
77	Riqualificazione campo calcio Ribelli- Viaccia	gara	Sport		sì
78	Riqualificazione campo di calcio Fantaccini	gara	Sport		sì
79	Campo di calcio Paperino lotto 2	gara	Sport	880.000,00	sì
80	Piscina Galilei: riqualificazione impianti	gara	Sport	400.000,00	sì
81	Sottopasso via Ciulli	gara	Viabilità e trasporti	200.000,00	
82	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 1A	gara	Viabilità e trasporti	495.000,00	sì
83	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 1B	gara	Viabilità e trasporti	495.000,00	sì
84	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 4A	gara	Viabilità e trasporti	440.000,00	sì
85	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 4B	gara	Viabilità e trasporti	440.000,00	sì

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
86	PH412-1 Ciclabile stazione centrale/ riconnessione	gara	Viabilità e trasporti	726.000,00	sì
87	PH412-2 Ciclabile Borgonuovo-Filzi-Pistoiese/ Riconnessione	gara	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
88	PH412-3 Ciclabile Liliana Rossi-Coiano-Chiesanuova/ Riconnessione	gara	Viabilità e trasporti	741.400,00	sì
89	PH412-4 Ciclabile Via Roma- via Carlo Marx/ Riconnessione	gara	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
90	PH412-5 Ciclabile Narnali-Maliseti/ Riconnessione rigenerazione	gara	Viabilità e trasporti	451.000,00	sì
91	PH412-6 Ciclabile Catani/riconnessione-rigenerazione	gara	Viabilità e trasporti	898.700,00	sì
92	PH412-7 Ciclabile Galciana-Vergaio-Ospedale/ Ricucitura- rigenerazione	gara	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
93	PH292D Interventi infrastrutturali Riqualificazione via pistoiese	gara	Viabilità e trasporti	728.000,00	
94	Interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti: Ponte alla Vittoria	gara	Viabilità e trasporti	627.000,00	sì
95	Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine	gara da ribandire	Altri immobili	330.000,00	sì
96	S.Caterina: sostituzione infissi	gara da ribandire	Altri immobili	275.000,00	sì
97	Trasformazione dell'immobile adibito alla scuola secondaria di primo grado Don Bosco nella nuova sede del Centro per l'impiego di Prato	progetto esecutivo	Altri immobili	663.061,26	
98	Nuovo parcheggio scuola materna Pacciana	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	250.000,00	
99	Schermature solari scuole Don Bosco e Ciliani	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	120.000,00	
100	Riqualificazione energetica scuola Borgonuovo	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	94.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
101	Riqualificazione energetica scuola Manzi	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	15.500,00	
102	Riqualificazione energetica scuola Rodari	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	50.000,00	
103	Riqualificazione energetica scuola Fermi succursale	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	83.700,00	
104	Riqualificazione energetica impianti termici Manzi- Rodari- Fermi	progetto esecutivo	Istruzione e servizi educativi	81.500,00	
105	PH025/4A Seconda tangenziale lotto 4A4 - completamento seconda tangenziale opere di riequilibrio ambientale. Laminazione area lago di Pantanelle	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	206.871,97	
106	PH370 Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	274.844,37	
107	PH401 Interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza dei Ponti carrabili e pedonali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	224.067,90	
108	Ciclabile di collegamento fra via Coppola e ciclabile Giulio Bresci	progetto esecutivo	Riqualificazione	170.000,00	
109	Collegamento ciclabile Paperino- S. Giorgio, via del Ferro	progetto esecutivo	Riqualificazione	700.000,00	
110	Completamento e attrezzature ciclabile connessione stazione- piazza Carceri	progetto esecutivo	Riqualificazione	330.000,00	
111	Realizzazione nuovo tratto e miglioramento della connessione ciclabile via Ferraris- via Roma- Parco della Liberazione e pace	progetto esecutivo	Riqualificazione	470.000,00	
112	Completamento e miglioramento ciclabile connessione stazione Borgonuovo- Ospedale	progetto esecutivo	Riqualificazione	600.000,00	
113	Ristrutturazione e miglioramento rete piste ciclabili	progetto esecutivo	Riqualificazione	523.516,16	
114	Nuova pista ciclabile viale Montegrappa lotto 5	progetto esecutivo	Riqualificazione	650.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
115	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	progetto esecutivo da riapprovare	Sport	356.935,85	
116	Realizzazione parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	7.120.000,00	
117	Realizzazione deposito complementare al parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	700.000,00	
118	Farm Park via delle Pleiadi	progetto definitivo	Riqualificazione	249.791,84	
119	Castello dell'Imperatore - sostituzione piattaforma elevatrice	progetto definitivo	Altri immobili	87.155,74	
120	Riqualificazione palazzina vigili S.Lucia	progetto definitivo	Altri immobili	150.000,00	
121	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Istruzione e servizi educativi	4.498.008,00	
122	Scuola primaria d'Amico: riqualificazione energetica	progetto definitivo	Istruzione e servizi educativi	600.000,00	
123	Riqualificazione vasca 50m piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	1.402.287,00	
124	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
125	Messa in sicurezza via Firenze Lotto 3: tratto da Ponte Petrino a La Querce	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00	
126	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 1, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	717.559,22	
127	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 2, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	908.886,25	
128	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 3, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Riqualificazione	191.918,77	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
129	PH420 Adeguamento funzionale di spazi di sosta e locali per la creazione di velostazione (spostamenti casa-lavoro)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	297.044,02	
130	Ciclovia del Sole Verona- Firenze	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	3.177.622,00	sì
131	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 1 (PH419-1)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	61.663,96	
132	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 2 (PH419-2)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	118.181,00	
133	Nuova pista ciclabile via Dossetti	progetto definitivo	Riqualificazione	738.119,60	
134	Mobilità casa scuola Galcianese- S.Paolo lotto 2 stralcio 2, lotti 1 e 2 stralcio 3,4,5	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	1.056.675,50	
135	Nuova Palazzina Vigili area Serraglio	Studio fattibilità	Altri immobili	2.000.000,00	
136	Museo Palazzo Pretorio. Interventi urgenti in facciata	Studio fattibilità	Altri immobili	180.000,00	
137	Riqualificazione Pattinodromo Palarogai 1° lotto	Studio fattibilità	Sport	450.000,00	
138	Riqualificazione immobile via della Fonderia	Studio fattibilità	Urbanistica	6.000.000,00	
139	Forestazione Parco Santo Stefano (Ospedale)	Studio fattibilità	Ambiente	256.620,00	
140	Cassa di espansione Vella	Studio fattibilità	Ambiente	1.164.940,00	
141	Complesso ex Campolmi- Museo del Tessuto e Biblioteca Lazzerini- Riqualificazione della Piazza delle Mura: un nuovo spazio urbano tra storia natura e cultura	Studio fattibilità	Altri immobili	198.250,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
142	Scuola secondaria di primo grado e palestra in via San Martino di Galceti del Comprensivo Nord	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	9.800.000,00	
143	Riqualificazione energetica scuola Cecchi Paperino	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	1.800.000,00	
144	Riqualificazione energetica Fermi	Studio fattibilità	Istruzione e servizi educativi	2.000.000,00	
145	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale (PH376)	Studio fattibilità	Viabilità e trasporti	200.000,00	

Oltre alle opere sopra riportate, la cui realizzazione è seguita direttamente dagli uffici tecnici dell'amministrazione comunale, ci sono altri interventi la cui progettazione e realizzazione è seguita da soggetti terzi, fra cui il Sottopasso del Soccorso, la cui realizzazione spetta ad ANAS.

Parte 4 – Considerazioni sull’andamento del 1° semestre 2023

Come riportato nel paragrafo 1.3 relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, alcuni obiettivi hanno livelli di raggiungimento alti, pari o superiori al 90%:

- *Spazi pubblici sicuri e inclusivi (98%)*: il calcolo dei livelli di raggiungimento è calcolato principalmente sui dati 2022, poiché si tratta di dati che si rilevano su base annuale.
- *Rigenerazione urbana (90%)*: l’obiettivo operativo “Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni” è già stato completamente raggiunto nel 2022, mentre l’obiettivo operativo “Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso sostenibile del suolo”, ha una percentuale di realizzazione dell’ 80% al 2022

Alcuni obiettivi strategici risultano in ritardo rispetto al raggiungimento dei risultati finali attesi. Si tratta di:

- *una casa per tutti (42%)*: l’obiettivo operativo *Edilizia residenziale pubblica*, che riguarda l’assegnazione degli alloggi popolari, ha un livello di realizzazione basso, poiché la graduatoria è stata pubblicata nel 2022, così come l’assegnazione di alloggi è iniziata nel 2022. Si dimostra comunque un miglioramento nel tempo, cercando di avvicinarsi al target atteso. Relativamente all’obiettivo operativo *Housing sociale*, le azioni previste stanno riscontrando difficoltà dovute al contesto esterno e di conseguenza i risultati raggiunti sono rimasti fermi al 2020.
- *l’amministrazione che dialoga (58%)*: l’obiettivo operativo *Comunicazione efficace* ha un il livello di avanzamento che è aumentato poco rispetto al 2022. Mentre per quanto riguarda l’obiettivo operativo *Diritto di essere ascoltati*, che è stato inserito nel Dup 2023/2025 e ha accolto al suo interno tutta la strategia comunicativa relativa alla candidatura di Prato a “Citta amica dei bambini e degli adolescenti” (Unicef), risulta in linea con le previsioni e si prevede che molte delle azioni previste si concludano nel 2023.

Per quanti riguarda gli altri obiettivi strategici, risultano livelli di realizzazione adeguati. Tuttavia ci sono alcuni obiettivi operativi indietro rispetto alle previsioni e che potrebbero pregiudicare il raggiungimento finale della strategia. Si tratta di:

- *Recupero patrimonio culturale, Nuovi collegamenti stradali, Scuole belle e sicure*: il raggiungimento dei risultati è legato alla conclusione di lavori, i cui tempi di realizzazione sono più lunghi rispetto ad attività correnti. Occorre un costante monitoraggio sul rispetto delle tempistiche.
- *Tutelare gli animali*: la realizzazione del nuovo canile, trattandosi di un’opera pubblica ha una tempistica di realizzazione pluriennale.
- *Tutelare i minori e supportare una genitorialità responsabile*: obiettivo operativo inserito nel 2023 di conseguenza necessiterà di un po’ di tempo prima di raggiungere i risultati.

Ci sono inoltre degli obiettivi operativi che sono già stati raggiunti al 100% nel 2022: “verso un nuovo modello di gestione dei servizi socio sanitari”, “riqualificazione spazi pubblici nelle frazioni” e “tutela del territorio”.

Parte 5 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura del Servizio Risorse, Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Tabella 4 – Realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazioni	breve descrizione attività svolte
Consiag Servizi Comuni srl								
Città del futuro LA CITTA' CURATA	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze,.....)	Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Valutazione e monitoraggio del rischio arboreo delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici e scolastici nei giardini pubblici e negli impianti sportivi.	Supporto all'Amministrazione affinché sia a conoscenza del rischio arboreo delle alberature comunali	presentazione di report sulle attività svolte	fatto	100%	E' stata svolta la valutazione visiva speditiva di 6013 alberi, classificati nel gestionale come PESSIMI E SCADENTI, più quelli MEDIOCRIS con circ. > 60 cm.
			Approfondimento diagnostico strumentale sulle alberature che hanno manifestato criticità	Supporto all'Amministrazione affinché sia a conoscenza del rischio arboreo delle alberature comunali	presentazione di report sulle attività svolte	in corso	10%	L'approfondimento diagnostico mediante prove strumentali sarà effettuato nel secondo semestre, come previsto dall'integrazione e al disciplinare
		Verde pubblico: Miglioramento del decoro urbano	Mantenimento delle fioriere presenti nel centro storico di Prato	Mantenere il decoro urbano	presentazione di report sulle attività svolte	fatto	100%	E' stato implementato il numero delle fioriture stagionali da

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								sosituire
		Verde pubblico: Miglioramento dell'informazione e sull'utilizzo di aree a verde pubblico	Installazione di appositi pannelli segnaletici informativi sul corretto utilizzo delle aree a verde pubblico	Promozione del corretto utilizzo delle aree verdi	presentazione di report sulle attività svolte	in corso	10%	Sono stati installati cartelli sul corretto utilizzo delle aree sgambatura cani
		Proseguimento da parte di personale di Consiag Servizi Comuni srl all'effettuazione del restante 50% di verifiche di 1° livello di ponti e passerelle ed al loro inserimento nel programma specifico per la verifica di tali tipi di infrastrutture censite (completamento del 100% delle verifiche di 1° livello). Avvio delle verifiche di 2° livello rispetto a ponti e	Effettuazione da parte di Consiag Servizi Comuni srl, tramite apposito programma informatico, delle verifiche di 1° livello di ponti e passerelle censite (restante 50%, fino al completamento del 100%). Avvio verifiche di 2° livello	Predisposizione di schede relative ad ogni infrastruttura (ponte/passerella) verificata (il restante 50%, fino a completare il 100% di verifiche di 1° livello rispetto a quelle censite). Predisposizione schede verifiche di 2° livello di ponti e passerelle a carattere maggiormente strategico e/o interessati da maggior intensità di traffico veicolare	Report finale	in corso di realizzazione	80%	Completata la fase di censimento (effettuazione al 100% delle verifiche di primo livello). Avviata la fase di ispezione (individuate le opere per le ispezioni di secondo livello, in accordo con il Servizio Mobilità)

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		passerelle a carattere maggiormente strategico e/o interessati da maggior intensità di traffico veicolare						
Città del futuro PRATO CITTA' GREEN	Sviluppare il verde urbano per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Sviluppo del patrimonio arboreo mediante strategie dell'Action Plan di Forestazione Urbana. Rilevazione attuale capacità di irrigazione del modello gestionale, ed ottimizzazione della stessa al fine di garantire la migliore riuscita dei nuovi impianti arborei	Rilevamento sul campo delle aree AVP individuate dal Comune fra quelle in gestione di Consiag, analisi e valutazione dei dati ottenuti al fine di elaborare un piano di sviluppo tecnico-economico dei singoli impianti di irrigazione e delle eventuali criticità	Presentazione piano sviluppo dei sistemi di irrigazione n. piani sviluppo elaborati	Report finale	in corso	50%	Nel secondo semestre, a seguito dell'integrazione e del budget, è previsto il posizionamento di nuovi contatori a valle di quelli Publiacqua con sensori per monitorare da remoto il flusso d'acqua e intercettare eventuali perdite. E' in corso di valutazione con i competenti Uffici Comunali la possibilità di

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								installare eventuali sensori umidità.
Città del futuro MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare le infrastrutture stradali a servizio della città	Proseguimento della definizione del sistema di gestione della sosta rispetto all'intero territorio comunale, con rilievo e censimento della sosta libera nelle aree limitrofe e continue con quelle della sosta a pagamento, con anche verifica degli indici di rotazione	Rilievo degli stalli di sosta libera nelle aree limitrofe e continue a quelle della sosta a pagamento, sua articolazione per vie con corrispondente numero di stalli di sosta, creazione di relativo database, verifica dell'indice di rotazione per vie o zone omogenee	Presentazione di report sulle attività svolte, definizione data base per vie o zone omogenee, individuazione di indice di rotazione per vie o zone omogenee	Report finale	in corso di realizzazione	25%	In corso l'attività di rilievo degli stalli di sosta nelle aree concordate con il Servizio Mobilità

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Attuazione di piano della sosta in corrispondenza del comparto di Via Pistoiese oggetto di intervento di riqualificazione, quale piano stralcio e progetto pilota rispetto al più complessivo Piano Urbano della Sosta	Attuazione di piano stralcio della sosta per il comparto di via Pistoiese, con realizzazione segnaletica, installazione dispositivi, attivazione di campagna informativa ai cittadini, emanazione di specifica ordinanza di istituzione, attività di rilascio nuove autorizzazioni e controllo della sosta	Approvazione progetto, emanazione ordinanza di istituzione, realizzazione segnaletica ed installazione dispositivi, permessi rilasciati, attività di controllo	Report finale	in corso di realizzazione	0%	CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. resta in attesa di apposita ordinanza attuativa del progetto
		Definizione del progetto di un sistema di indirizzamento e segnalazione a controllo elettronico ed informatizzato verso i parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale (Serraglio, Porta Fiorentina, Ebensee) con indicazione del numero di posti	Definizione del progetto di un sistema di indirizzamento e segnalazione a controllo elettronico ed informatizzato verso i parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale, realizzazione interventi previsti dal progetto, redazione di report mensili degli indici di utilizzo di tali parcheggi	Definizione del progetto, realizzazione degli interventi, rilevamento mensile degli indici di utilizzo dei parcheggi in struttura di Serraglio, Porta Fiorentina ed Ebensee e confronto con quelli precedenti l'intervento	Report finale	fatto	100%	Completata installazione e messa in funzione numero 4 pannelli informativi

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		disponibili, e redazione di report mensili tali da costituire elementi di paragone degli indici di utilizzo di tali parcheggi rispetto alla situazione precedente in assenza di tale sistema di indirizzamento e segnalazione						
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci	Presentazione ed attivazione di progetto per la ridefinizione di un nuovo e diverso sistema di rilascio autorizzazioni e permessi per la ZTL	Presentazione ed attivazione progetto	Presentazione progetto, attivazione rilascio permessi/autorizzazioni	Report finale	in corso di realizzazione	50%	In corso di definizione l'individuazione di migliorie all'attuale sistema di rilascio permessi

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'</p>	<p>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</p>	<p>Attivazione di tavolo settimanale/quindicinale di lavoro con il personale del Servizio Mobilità e Infrastrutture al fine di definire, sulla base di segnalazioni, sopralluoghi e monitoraggi periodici, le priorità periodiche degli interventi manutentivi da realizzare sulle sedi stradali comunali, sia in ambito di manutenzione del manto stradale che della segnaletica (produzione di volta in volta di report con le priorità di intervento)</p>	<p>Effettuazione di incontri periodici con cadenza settimanale/quindicinale e definizione di relativi report con le priorità periodiche di interventi manutentivi su strade (manto stradale e segnaletica)</p>	<p>Nr. di incontri effettuati, Nr di report con priorità di intervento prodotti</p>	<p>Report finale</p>	<p>fatto</p>	<p>100%</p>	<p>Predisposti tutti i report di competenza e tempestivamente inoltrati al Servizio Mobilità; tavolo settimanale/quindicinale di lavoro attivato</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazioni	breve descrizione attività svolte
Edilizia Pubblica Pratese spa								
Città Diritti e Opportunità UNA CASA PER TUTTI	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Aumentare il patrimonio di alloggi ERP per graduatoria ordinaria e in utilizzo autorizzato, incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e recupero dell'esistente.	Aumento numero alloggi da assegnare al Comune di Prato, tramite ristrutturazione alloggi di risulta	Nr. alloggi di risulta ristrutturati	15	in corso	126%	Consegnati 19 alloggi di risulta ripristinati
			Aumento numero alloggi da assegnare al Comune di Prato, tramite ristrutturazioni o acquisizione nuovi alloggi	Nr. nuovi alloggi consegnati	32	in corso	31%	Acquisiti a patrimonio ERP un totale di 10 alloggi
		Miglioramento della qualità degli alloggi già assegnati monitorandoli con interventi di verifica e programmazione e manutenzione	Alloggi assegnati verificati e programmazione interventi	nr.alloggi con verifica situazione esistente e proposta interventi miglioramento	10	Non fatto	0	

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		straordinaria, se necessaria.						
		Passaggio appartamenti di emergenza alloggiativa come alloggi ERP in utilizzo autorizzato (BAITOR)	conferimento alloggi	data massima per il conferimento	31.12.2023	in corso		Riunioni in corso circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari
	Promuovere il social housing e le politiche abitative innovative	Attuazione interventi PNRR Missione 5. Ristrutturazione alloggi PNRR Missione 5 Intervento 1.2. (1 appartamento ricavato da due vuoti per Autonomia Disabili)	Consegna 1 alloggio ristrutturato e completo, secondo il progetto PNRR e la convenzione sottoscritta con ente attuatore	data consegna	30.06.2024	in corso		Riunioni in corso circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari
		Attuazione interventi PNRR Missione 5.n Ristrutturazione alloggi PNRR Missione 5 intervento 1.3.1 housing sociale	Consegna 4 alloggi ristrutturati e completi, secondo il progetto PNRR e la convenzione sottoscritta con ente attuatore	data consegna	30.10.2024	in corso		Riunioni in corso circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		(4 alloggi da ristrutturare Via Tieri o V. del Crocifisso-Baitor)						
So.ri spa								
Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci	Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP, CIMP, Canone unico patrimoniale	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2023 >= importo previsto nel bilancio di previsione	In corso di realizzazione	35-40%	L'esercizio dell'attività impositiva è in corso di esecuzione in conformità con gli obiettivi annualità resi dal Comune, i quali verranno interamente rispettati: nel primo semestre l'Ufficio ha provveduto oltre all'attività di emissione e notificazione anche alla preparazione e pianificazione dell'attività impositiva del secondo semestre volta al potenziamento del contrasto

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								all'evasione
		Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	Importo incassi 2023 >= 2022	In corso di realizzazione	55%	La società sta attuando, in conformità con gli obiettivi annuali, le attività di riscossione bonaria e coattiva con volumi pre-pandemici, ottenendo risultati che appaiono conformi e/o livemente superiori a quelli del 2022

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività effettuate	completamento degli interventi di sviluppo dei servizi di gestione dell'utenza e dei servizi di rilevazione dell'evasione sul territorio	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	Numero utenti serviti >= 2022; numero sopralluoghi effettuati 2023>=2022	In corso di realizzazione	50%	La società è pienamente impegnata nelle attività di sopralluogo sul territorio in conformità con i protocolli stilati con il Comune ottenendo risultati (in termini di movimentazioni e Entrate, pagamenti e rateizzazioni) conformi, attualmente, a quelli dell'annualità precedente. Inoltre dalla metà del mese di Giugno 2023 hanno trovato ingresso n. 2 risorse interinali (con competenza linguistica anche del cinese) destinati al rafforzamento e potenziamento dell'attività sul territorio per

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								Prato e per i Comuni soci. Riguardo ai servizi all'utenza, l'azienda sta garantendo gli standard qualitativi del 2022, al contempo è in corso di completamento l'attivazione (sperimentale) di ulteriori servizi ai cittadini costituiti dal rafforzamento del call-center e dall'introduzione e di un portale telematico per il dialogo ed interazione digitale del cittadino con l'azienda e con i servizi erogati
Fondazione Parsec								

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazioni	breve descrizione attività svolte
Città del futuro LA CITTA' CURATA	Tutelare il territorio e gli animali	Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva. Riattivazione delle attività museali relative alla collezione di minerali e meteoriti nei locali della Curia all'interno del Parco di Galceti	Presentazione all'Amministrazione di un progetto di spostamento della collezione di meteoriti e minerali all'interno degli spazi di proprietà della Curia in Galceti e di allestimento di un nuovo spazio museale.	Rendere edotta l'Amministrazione sui fabbisogni di fruibilità e valorizzazione di Parsec, al fine di poter riattivare le attività museali all'interno dei locali della Curia	Elaborazione da parte di figure professionali competenti e presentazione all'Amministrazione di un progetto di allestimento museale per la collezione di meteoriti e minerali	Non fatto	0%	In attesa di definire scelte strategiche sulla collocazione delle nuove strutture ospitanti le collezioni.
		Separare l'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Presentazione agli enti competenti sovraordinati per l'espressione dei nullaosta di competenza, del progetto di separazione dell'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Attivare le procedure per poter separare l'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Trasmissione all'Amministrazione Comunale dei protocolli di invio di progetti e modulistica specifica agli enti sovraordinati per l'espressione dei nullaosta di competenza	In corso	15%	Realizzata parte degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che non necessitano di permessi di alcun tipo.

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE</p>	<p>Migliorare l'efficienza interna per essere più efficaci.</p>	<p>Contenimento dei costi per personale e prestazioni di servizi</p>	<p>Contenimento dei costi con particolare riferimento alla spesa di personale e alla spesa per prestazioni di servizi ad esclusione di quella necessaria per le progettualità richieste dall'Amministrazione</p>	<p>Non aumentare il contributo a favore di Parsec</p>	<p>Presentazione di relazione tecnico-contabile</p>	<p>In corso</p>	<p>50%</p>	<p>Attivati i necessari processi di controllo e contenimento dei costi. Il contributo dovrà essere incrementato poiché non sono stati realizzati quegli interventi necessari alla realizzazione del Parco delle Scienze, obiettivo assolutamente necessario per permettere alla Fondazione di conseguire una maggiore autonomia economico-finanziaria.</p>
<p>Associazione Camerata Strumentale Città di Prato</p>								

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazioni	breve descrizione attività svolte
Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione e di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	27/27	100%	le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentazione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	16/16	100%	le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz
Fondazione per Arti Contemporanee in Toscana								

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO</p>	<p>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</p>	<p>Operare affinché l'Urban Center diventi centro di elaborazione e di diffusione delle pratiche di forestazione, di economia circolare di riqualificazione urbana, costituendo strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative</p>	<p>Programmazione e gestione attività Urban Center</p>	<p>calendario degli eventi</p>	<p>Rreport attività svolta</p>	<p>in corso di realizzazione</p>	<p>70%</p>	<p>Prospettiva Fitocentrica - Collettivo Synap(see), mostra a cura di Steve Bisson; Let it bee, incontro nell'ambito del progetto Prato Urban Jungle; PRATO IMMAGINA: Laboratori partecipativi a cura di Avventura Urbana, Mostra fotografica finale a cura di Avventura Urbana; Belvedere RN-M-G-M/G-Cit UNI EN 13163:2013, progetto di (ab)Normal, Captcha Architecture e Emilio Vavarella; Elementi dell'abitare - Cartoline di Prato: mostra</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								fotografica di Corinna Del Bianco; Prato Forest City: Conferenza Stampa di lancio; Prato in translation, giornate di studio a cura di Andrea Valzania
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione e di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>Report attività svolta</p>	<p>in corso di realizzazione</p>	<p>50%</p>	<p>1. Sviluppo del programma di membership. Nuove affiliazioni: IED, Co-edì, Antiletex Flock Italia. 2. Accordo con Fondazione Fresco Parkinson per la gestione e promozione mostra di opere realizzate da persone con Parkinson e iniziativa di fundraising cena con asta delle medesime</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								opere
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	1. Visite guidate gratuite alle mostre grazie al sostegno di UNICOOP FIRENZE ogni domenica pomeriggio. 2. Laboratori Eccentrici! Campus estivo in collaborazione con il Museo del Tessuto. 3. Laboratorio attività espressive in collaborazione con ASL Toscana Centro

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Fondazione Museo del Tessuto								
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché l'innovazione e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: collaborare al progetto di crescita della reputazione del distretto attraverso il progetto TIPO. Turismo industriale Prato.	Progettazione e gestione attività TIPO	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	50	Nel primo semestre è stato portato a compimento il programma dell'edizione 2022-2023 riguardante i primi mesi dell'anno, secondo la programmazione e impostata a settembre 2022. Si è inoltre provveduto alla gestione, organizzazione e promozione del festival TIPO, quattro giorni di eventi che si sono svolti dal 21 al 23 aprile.

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione e di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>Report attività svolta</p>	<p>in corso di realizzazione</p>	<p>50</p>	<p>Prosegue la partecipazione del Museo alle attività del sistema museale Pratomusei. Sono state portate a termine le attività previste dal progetto Cantiere digitale rivolto alle scuole e sono proseguite le attività di coordinamento tra le sezioni didattiche per l'erogazione dei servizi educativi. Sono proseguite le azioni coordinate anche su altri progetti condivisi (ad esempio progetto "imPatti creAttivi" - presentato dal capofila</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								Cooperativa Pane e Rose sul bando Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per la promozione di patti educativi di comunità nella città di Prato) che vedono riuniti i musei della rete e altre istituzioni culturali. Sul fronte del fundraising si segnala il proseguimento della campagna di adesione al Supporter Club (club di aziende del territorio sostenitrici del Museo) e la ricerca di bandi di ambito nazionale. Prosecuzione del progetto "PRATO phygital – Sinergia

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								creativa per la competitività” sul bando del MISE relativo all’impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi (insieme a Manifatture Digitali).

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	50	La programmazione e espositiva del primo semestre 2023 ha visto la chiusura della mostra su Ossie Clark e Celia Birtwell e il relativo trasferimento a Milano presso la sede della Fondazione Sozzani. A fine aprile inaugurata la mostra "Kimono. Riflessi d'arte tra Giappone e Occidente" che proseguirà fino alla fine dell'anno. La mostra sta già riscuotendo successo di pubblico con visitatori provenienti da tutta la Toscana. Prosecuzione fino alla fine dell'anno della mostra "Due

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								secoli di Textile e Fashion Design". In corso di preparazione un calendario di iniziative per il pubblico adulto collegate alla mostre in corso da svolgersi nell'autunno. E' proseguita l'attività di comunicazione sui social delle varie iniziative

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Fondazione Teatro Metastasio								
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione e di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>Report attività svolta</p>	<p>in corso di realizzazione</p>	<p>80%</p>	<p>"MetJazz", rassegna che vede la collaborazione della Camerata Strumentale Città di Prato e di Scuola di Musica Verdi e Biblioteca Lazerini, febbraio/marzo "Nome", in coproduzione con la compagnia TPO, Giardino del Teatro Fabbrichino, giugno Progetti Speciali \ Formazione del Pubblico. Il Met torna a far parte di "Casa Teatro", il progetto di Unicoop Firenze e Murmuris che promuove la partecipazione e il</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								coinvolgimento attivo del pubblico nella vita dei teatri toscani., da gennaio a aprile 2023 Opera “The Song of the Ladder” una favola lirica ispirata alla storia della Scala di Giacobbe, dal Libro della Genesi. 27 e 28 maggio 2023 Chiesa di san Domenico, 4 repliche, produzione Camerata strumentale «Città di Prato», Teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” “Laboratorio teatrale” in collaborazione

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL e Teatro di Piazza o d'Occasione, da gennaio a giugno al Teatro Magnolfi.

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	80%	<p>“Laboratorio delle arti e della scena”, formazione propedeutica teatrale per le nuove generazioni, da gennaio a maggio al Teatro Magnolfi “Punti focali”. Incontri e conversazioni con le compagnie aperti al pubblico (dicembre 2022- maggio 2023)</p> <p>Gli studenti delle scuole superiori dialogano con le compagnie in incontri aperti al pubblico, coordinati dal critico e ricercatore Lorenzo Donati, in occasione di alcuni spettacoli proposti nella</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazioni	breve descrizione attività svolte
								<p>stagione 22/23. Dal 27 gennaio al 27 aprile 2023, n. 6 incontri “Esplorazioni” (marzo/aprile 2023). Due passeggiate/workshop condotte da Stefania Rinaldi che si inseriscono nella serie di esperienze legate all’arte pubblica già presenti nel territorio pratese a cura di CUT Circuito urbano temporaneo, che prevedono momenti di incontri e discussione con il formatore Graziano Graziani. Le passeggiate hanno una valenza conoscitiva ed esplorativa per</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								accompagnare i partecipanti al momento di restituzione alla collettività. Il riconoscimento della città come il proprio ambiente di vita apre la strada alla possibilità di scegliere i luoghi pubblici in cui parlare ed essere loro stessi artefici di trasformazioni. "Immagini di città" laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Prato. Dal 6 al 21 maggio 2023 n. 6 incontri Calendario passeggiate dal 10 al 18 giugno 2023, n. 4 incontri Calendario laboratori dal 24 al 26 giugno

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								<p>2023, n. 3 incontri Tutte le mappe e i segni che usciranno dai vari percorsi saranno poi raccolte e restituite alla città durante una serata finale al Teatro Metastasio, a settembre 2023 (con data da definire). “School of Met” è un percorso di incontri ispirato all’attività del regista Milo Rau fautore di una radicale relazione fra arte e attivismo politico, rivolto a studenti e studentesse di diverse scuole secondarie di secondo grado di Prato. Attivisti, esperti, filosofi, ospiti internazionali</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								<p>sono gli interlocutori di incontri su temi scelti dai ragazzi in incontri su piattaforma zoom. Novembre 2022/febbraio 2023, 10 incontri di due ore l'una. Dal 22 gennaio al 19 febbraio 2023, n. 5 incontri. "Atelier di produzione e sviluppo di formati per il pubblico" (febbraio/maggio 2023) una tappa del progetto School of Met 2022/2023, a cura di Teatro Metropolitano. Dopo aver individuato i temi e averli approfonditi con esperti anche durante</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								incontri pubblici, in questa fase gli studenti rielaborano i temi discussi con Graziano Graziani e partecipano a un laboratorio con la compagnia Teatro Metropopolare per la realizzazione di una restituzione artistica aperta alla cittadinanza. Febbraio/aprile n. 3 incontri preliminari, maggio n. 3 date laboratorio. Sabato 20 maggio dalle ore 18.00 alle 20.00 "Supersonica": restituzione alla città. Progetto inserito in imPatticreAttivi,

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								<p>una delle esperienze del progetto Prato Comunità Educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. “Nebulosa”, laboratorio gratuito di scrittura critica e giornalismo del Teatro Metastasio, curato da Lorenzo Donati (critico, ricercatore e giornalista) e aperto ai giovani dai 17 ai 22 anni. Dal 21 febbraio al 25 maggio 2023, Teatro Magnolfi e in altri luoghi della Fondazione Metastasio Nasce nell'ambito di School of Met per dar voce ai</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								<p>giovani con l'intento di produrre racconti, testimonianze, interviste, cronache e recensioni intorno alla Stagione del Met e non solo. "Plus Ultra", laboratorio teatrale per Over 60, un percorso di studio per un approccio all'arte della scena e per un'esperienza che si sviluppa intorno all'analisi della presenza attoriale. Dal 1° febbraio al 12 maggio 2023, Magnolfi e Fabbricone, n. 15 incontri</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Istituto Internazionale Storia Economica F. Datini								
<p>Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione e di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</p>	<p>Consolidare la caratterizzazione e della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising</p>	<p>Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali</p>	<p>Programma delle attività</p>	<p>Report attività svolta</p>	<p>fatto/in corso di realizzazione</p>	<p>60%</p>	<p>A. Realizzazione del convegno annuale (LIV Settimana di Studi) sia in presenza, presso il ridotto del Teatro Politeama, che online. B. Realizzazione del seminario avanzato Datini/Ester presso la Casa Pia dei Ceppi. C. Gestione Biblioteca specializzata e archivi. D. Realizzazione, in collaborazione con vari enti e il Comune di Prato, presso Palazzo Pretorio, della Mostra "L'Albero degli Zecchini". E. Organizzazione della LV</p>

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								Settimana di Studi (2024), della LVI Settimana di Studi (Call 2025) e del Seminario Datini Ester. F. Parziale restauro di registri del Fondo Borsini
	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	50%	A. Realizzazione e progettazione laboratori per scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con la Casa Pia dei Ceppi. B. Progettazione iniziative collaterali per la cittadinanza, relative alla mostra "L'albero degli Zecchini" in collaborazione con Palazzo Pretorio. C. Progettazione

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								conferenze, presentazioni e altre attività per "l'autunno da sfogliare"
Pin scarl								
Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Operare affinché le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale	Progettare e gestire le attività di Prato Circular City	Programma delle attività	Report attività svolta	In corso di realizzazione	45%	Supporto allo sviluppo del progetto Prato Smart City-Attività 2023. Partecipazione e supporto all'organizzazione dei tavoli di lavoro di PCC, in particolare: . Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Prato, nell'ambito del Tavolo "Distretto Tessile";

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								<ul style="list-style-type: none"> . Sviluppo dei progetti Prato Smart City e Casa delle Tecnologie Emergenti – PRISMA, nell'ambito del Tavolo "Transizione Digitale" . Supporto alla predisposizione del documento Next Generation Prato e adesione al protocollo di Governance. . Supporto a GIDA per le attività relative al Tavolo "Acque Reflue Urbane" Progetto "Servizi per rilascio delle credenziali SPID ai cittadini di Prato" anno 2023 Supporto all'organizzazione della "Prato

Ambito e obiettivo strategico	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
								Digital Week 2023"
